



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D3/.....

data.....

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37 DEL 23-05-11

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONELLO" NEL COMUNE DI MESSINA

Approvazione del Cert. Di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

IL DIRIGENTE



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Determina Dirigenziale n° 106 del 12.11.2009 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di adeguamento per la messa in sicurezza dell'istituto d'Istruzione Superiore "Antonello" nel comune di Messina per l'importo complessivo di € 271.969,00 e che le opere sono state finanziate con fondi derivanti dall'INAIL per un importo pari ad € 252.600,00, rimanendo a carico della Provincia la somma di € 19.369,00;

CHE con Determinazione Dirigenziale n° 02 del 20/01/2010 relativa all'approvazione del verbale di gara, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla COGISA s.r.l. con sede in via P. Almerigo, 3 - Riposto - Catania con il ribasso del 7,3152%; giusto contratto d'appalto in data 28.01.2010 n° rep. 13717 registrato a Messina in data 12.02.2010 al n° 103 Serie I;

CHE i lavori in oggetto vennero consegnati con verbale del 28/01/2011;

CHE i lavori in oggetto vennero sospesi con verbale in data 06.09.2010 e ripresi giusto verbale del 28.01.2011;

CHE i lavori furono ultimati giusto verbale del 23/02/2011;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 02 marzo 2011, per l'importo netto di € 195.503,24, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati alla ditta pari ad € 172.048,66, resta a credito della stessa la somma di € 23.455,18;

ViSTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 01/03/2011;

VISTA la legge 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. N.07/2002 e N.07/2003;

VISTO l'art. 13 della L. 30/2000 ;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTA la L.R. n° 48 del 11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

DETERMINA

APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, allegato alla presente determinazione da cui si evince che la ditta COGISA s.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 195.503,84 e che risulta un credito a favore della medesima di € 23.455,18;

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo ai "Lavori di adeguamento per la messa in sicurezza dell'istituto d'Istruzione Superiore "Antonello" nel comune di Messina",

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 28.146,22 alla ditta COGISA s.r.l. con sede in via P. Almerigo, 3 - Riposto - Catania, con i fondi derivanti dall'INAIL impegnati al cap. 7575 Bil. 2009, subordinando il pagamento all'effettivo accredito da parte dell'Ente finanziatore.

ALLEGATI:

1. Stato Finale dei lavori
2. Certificato di regolare Esecuzione
2. Determina Dirigenziale n° 106 del 12.11.2009
3. Determina Dirigenziale n° 02 del 20/01/2010


IL DIRIGENTE

Ing. Vincenzo CARDITELLO.



Visto presa nota

IL RAGIONIERE GENERALE

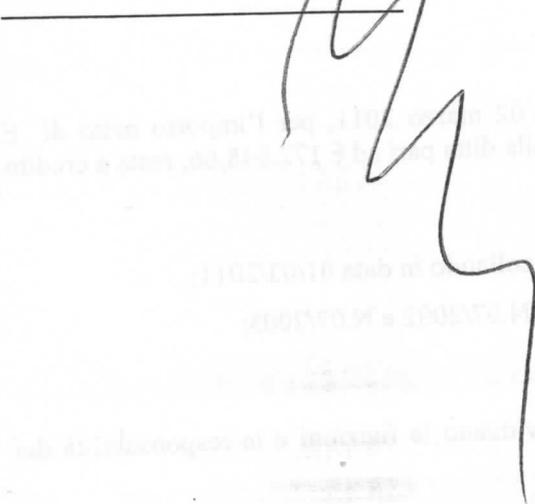


2° U.O. - IMPEGNI E PARERI

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 25-5-11





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI DI ADEGUAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONELLO" NEL COMUNE DI MESSINA

IMPRESA: COGISA s.r.l. con sede in via P. Almerico, 3 - Riposto - Catania

Importo a base d'asta: € 205.000,00
Ribasso d'asta del 7,3152% € 14.996,16
Importo netto dei lavori € 190.003,84

Contratto data 28.01.2010 n° rep. 13717 registrato a Messina in data 12.02.2010 al n° 103 Serie I

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento D.P.R. n. 554/1999 ss.mm.ii.)

PREMESSA

Progetto principale redatto in data 05.11.2009 ed approvato con Determina Dirigenziale n° 106 del 12.11.2009.2009 per l'importo complessivo di € 271.969,00 così ripartito:

Importo totale lavori a base d'asta:		€ 210 500,00
di cui € 5 500,00 non soggetti a ribasso		
IVA:	20%	€ 42 100,00
	sommario	€ 252 600,00
Somme a carico della Provincia:		
Competenze Tecniche	€ 4 200,00	
Oneri di assicurazione	€ 210,00	
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 150,00	
Spese per pubblicità	€ 11 809,00	
Garanzia fidejussoria a favore dell'INAIL	€ 3 000,00	
	sommario € 19 369,00	€ 19 369,00
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 271 969,00

Considerato che il giorno 01 marzo 2011 è stata condotta la visita di sopralluogo presso l'istituto in oggetto dove sono stati eseguiti i lavori;

Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

Geom. Antonino Cordaro, in qualità di Direttore dei lavori;

Dr. Alfio Compagnino, Amministratore unico della COGISA s.r.l.;

Geom. Roberto Virzi, Direttore Tecnico della COGISA s.r.l.

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:

- il progetto iniziale, redatto in data 05.11.2009 ed approvato in data con D.D. n° 106 del 12.11.2009.2009 per l'importo complessivo di € 271.969,00;
- la perizia di variante tecnica in assestamento finale dei lavori redatta in data 27.01.2011 ai sensi dell'art 25 lett. b e comma 3 della Legge 109/94;
- che le opere sono state finanziate con fondi derivanti dall'INAIL per un importo pari ad 252.600,00, rimanendo a carico della Provincia la somma di € 19.369,00;
- che a seguito di gara (pubblico incanto) i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe con il ribasso del 7,3152%;
- che l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 7,3152%, è risultato pari a euro 195.003,84;
- che come da art. 9 del contratto l'impresa ha prestato cauzione definitiva di euro 9.975,00, pari al 5% dell'importo dell'appalto;
La cauzione è stata costituita tramite fidejussione da parte della Compagnia Ass. "ALLIANZ RAS Agenzia di Riposto - Catania con polizza n° 067942314;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 28.01.2010 come da risulta dal verbale;
- che la durata prevista dal contratto è di trecento (300) giorni, con scadenza pertanto al 22.11.2010;
- che è stata ordinata dalla direzione lavori, come risulta da apposito verbale, la seguente sospensione dal 06.09.2010 al 28.01.2011 per giorni 144;
- che per effetto della sospensione per cause non dipendenti dall'impresa, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è spostato al 28.02.2011;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 23.02.2011 come da certificato redatto contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;
- che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;
- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Catania con polizza n° 04843672/46 con decorrenza dal 08/02/2010 e scadenza continuativa;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come riscontro DURC;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe procure a favore di terzi;
- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data e ammonta complessivamente a 195.503,84;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni sono state fatte sui documenti contabili;

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
- 3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA
Realizzazione e manutenzione Edifici Scolastici

Stazione PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Appaltante :

Lavori di : ADEGUAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO

D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONELLO" NEL COMUNE DI MESSINA

Impresa : COGISA s.r.l. Via P. Amerigo

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 23/02/2011

CONTRATTO in data 28/01/2010 repertorio numero 13717

Importo a base d'asta	€	210.500,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.500,00
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	205.000,00
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€	190.003,84
Importo contrattuale compreso oneri per la sicurezza	€	195.503,84

Somme a carico dell'Ente Provincia:

Competenze Tecniche	4.200,00
Oneri di Assicurazione	210,00
Contributo Autorità di Vigilanza	150,00
Spese per pubblicità	11.809,00
Garanzia fidejossoria a favore dell'INAIL	3.000,00
Per Oneri di Conferimento in discarica iva compresa	14.175,37
Totale a disposizione della Amministrazione	33.544,37

Tempi

Data della consegna	28/01/2010
Data di inizio dei lavori	28/01/2010
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	300 gg 22/11/2010
Sospensione lavori	05/07/2010
Ripresa lavori	28/01/2011
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	25/02/2011
Ultimazione lavori	23/02/2011

— che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa COGISA s.r.l. con contratto del 28.01.2010 n° rep. 13717 sono regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 22 del C.S.A. liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare netto del conto finale	€ 195.503,84
Dedotti gli acconti	€ 172.048,66
Resta il credito liquido dell'Impresa	€ <u>23.455,18</u>

Diconsi euro ventitremilaquattrocentocinquante/18, del quale, fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa.


Letto, confermato e sottoscritto

Messina, 01 marzo 2011

Per l'Impresa COGISA s.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. *Alfa Compagnino*



Il Direttore dei lavori
Geom. *Antonino Cordaro*



Visto: IL Responsabile del Procedimento
Ing. *Vincenzo Carditello*




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 1
123.7		Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete	m ² 340,000	13,50	4.590,00	
21.1.4.1		Scavo di sbancamento per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi all'interno del perimetro del centro edificato,	m ³ 4.037,682	5,00	20.188,41	
31.2.5.2		Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazioni - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del	16.650,000	0,49	8.158,50	
41.5.3		Compattazione del fondo degli scavi quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture	m ² 4.380,000	0,42	1.839,60	
51.1.6.1		Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi all'interno del perimetro del centro	m ³ 202,174	7,80	1.576,96	
66.4.3		Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80 x 50 x	cad. 33,000	106,30	3.507,90	
713.7.3.6		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme	m 126,920	38,50	4.886,42	
83.1.3.1		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo R 325	m ³ 85,169	90,80	7.733,34	
93.1.4.1		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104),	m ³ 18,696	114,00	2.131,34	
103.1.4.11		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104),	m ³ 21,610	120,00	2.593,20	
113.2.1.2		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A (in sostituzione del tipo FeB 44 k) controllato in	kg 3.504,363	1,34	4.695,85	
123.1.8		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104),	m ³ 2	153,20	306,40	
133.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture	m ² 486,244	16,50	8.023,03	
142.1.6.1		Muratura portante in elevazione a faccia vista, spessore 20 cm., realizzata con blocchi in conglomerato	30,00	50,20	1.506,00	
151.1.9		Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte	m ³ 10,780	109,90	1.184,72	
1615.21.6		Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per				
		A RIPORTARE			72.921,67	

num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			72.921,67	
		m	53,900	16,50	889,35	
175.12.2		Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo R 325 con	m ²	312,059	8,25	2.574,49
186.2.4.2		Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a	m ²	322,707	28,60	9.229,42
196.2.9		Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, con resistenza	m	381,450	30,20	11.519,79
207.1.2		Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno	kg	2.486,000	2,20	5.469,20
216.1.1		Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI	m ³	657,000	16,36	10.748,52
22II.2		Escavatore da 77.2 kw, con chiodo o con benna compreso operatore	ora	80,000	81,39	6.511,20
236.1.3.2		Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di	m ² *cm	17.800,000	1,00	17.800,00
246.1.4.2		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in	m ² *cm	21.360,000	1,20	25.632,00
256.1.5.2		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di	m ² *cm	10.680,000	1,40	14.952,00
261.2.4		Compensò per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli	m ³	60,509	1,65	99,84
277.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,	kg	3.816,000	2,06	7.860,96
283.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm, di	kg	406,190	1,70	690,52
299.7		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato di	m ²	180,341	20,00	3.606,82
301MO		Operaio comune	ora	48,000	23,65	1.135,20
317.3.12.2		Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni				
		A RIPORTARE			194.912,78	

Pag Totale 912,7 59,2	Importo lavori a misura compresa sicurezza	€	210.500,00	
	meno Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	5.500,00	
	lavori a misura soggetti a ribasso	€	205.000,00	205.000,00
	meno ribasso d'asta del 7,3152% su € 205.000,00	€		14.996,16
	Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		190.003,84
	meno Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		5.500,00
	Lavori a misura al netto	€		195.503,84
40	IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI	€		195.503,84
	A DETRARRE I CERTIFICATI DI ACCONTO EMESSI:			
	1° Certificato del 24/05/2010	€	93.290,00	
	2° Certificato del 10/09/2010	€	78.758,66	
	Sommano gli acconti emessi	€	172.048,66	172.048,66
	RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		23.455,18

Messina, li 22.03.2011

L'IMPRESA
COGISA s.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Antonino Cordaro



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vincenzo Carditello



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			194.912,70
		con trattamento a caldo mediante immersione in vasche			
			Kg	1.140,000	1,28
327.2.1		Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi			1.459,20
			m ²	943,000	5,80
3321.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura			5.469,40
			m ²	137,540	8,60
3421.3.1.2		Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta			1.182,84
				137,540	40,30
357.2.3		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e			5.542,86
			m ²	943,000	2,05
					1.933,15
					210.500,23
				In cifra tonda	210.500,00
		A RIPORTARE			210.500,00



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente

[Handwritten signature]

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° Dipartimento

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 106 del 12.11.2009

OGGETTO: *Lavori di adeguamento per la messa in sicurezza dell'istituto d'istruzione superiore "Antonello" nel comune di Messina. Importo Complessivo €. 271.969,00*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO

Premesso che l'INAIL, ai sensi dell'art. 1 comma 626 della legge Finanziaria 2007, con relativo bando, ha invitato gli Enti locali, di presentare entro il 20.03.2009, domanda di ammissione al finanziamento di progetti finalizzati all'adeguamento degli Istituti di scuola secondaria di primo grado e superiore, alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro o all'abbattimento delle barriere architettoniche;

Che la Provincia Regionale di Messina con nota prot. n. 10032 del 19.03.2009, presentava con le modalità indicate nel bando, domanda di partecipazione per il finanziamento dei lavori di adeguamento per la messa in sicurezza dell'istituto d'istruzione superiore "Antonello" nel comune di Messina, allegando il relativo progetto definitivo redatto il 12.03.2009, dall'importo complessivo di €.264.450,00, di cui €.210.500,00 per lavori di cui €.5.500,00 per oneri per la sicurezza;

Che l'INAIL con nota del 28.07.2009 introitata al prot. n. 27721 del 04.08.2009, comunicava a quest'Ente l'avvenuta ammissione al finanziamento dei sopraindicati lavori, per un ammontare "provvisorio" pari a €.252.600,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed IVA, lasciando a carico della Provincia le altre relative spese;

Tenuto conto che la somma a carico dell'Ente, risultava insufficiente, in data 19.10.2009 il tecnico progettista presentava un nuovo quadro economico dall'importo complessivo di €.271.969,00 di cui €.210.500,00 per lavori di cui €.5.500,00 per oneri per la sicurezza;

Vista la Determina Dirigenziale n. 86 del 27.10.2009, con la quale si approvava il sopraindicato progetto definitivo secondo il nuovo quadro economico e si autorizzava a procedere all'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto ai sensi dell'art.20 comma 1 della legge 109/94 s.m.i.;

Preso atto che con la predetta D.D. n.86/2009 è stata impegnata la somma di €.11.158,05 a carico del cap.1950/09 per le necessarie pubblicazioni del bando ai sensi dell'art.29 della legge 109 Sicilia;

Che si è già provveduto al pagamento dell'Autorità di Vigilanza €.150,00 e della G.U.R.S. €.648,00, utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione dell'economista con dispositivi emessi da questo ufficio.

Vista la necessità di redigere il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

Visto il progetto esecutivo, redatto il 05.11.2009 dai tecnici di quest'Ufficio, approvato in linea tecnica con parere n.75 del 06.11.2009 e validato dal R.U.P, ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. n. 554/99, con parere n. 13 del 09.11.2009, dall'importo complessivo di €.271.969,00, così ripartito:

• IMPORTO LAVORI	€. 210.500,00	€. 210.500,00
Costo oneri per la sicurezza	€. 5.500,00	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€. 205.000,00	
IVA sui lavori 20%		€. 42.100,00
		€. 252.600,00
• Somme a carico dell'Ente Provincia		
Competenze Tecniche	€. 4.200,00	
Contributo Autorità Vigilanza	€. 150,00	
Assicurazione progettisti	€. 210,00	
Spese per pubblicità	€. 11.809,00	
Garanzia fidejussoria a favore dell'INAIL	€. 3.000,00	
	€. 19.369,00	€. 19.369,00

Importo complessivo

€. 271.969,00

[Handwritten signature]

Copia ufficio



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° Dipartimento

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2 del 20-01-2010

OGGETTO: *Lavori di adeguamento per la messa in sicurezza dell'istituto d'istruzione superiore "Antonello" nel comune di Messina. Importo Complessivo €. 271.969,00.*
Approvazione verbale gara e aggiudicazione lavori.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO**

Premesso che l'INAIL, ai sensi dell'art. 1 comma 626 della legge Finanziaria 2007, con relativo bando, ha invitato gli Enti locali, di presentare entro il 20.03.2009, domanda di ammissione al finanziamento di progetti finalizzati all'adeguamento degli Istituti di scuola secondaria di primo grado e superiore, alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro o all'abbattimento delle barriere architettoniche;

Che la Provincia Regionale di Messina con nota prot. n. 10032 del 19.03.2009, ha presentato domanda di partecipazione per il finanziamento dei lavori di adeguamento per la messa in sicurezza dell'istituto d'istruzione superiore "Antonello" nel comune di Messina di €.210.500,00 per lavori di cui €.5.500,00 per oneri per la sicurezza;

Che l'INAIL con nota del 28.07.2009 introitata al prot. n. 27721 del 04.08.2009, ha comunicato l'ammissione al finanziamento dei sopraindicati lavori, per un ammontare "provvisorio" pari a €.252.600,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed IVA, lasciando a carico della Provincia le altre relative spese, specificando come indicato dall'art.13 del disciplinare tecnico, che l'effettivo finanziamento risulterà al netto del ribasso d'asta;

Che con Determina Dirigenziale n. 86 del 27.10.2009, è stato approvato il progetto definitivo dei sopraindicati lavori dall'importo complessivo di €.271.969,00, di cui €.210.500,00 per lavori di cui €.5.500,00 per oneri per la sicurezza e contestualmente si è autorizzato a procedere all'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto e approvato il relativo schema di bando di gara;

Che con Determina Dirigenziale n. 106 del 12.11.2009, è stato approvato il progetto esecutivo e si è impegnata la spesa di €.252.600,00, pari all'importo dei lavori, oneri per la sicurezza ed IVA, con i fondi derivanti dall'INAIL, al cap. 7575 bilancio 2009, subordinando i pagamenti all'effettivo accreditamento dei fondi da parte dell'Ente finanziatore;

Visto il verbale di gara esperita in data 10 dicembre 2009 con proseguo nei giorni 11 e 14 dicembre 2009, da cui risulta aggiudicataria la Ditta COGISA s.r.l. (P.I.V.A. 03224520878) con sede a Riposto(CT) Via P.Almerigo n.3, con il ribasso del 7,3152%, per un importo contrattuale di €. 195.503,84 oltre I.V.A.;

Considerato che nei giorni di pubblicazione del verbale di gara e dell'esito non sono pervenute entro i termini prescritti, opposizioni o reclami;

Accertato con esito positivo, la verifica della documentazione esibita dall'impresa aggiudicataria, nonché dalle certificazioni rilasciate dai vari uffici di competenza che danno conferma della regolarità Contributiva e dell'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 75 del D.P.R. 554/1999;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in argomento per poter avviare la successiva fase di esecuzione dei lavori;

- Vista** la L. 109/94-Sicilia s.m.i.;
- Viste** le LL.RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07;
- Visto** l'art. 126 della L.R. 17/2004;
- Visto** il D.P.R. 554/99;
- Visto** il bando e il disciplinare tecnico dell'INAIL;
- Vista** la L. 48/91 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo;

Visto l'art. 13 della L. 30 del 23 dicembre 2000 che individua il Dirigente nel soggetto obbligato alla emissione della Determinazione ed a contrarre le relative procedure;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n° 165, che individuano le funzioni e le responsabilità del Dirigente;
Visto il Regolamento degli Appalti e dei Contratti dell'Ente;
Visto il Regolamento di contabilità della Provincia Regionale di Messina;
Visto lo Statuto Provinciale ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- DI APPROVARE** il verbale di gara, esperita in data 10 dicembre 2009 con proseguo nei giorni 11 e 14 dicembre 2009, relativo all'aggiudicazione dei lavori di *Lavori di adeguamento per la messa in sicurezza dell'istituto d'istruzione superiore "Antonello" nel comune di Messina*, allegato alla presente come parte integrante.
- DI AGGIUDICARE** definitivamente i lavori di che trattasi alla Ditta *COGISA s.r.l. (P.I.V.A. 03224520878)* con sede in *Riposto(CT) Via P.Almerigo n.3*, con un ribasso percentuale del 7,3152, corrispondente ad un importo contrattuale di € 195.503,84, oltre IVA come per legge, così distinto:
 - € 190.003,84 per lavori a misura;
 - € 5.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
- DI PRENDERE ATTO** che i lavori saranno finanziati dall'INAIL, e che le relative somme sono disponibili nel cap. 7575 bilancio 2009, giusta determina d'impegno n. 106 del 12.11.2009, subordinando i pagamenti all'effettivo accreditamento dei fondi da parte dell'Ente finanziatore;
- DI PRENDERE ATTO**, che l'effettivo finanziamento dell'INAIL, sarà di € 234.604,61, corrispondente all'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo degli oneri di sicurezza e dell'I.V.A., come indicato dall'art. 13 del disciplinare tecnico;
- AUTORIZZARE** l'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina ad avviare ogni ulteriore adempimento finalizzato alla formalizzazione e stipula del relativo contratto entro i termini di legge;

ALLEGATI:

- Copia nota INAIL del 28.07.2009;
- Copia D.D.n. 86 del 27.10.2009;
- Copia D.D. n.106 del 12.11.2009;
- Copia Verbale di gara;

Data

IL DIRIGENTE
(Ing. Vincenzo Carditello)

Visto di regolarità contabile e disponibilità finanziaria espressi dal Ragioniere Generale

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPECUNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Antonio Torrisi)

Data
