



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 246 del 28 DIC. 2012

OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 22 (LA VIA DELL'ARGILLA ....) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO RELIGIOSO VILAFRANCA - CALVARUSO - SERRO SU CALVARUSO DIVIETO (DA S.S. 113 A S.S. 113).  
*Stralcio esecutivo per la messa in sicurezza*

**Codice Identificativo POR: 1999.IT.16.1PO.011/6.01/6.1.14/134**

### Preso atto Stato Finale e Certificato di Collaudo.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRÒ del mese di DICEMBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1. Presidente On- Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO		<u>NO</u>
2. Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA		<u>SI</u>
3. Assessore Dott. Michele	BISIGNANO		<u>NO</u>
4. Assessore Dott. Carmelo	TORRE		<u>NO</u>
5. Assessore Dott. Renato	FICHERA		<u>SI</u>
6. Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO		<u>SI</u>
7. Assessore Arch. Dario	LA FAUCI		<u>SI</u>
8. Assessore Dott. Daniele	BRUSCHETTA		<u>NO</u>
9. Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO		<u>SI</u>
10. Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO		<u>NO</u>
11. Assessore Sig. Santo	FOTI		<u>SI</u>
12. Assessore Dott. Maria	PERRONE		<u>SI</u>
13. Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI		<u>SI</u>
14. Assessore Dott. Giuseppe	CRISAFULLI		<u>NO</u>
15. Assessore Dott. Bruno	CILENTO		<u>SI</u>
16. Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA		<u>NO</u>

Assume la Presidenza DOTT. ANTONINO TERRANOVA

Partecipa il Segretario Generale AVV. MARIA ANGELA CARONETTI

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

### DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente, Dott. Antonino Terranova, vista la richiesta del Dirigente proponente, stante l'urgenza di trasmettere gli atti alla Regione per la conclusione dell'iter procedurale, propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.

### LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Ufficio Dirigenziale 4° - Protezione Civile – Difesa Suolo – Viabilità - 1° Distretto

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Ing. Giuseppe Celi

**OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 22 (LA VIA DELL'ARGILLA ....) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO RELIGIOSO VILAFRANCA - CALVARUSO - SERRO SU CALVARUSO DIVIETO (DA S.S. 113 A S.S. 113).**

***Stralcio esecutivo per la messa in sicurezza***

**Codice Identificativo POR: 1999.IT.16.1PO.011/6.01/6.1.14/134**

### PROPOSTA

#### **PREMESSO CHE:**

- Il progetto e' stato redatto dagli Ingg. Giovanni LENTINI (capogruppo), Anna CHIOFALO, e dai Geomm. Mario LUCCHESI, e Filafelfio MAGNO in data 04/11/2005, ed e' stato validato con parere n° 08 del 07/11/2005 ed approvato in linea tecnica con parere n° 04 del 15/11/2005;
- L'opera è stata cofinanziata dalla Comunità Europea tramite La regione Siciliana con l'emissione Decreto dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n° 1558/15° Bis del 20/11/2006 e dalla Provincia Regionale di Messina con stanziamento del 5% dell'importo complessivo di cui alla delibera della Giunta Provinciale n° 305 del 22/11/2005; il tutto per l'importo complessivo di € 800.000,00;
- Oltre al progetto principale è stata redatta perizia di variante di assestamento somme finale ai sensi dell'Art. 25 Comma 3 della L. 109/94 approvata con determina del Dirigente n° 31 del 01/09/2008 ed in linea tecnica con parere dello stesso Dirigente n° 08 del 01/09/2008;
- Il relativo atto di sottomissione venne redatto in data 22/09/2008 ed è stato repertoriato presso l'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina al n° 217 del 21/10/2008, non essendoci nuovo impegno di spesa ai fini del rapporto contrattuale con l'impresa;
- Nella gara di pubblico incanto, tenutasi in data 17 Maggio e 10 Luglio 2007 rimase aggiudicataria l'impresa SCAFIDI ANTONINO con sede in Lipari, Via Varisana Sopra, Pianoconte, n° 34, (Me) che offri' il ribasso del 7,319 %.
- I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto senza riserve in data 10/09/2007 per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale D'Appalto mesi 12 consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, con un termine utile per l'ultimazione, indicato nel il 09/09/2008;
- Ddurante l'esecuzione dei lavori, non vi sono state sospensioni, né di conseguenza riprese degli stessi e quindi il tempo utile per dare ultimati i lavori risulta confermato nel giorno 09/09/2008, come da verbale di fine lavori in pari data;
- Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/09/2008 per l'importo

netto di €. 565.265,39;

- I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie di variante senza aumento di spesa e suppletiva di assestamento finale secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

**VISTI** gli atti tecnici contabili ed il certificato di collaudo redatto dall'Ing. Salvatore CELONA, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

**VISTA** la nota dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza Stradale del 18/06/2012 prot. n° 58883, con la quale si chiedeva l'integrazione del suddetto certificato di collaudo amministrativo;

**VISTA** l'integrazione del certificato di collaudo amministrativo redatto dall'Ing. Salvatore CELONA, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

**VISTA** la nota dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza Stradale, del 19/10/2012 prot. n° 92080, acquisita al protocollo di questa Provincia Regionale in data 30/10/2012 al n° 35999/12, con la quale si restituiscono positivamente gli atti di contabilità finale e di collaudo delle opere in oggetto;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n° 21/4° Dip. del 21/12/2009 con la quale il Dirigente del 4° Dip. ha approvato lo stato finale ed il certificato di collaudo dei lavori di cui alla presente;

**VISTA** la L.R. n° 9 del 06/03/1986;

**VISTA** la L. 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. 7/2002 e 7/2003;

**VISTA** la L. R. 12/2011;

**VISTA** lo Statuto Provinciale ;

**VISTO** il D. Lg.vo 267/2000 e la L.R. n° 30/2000;

## SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

### DELIBERI

**PRENDERE ATTO** della circostanza che i lavori di cui in narrativa, sono stati conclusi regolarmente;

**PRENDERE ATTO** dello stato finale e del certificato di collaudo e della relativa integrazione dei "LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 22 (LA VIA DELL'ARGILLA ....) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO RELIGIOSO VILAFRANCA - CALVARUSO - SERRO SU CALVARUSO DIVIETO (DA S.S. 113 A S.S. 113)" - *Stralcio esecutivo per la messa in sicurezza* - Codice Identificativo POR: 1999.IT.16.1PO.011/6.01/6.1.14/134

**PRENDERE ATTO** della determinazione Dirigenziale n° 21/4° Dip. del 21/12/2009 con la quale il Dirigente del 4° Dip. ha approvato lo stato finale ed il certificato di collaudo dei lavori in oggetto;

**DARE MANDATO** al Dirigente competente per la trasmissione del presente atto all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza Stradale;

**DICHIARARE** la presente Delibera immediatamente esecutiva.

STANTE URGENZA DI TRASMETTERE GLI ATTI ALLA REGIONE PER LA CONCLUSIONE DELL'ITER PROCEDURALE.

*Handwritten signature*

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. COPIA STATO FINALE
2. COPIA CERTIFICATO DI COLLAUDO
3. COPIA INTEGRAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO
4. DET. DIRIG. N° 21/4° Dip. del 21/12/2009
5. NOTA ASS.TO LL.PP. PROT. 92080 DEL 19/10/2012

6. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE  
CON FONDI REGIONALI E  
PROVINCIALI

7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

il 10-12-2012

Il Responsabile dell'Unità Operativa  
Ing. Giovanni LENTINI

il \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe CELI

Il Presidente o l'Assessore

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30 si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 10-12-2012

IL DIRIGENTE

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 19 DIC. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

3° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PAGAMENTI

VISTO: PRESO NOTA  
MESSINA, 17/12/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE

DOTT. A. TERANOVA

F.to L'ASSESSORE ANZIANO

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

SIG. R. FICHERIA

AVV. M.A. CARONETTI

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina li, \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 2 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 DIC. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, \_\_\_\_\_

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, 28 DIC. 2012

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. M.A. CARONETTI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Messina, dalla Residenza Provinciale, addi 28 DIC. 2012

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
M.A. CARONETTI  
(dott.ssa. Giovanna D'Angelo)

**LAVORI :** di amm. adeg. e messa in sicurezza e per il miglioram. della percor. la valoriz. degli interventi del P.I.T. n° 22 e dei

**IMPRESA :** SCAFIDI ANTONINO

**STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 08/07/2008**


**CONTRATTO** in data 02/08/2007, n. 13391 di repertorio, registrato a Messina

in data , al n. Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod:R|4|6|  
Vol:M

Importo Progetto Originario	€	800.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 7,319	€	565.526,05
Importo ribasso d'asta.	€	43.673,55
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	12.484,90

		Tempi	
1) Accantonamento di cui all'art.18 comma 1 della Legge 109/94 (incentivi progettazione 2% dell'importo a b.a.)	12.183,99	Data della consegna	10/09/2007
2) Accantonamento per il collaudo amministrativo	4.748,42	Data di inizio dei lavori	10/09/2007
3) Per assicurazione obbligatoria tecnici protagonisti della progettazione (0.05% dell'importo lordo dei lavori)	304,60	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	09/09/2008
4) Per accantonamento di cui all'Art. 26, Comma 4 L. 109/94 (3% dell'importo lordo dei lavori)	18.275,99	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
5) Imprevisti (<5% dei lavori a base d'asta)	10.447,48	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
6) Per pratiche eventuali di esproprio	5.000,00	Giorni impiegati in piu'	
7) Per oneri di conferimento in discarica (€12.00/mc)	5.000,00	Giorni impiegati in meno	
8) Per pubblicazione bando di gara	11.000,00		
9) Per pubblicazione avvisi "Ad opponendum"	2.000,00		
10) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo lordo dei lavori)	121.839,92		
Fondo a disposizione della Amministrazione		€	190.800,40



 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 Ing. Giovanni LENTINI

Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
1 1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione m	413,350	1,63	673,76
2 1.1.5.2	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita', per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 86 m³	2.344,790	8,90	20.868,63
3 1.2.5.1	Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni di cui alla voce 1.3.3 o scarificazioni a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprens m³xkm	17.222,960	0,36	6.200,27
4 1.4.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n m²	13.206,320	2,10	27.733,27
5 1.4.2	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso come all'art.1.4.1. Per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm m²	18.692,510	0,53	9.907,03
6 N.P.1-1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe m³	184,270	15,20	2.800,90
7 3.2.1.2	Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 k o Fe B 44 k controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piega kg	70.288,780	1,27	89.266,75
8 3.2.5	Fornitura e collocazione di rete di acciaio elettrosaldato a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature kg	1.458,800	1,63	2.377,84
9 3.2.4	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate o con legname o con pannelli in lam m²	2.680,360	14,80	39.669,33
10 3.1.3.1	Idem come sopra ma confezionato con 250 kg di cemento tipo R 325 Per opere in fondazione m³	523,000	81,90	42.833,70
11 3.1.3.2	Idem come sopra ma confezionato con 250 kg di cemento tipo R 325 Per opere in elevazione			
A RIPORTARE				242.331,48



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			242.331,48
		m <sup>3</sup>	384,770	85,90	33.051,74
12	6.3.2	Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottolame di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specific	m <sup>3</sup>	28,50	17.576,81
13	6.3.4	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.2 e 6.3.3 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltr	m <sup>3</sup> /Km	0,36	2.220,23
14	N.P.2-6.1.2	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante al 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm comp	m <sup>3</sup>	16,90	12.165,31
15	6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dell	cad.	122,20	4.277,00
16	6.6.2	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale	cad.	140,00	1.680,00
17	22.6	Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati, com	m <sup>2</sup>	19,50	975,00
18	22.12	Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere.	cad	48,80	97,60
19	1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/1	m <sup>3</sup>	2,70	1.136,89
20	1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura	m <sup>3</sup>	1,40	1.050,45
21	3.1.1	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 d'impasto eseguito a qualsiasi profondità	m <sup>3</sup>	70,20	24.612,12
		A RIPORTARE			341.174,63

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 3
		RIPORTO				341.174,63
22	6.5.1.3	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Fe 360 B zincato a caldo, conforme al D.M. 18/02/1992 n. 223 e successive modifiche ( D.M. 03/06/1998 e D.M.11/06/1999), sottoposta alle	m	1.216,900	59,60	72.527,24
23	N.P.3-NO.001	Nolo a caldo di pala gommata o cingolata con potenza massima pari a Hp 40	h	340,000	40,00	13.600,00
24	N.P.4-NO.002	Nolo a caldo di martello demolitore per demolizione manufatti in calcestruzzo	h	88,000	40,00	3.520,00
25	N.P.5-NO.003	Nolo a caldo di decespugliatore a scoppio per la pulizia e la scerbatura dei versanti stradali e delle pertinenze delle stesse	h	40,000	1,50	60,00
26	N.P.6-NO.004	Nolo a caldo di autocarro a cassa ribaltabile con portata massima di mc. 15.00	h	39,000	40,00	1.560,00
27	OP.001	Operaio Comune	h	294,000	16,98	4.992,12
28	OP.003	Operaio Qualificato	h	852,000	18,63	15.872,76
29	6.1.4.1	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) da porsi in opera anche con vibrofinitrice su superfici regolari quali: strato di base, pavimentazione esistente opportunamente preparata	p			
			m <sup>2</sup> xcm	38.286,500	1,02	39.052,23
30	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldat	kg	2.666,100	2,11	5.625,47
31	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese	kg	2.666,100	1,90	5.065,59
32	11.2	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie,	m <sup>2</sup>	21,990	16,20	356,24
33	6.5.1.2	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Fe 360 B zincato a caldo, conforme al D.M. 18/02/1992 n. 223 e successive modifiche ( D.M. 03/06/1998 e D.M.11/06/1999), sottoposta alle	m	193,850	30,90	5.989,97
34	N.P.7-ANA.001	Fornitura e posa in opera di malta cementizia				
		A RIPORTARE				509.396,25

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			509.396,25
35	N.P.8-ANA.0 02	fibrorinforzata in pressione, previa armatura con rete elettrosaldada da compensarsi a parte, compreso l'onere per la rettifica della scarpata attraverso m <sup>2</sup>	220,000	36,91	8.120,20
36	6.1.5.1	Adeguamento a norma delle barriere stradali esistenti mediante lo smontaggio delle lame, l'estrazione dei piantoni, la collocazione ad altezza di norma dei nuovi profilati metallici costituenti i nuov m	996,260	23,89	23.800,65
37	N.P.9-6.6.3.2	Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per attrito minore di 22 m <sup>2</sup> xcm	42.279,320	1,16	49.044,01
38	N.P.10-6.6.5.2	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, dati in opera con cad. cad.	8,000	326,30	2.610,40
39	6.6.17	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con n.2 sostegn cad.	22,000	227,30	5.000,60
40	N.P.11-6.6.9	Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite in calcestruzzo cementizi cad.	24,000	75,70	1.816,80
41	6.6.20.2	Fornitura e collocazione di segnali rettangolari delle dimensioni di 27x80 cm, in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rivestiti sulla faccia anteriore interamen cad.	11,000	40,10	441,10
42	6.6.21	Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di supporto per l'attacco al palo D 60 mm. del diametro di 80 cm cad.	8,000	104,20	833,60
43	6.6.22	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente tipo centralite del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifran m <sup>2</sup>	591,670	6,80	4.023,36
		Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, con gli oneri e prescrizioni di cui al precedente art.6.6.21 m	5.322,000	0,72	3.831,84
		A RIPORTARE			608.918,81
					608.918,81

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	608.918,81	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	12.479,15	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	596.439,66	596.439,66
Il ribasso d'asta del 7,319% su € 596.439,66	€		43.653,42
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		552.786,24
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		12.479,15
<b>Lavori a misura al netto</b>	€		<b>565.265,39</b>
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI A CUI SI DETRAE:</b>	€		<b>565.265,39</b>
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 05/12/2007 di € 167185,44			
N°2 del 26/02/2008 di € 263040,93			
N°3 del 21/07/2008 di € 132212,69			
<b>SOMMANO</b>	€	<b>562.439,06</b>	
<b>TOTALE A DETRARRE</b>	€		<b>562.439,06</b>
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€		<b>2.826,33</b>


Messina li', 22/09/2008  
 Il Direttore dei lavori  
 Ing. Giovanni ILETTINI

Il Responsabile del procedimento  
 Ing. Giuseppe CELI

L'impresa  
**IMPRESA EDILE**  
**SCAFIDI ANTONINO**  
 Sede: Via Carisano sopra Pianocapicci, Lincati (ME)  
 Uff. Via L. Comi - Lincati (ME)  
 Cod. Fisc. 00473830334  
 Partita IVA 00473830334

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di MESSINA

Il Responsabile del procedimento  
 Ing. Giuseppe CELI



**STUDIO DI INGEGNERIA** ---- **Ing. Salvatore Celona**  
Via Grioli n. 35 – 98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) tel. 329/8138102 e-mail: celonaing.cd@libero.it

**PROVINCIA DI MESSINA**

**COLLAUDO TECNICO  
AMMINISTRATIVO**

POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell’argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)”.

**Il Collaudatore: ing. Salvatore Celona**



O. S. del 13/07/2007 prot. n.1326/7°/1° veniva sostituito il geom. Mario Lucchese con il geom. Mario Papa come Direttore Operativo.


Il quadro di spesa dei lavori approvato risultava il seguente:

**a) Importo lavori**

Importo dei lavori a misura	€.	609.199,60
Importo oneri di sicurezza non soggetti a r.a.	€.	12.484,89
		<hr/>
Importo complessivo lavori a base d'asta	€.	596.714,71
		<hr/>
	€.	609.199,60

**b) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

per progettazione (art. 18 c.1 L109/94) 2%	€.	12.183,99
per collaudo amministrativo	€.	4.748,42
per assicurazione progett. 0,05%	€.	304,60
per accantonamento (art. 26 c.4 L.109/94) 3%	€.	18.275,99
per imprevisti <5%	€.	10.447,48
per pratiche eventuali esproprio	€.	5.000,00
per oneri conferimento in discarica	€.	5.000,00
per pubblicazione bando di gara	€.	11.000,00
per pubblicazione avvisi "Ad Opponendum"	€.	2.000,00
per IVA ed altre imposte 20%	€.	121.500,00
		<hr/>
Sommano	€.	190.800,40
		<hr/>
	€.	190.800,40
		<hr/>
Importo complessivo del progetto	€.	800.000,00



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Papa".


**Finanziamento progetto.** Contributo concesso dall'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici con D.D.G. n.1558/15bis del 20/11/2006, e cofinanziato per il 5% dalla Provincia Regionale di Messina con Delibera della Giunta Provinciale n. 305 del 22/11/2005.

**Oggetto dell'appalto.** Trattasi di lavori necessari che prevedono la messa in sicurezza delle Strade Provinciali quali arterie viarie che consentono il collegamento all'interno del circuito Turistico Religioso Villafranca – Calvaruso – Serro. Ciò al fine di garantire e migliorare le condizioni di transitabilità delle strade, provvedendo contestualmente ad allargare la careggiata ed a migliorare le condizioni di visibilità.

**Aggiudicazione dei lavori.** A seguito di gara d'appalto esperita il 17/05/2007 ed alla successiva riapertura in data 10/07/2007, l'appalto è stato aggiudicato all'impresa "Scafidi Antonino" di Lipari (ME) con il ribasso del 7,319%.

**Contratto di appalto.** E' stato stipulato il 02/08/2007, n. 13391 di Rep. e registrato a Messina il 10/08/2007 al N. 2274 Serie I. Con detto contratto, i lavori sono stati affidati all'impresa predetta per l'importo di €. 553.041,16 pari al prezzo a base d'asta di €.596.714,71 decurtato del ribasso (7,319%) offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza pari a €.12.484,89.

**Deposito cauzionale.** Dal Contratto di appalto risulta che l'impresa ha costituito un deposito cauzionale di € 28.325,38 con polizza assicurativa fideiussoria (cauzione definitiva) n. 46719386 emessa



A handwritten signature in black ink.

A second handwritten signature in black ink.

dalla "Aurora Assicurazioni S.p.a.", agenzia di Lipari n. 27614 della durata di anni 2 (due) decorrente dal 01/08/2007.


**Direzione lavori.** I lavori sono stati diretti dal funzionario della Provincia di Messina ing. Giovanni Lentini e dal funzionario della Provincia di Messina geom. Mario Papa nella funzione di Direttore Operativo giusta l'Ordine di Servizio del R.U.P. del 21/02/2007 prot. n. 344/7°1° e Ordine Servizio del 13/07/2007 prot. n.1326/7°/1°.

**Consegna dei lavori.** La consegna dei lavori è stata effettuata in data 10/09/2007 come risulta dal relativo verbale in pari data, ed i lavori hanno avuto inizio il 14/09/2007 giusto verbale di concreto inizio dei lavori.

Con nota prot. 26800 del 04/09/2007 è stata inoltrata con raccomandata A/R la Notifica preliminare ai sensi del D.L.vo 494/96 come modificato dal D.L.vo 528/99 agli organi di vigilanza e controllo (AUSL n. 5 e Direzione Provinciale del Lavoro).

**Durata dei lavori e penale per il ritardo.** I tempo utile per la ultimazione dei lavori è stato fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto) con penale pari 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; i lavori pertanto dovevano essere iniziati entro il 15/09/2007 e completati entro il 09/09/2008.

**Perizia di variante.** In data 14/07/2008 prot. n. 1332/7°/1° del R.U.P. e quindi in corso d'opera, è stata autorizzata la redazione di una Perizia di Variante ai sensi dell'art. 25 c.3° della L.109/94. In



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lu".

A second handwritten signature in black ink, appearing to be "S".

data 01/09/2008 è stata redatta dal Direttore dei Lavori una perizia di variante di assestamento somme finale, approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parere n. 08 del 01/09/2008, ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n° 31/7°/1° del 01/09/2008.



il quadro di spesa della perizia di variante risulta il seguente:

**a) Importo lavori**

Importo dei lavori a misura	€. 608.918,81	€. 608.918,81
Importo oneri di sicurezza	€. 12.479,15	
Importo lavori a base d'asta	€. 596.439,66	
Ribasso d'asta del 7,319%	€. 43.653,42	€. 43.653,42
<b>Importo complessivo Perizia lavori al netto</b>		<b>€. 565.265,39</b>

**b) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

per progettazione	€. 12.067,09	
per collaudo amministrativo	€. 4.748,42	
per assicurazione progett.	€. 3.696,40	
per pratiche eventuali esproprio	€. 4.980,00	
per oneri conf. in discarica	€. 26.397,72	
per pubbl. bando di gara	€. 15.663,64	
per pubbl. avvisi	€. 1.750,00	
per IVA ed altre imposte	€. 113.053,08	
<b>Sommano</b>	<b>€. 182.326,35</b>	<b>€. 182.326,35</b>
<b>Importo complessivo della Perizia di Variante</b>		<b>€. 800.000,00</b>



Due firme autografe scritte sopra le stampe ufficiali.

**Atti suppletivi.** A seguito della redazione della Perizia di Variante in data 01/09/2008 è stato sottoscritto atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 22/09/2008, repertoriato presso l'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina il 21/10/2008 al n. 217, con tale atto furono convenuti n. 11 nuovi prezzi non previsti dal contratto d'appalto.

**Sospensione e ripresa dei lavori.** Non risulta nessuna sospensione dei lavori.

**Ultimazione dei lavori e ritardo nella loro esecuzione.** Come risulta dal Certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/07/2008, i lavori sono stati ultimati il 24/07/2008 e pertanto entro il termine utile contrattuale.


**Pagamenti in acconto.** Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di acconto:

- Certificato n. 1 in data 05/12/2007	€ 167.185,44
- Certificato n. 2 in data 17/03/2008	€ 263.040,93
- Certificato n. 3 in data 21/07/2008	€ 132.212,69
<b>Totale certificati di pagamento emessi</b>	<b>€ 562.439,06</b>

**Danni di forza maggiore.** Come risulta dalla certificazione del Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori non si è registrato alcun danno di forza maggiore.

**Stato finale dei lavori.** E' stato redatto dalla D.L. in data 17/09/2008 e sottoscritto dall'impresa senza riserva. In esso sono riportati gli importi di seguito indicati:

a) importo lordo dei lavori	€ 596.439,66
b) a detrarre il ribasso del 7,319%	- € 43.653,42
<b>Importo netto</b>	<b>€ 565.265,39</b>



**Credito dell'impresa.** Dal confronto tra l'importo netto contabilizzato e le somme erogate resta il credito dell'impresa di seguito calcolato:

- Importo netto dei lavori	€ 565.265,39
- A detrarre certificati S.A.L.	- € 562.439,06
<b>Resta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 2.826,33</b>

Tra le somme previste a disposizione dell'Amministrazione risulta inoltre liquidato all'impresa l'importo di €. 4980,00 per oneri conferimento in discarica di mc. 415,00 di materiale di risulta e l'importo di €. 4.920,00 per frazionamento, picchettamento e rettifica terreno espropriato alla ditta Oteri Maria Letizia (giusta convenzione stipulata in data 07/11/2007) .

**Riserve.** L'impresa appaltatrice ha sottoscritto il registro di contabilità senza riserve.

**Parallelo tra progetto e spesa.**

- Importo del progetto	€ 609.199,60
- Importo netto Perizia di Variante	€ 565.265,39
- Importo netto dello stato finale	- € 565.265,39
<b>Economia</b>	<b>€ 0,00</b>

**Infortuni nel corso dei lavori.** Non risultano essersi verificati infortuni.

**Assicurazione degli operai.** L'impresa, come si evince dalla relazione di accompagnamento allo stato finale, ha provveduto ad assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo, con posizione assicurativa continuativa n° 2619133.

**Avvisi ad opponendum.** Il direttore dei lavori in data 14/10/2008 ha attestato le non pervenute opposizioni alla pubblicazione presso



l'albo Pretorio del Comune di Villafranca Tirrena (ME) degli avvisi ad opponendum trasmessi con nota n. 26871 del 08/09/2008.

**Cessione di credito.** Come risulta dalla certificazione in data 09/09/2008 del Direttore dei Lavori, l'impresa per l'esecuzione dei lavori non ha aperto cave di prestito.

**Collaudatore.** L'incarico di procedere al collaudo tecnico amministrativo dei lavori in oggetto è stato affidato dall'Assessorato Regionale Lavori Pubblici, Dipartimento Lavori Pubblici Servizio 6° Infrastrutture Viarie e Trasporti al sottoscritto ing. Salvatore Celona, con disciplinare d'incarico sottoscritto in data 22/05/2009.


#### VISITA DI COLLAUDO

Il sottoscritto collaudatore ha effettuato la visita di collaudo in data 15/07/2009 e in data 22/07/2009 ed il verbale delle sopraccitate visite fa parte integrante della presente.

**Risultato della visita e andamento dei lavori.** Dall'esame della documentazione allegata al conto finale, si rileva: le opere realizzate sono conformi al progetto ed agli atti contabili.

#### RELAZIONE DI COLLAUDO

**Atto di sottomissione e nuovi prezzi.** Per tener conto delle varie tipologie di lavori non contemplati nel contratto scaturenti dalla perizia di variante redatta in data 01/09/2008, senza ulteriore incremento di impegno di spesa, è stato sottoscritto atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 22/09/2008, repertoriato presso l'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina il 21/10/2008 al n. 217 e con tale atto furono convenuti n.11 nuovi prezzi non previsti dal contratto d'appalto.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Celona".

**Revisione tecnico contabile.** Dalla revisione tecnico-contabile sono emersi errori nei libretti di misura e nel Registro di Contabilità, mentre non si sono riscontrate nel corso delle visite di collaudo discordanze tra le opere realizzate e le partite allibrate. E' da rilevare che tra progetto esecutivo e lavori eseguiti e contabilizzati si è avuto un'economia di spesa pari a € 0,00.

**Correzioni da apportare allo Stato finale dei lavori.** Dagli atti contabili si evince la seguente correzione da apportare allo Stato finale dei lavori:

**1) Libretto misure n.1**

- Voce 5 - 1.2.5.1 Trasporto di materiale

Voce 2 mc 119,82 (demolizione di manufatti)

Voce 3 mc 197,81 (scavo di sbancamento)

Voce 4 mc 537,79 (scavo a sezione)

Voce 6 mq  $242,03 \times 0,03 = mc 7,26$  (scarificazione 3cm)

Voce 7 mq  $(2,95 \times 1,325 + 1,95 \times 3,375 + 31,60 \times 5,60 + 15,75 \times 1,050 + 15,85 \times 2,0) = mq 242,03 \times 0,07 = mc 16,94$  (scarificazione 7cm)

A detrarre rinterro (Voce 22 - 1.2.4) - mc 91,07

Totale mc =  $119,82 + 197,81 + 537,79 + 7,26 + 16,94 - 91,07 = mc 788,55$

Pertanto si ha:  $mc 788,55 \times 5km = 3.942,75 mc \times km$

**2) Libretto misure n.2**

- Voce 35 - 1.2.5.1 Trasporto di materiale



Voce 32 mc 64,45 (demolizione di manufatti)

Voce 33 mc 223,26 (scavo di sbancamento)

Voce 34 mc 1.807,00 (scavo a sezione)

A detrarre rinterro (Voce 45 - 1.2.4) - mc 659,25

Totale mc =  $64,45 + 223,26 + 1.807,00 - 659,25 = mc 1.435,46$



Pertanto si ha:  $mc\ 1.435,46 \times 5km = 7.177,30\ mcxkm$

**3) Libretto misure n.3**

- Voce 74 - OP.003 Operaio qualificato  $h = 104$

Lista settimanale n. 17 risulta  $h = 168$ ; Pertanto si ha:  $h = 168$

**4) Sommario Registro Contabilità relativo al S.A.L. n.3**

Risulta difforme in quanto è incrementato di € 227,30 rispetto al Registro di Contabilità.

**5) Registro Contabilità**

- Voce 2 - NP01 1.3.4 Demolizione parziali lavori stradali

Difformità nell'importo registrato € 15,20 rispetto all'importo di €12,80 previsto con verbale concordamento nuovi prezzi n.1 e atto di sottomissione del 22/09/2008;  $mc\ 119,82 \times €\ 12,80 = €\ 1.533,70$

**differenza € 1.533,70 - € 1.821,26 = - € 287,56 ( a detrarre)**

- Voce 5 - 1.2.5.1 Trasporto di materiale (da correzione libretto misure n. 1):  $mcxkm\ 3.942,75 \times €\ 0,36 = €\ 1.419,39$

**differenza € 1.419,39 - € 1.539,76 = - € 120,37 ( a detrarre)**

- Voce 15 - NP02 6.1.2 Fondazione stradale


Difformità nell'importo registrato € 16,90 rispetto all'importo di €15,80 previsto con verbale concordamento nuovi prezzi n.1 e atto di sottomissione del 22/09/2008;  $mc\ 239,82 \times €\ 15,80 = €\ 3.786,47$

**differenza € 3.786,70 - € 4.050,09 = - € 263,62 ( a detrarre)**

- Voce 32 - NP01 1.3.4 Demolizione parziali lavori stradali

Difformità nell'importo registrato € 15,20 rispetto all'importo di €12,80 previsto con verbale concordamento nuovi prezzi n.1 e atto di sottomissione del 22/09/2008;  $mc\ 64,45 \times €\ 12,80 = €\ 824,96$

**differenza € 824,96 - € 979,64 = - € 154,68 ( a detrarre)**



- Voce 35 - 1.2.5.1 Trasporto di materiale (da correzione libretto misure n. 2): mcxkm 7.177,30x € 0,36= € 2.583,83

**differenza € 2.583,83 - € 3.654,47 = - € 1.070,64 ( a detrarre)**

- Voce 39 - 3.1.1 Conglomerato cementizio a kg 200

mc 215,72x € 70,20= € 15.143,54

**differenza € 15.143,54 - € 15.143,56 = - € 0,02 ( a detrarre)**

- Voce 42 - 6.3.2 Fornitura e posa pietrame

Difformità nella misura registrata mc 384,25 rispetto alla misura di mc 384,23 riportata nel libretto misure n. 2 (importo corretto);

- Voce 44 - NP02 6.1.2 Fondazione stradale

Difformità nell'importo registrato € 16,90 rispetto all'importo di €15,80 previsto con verbale concordamento nuovi prezzi n.1 e atto di sottomissione del 22/09/2008; mc 326,15x € 15,80= € 5.153,17

**differenza € 5.153,17 - € 5.511,94 = - € 358,77 ( a detrarre)**

- Voce 57 - NP06 NO.004 Nolo a caldo di autocarro

Difformità nella misura registrata 32,00h rispetto alla misura di 34,00h riportata nel libretto misure n.2 (importo corretto);

- Voce 62 - NP02 6.1.2 Fondazione stradale


Difformità nell'importo registrato € 16,90 rispetto all'importo di €15,80 previsto con verbale concordamento nuovi prezzi n.1 e atto di sottomissione del 22/09/2008; mc 154,04x € 15,80= € 2.433,83

**differenza € 2.433,83 - € 2.603,28 = - € 169,45 ( a detrarre)**

- Voce 68 - NP10 6.6.5.2 Fornitura e coll. segnale rettangolare

Difformità nella misura registrata 22,00 rispetto alla misura di 23,00 riportata nel libretto misure n. 2; n 23,00x € 227,30= € 5.227,90

**differenza € 5.227,90 - € 5.000,60 = + € 227,30 ( a sommare)**



- Voce 74 - OP.003 Operaio qualificato (da correzione libretto misure n. 3): h 168,00x € 18,63= € 3.129,84

**differenza € 3.129,84 - € 1.937,52 = + € 1.192,32 ( a sommare)**

**- Sommano i lavori**

**Totale Lavori dal Registro Contabilita € 608.918,81**

Voce 2	- €	287,56
Voce 5	- €	120,37
Voce 15	- €	263,62
Voce 32	- €	154,68
Voce 35	- €	1.070,64
Voce 39	- €	0,02
Voce 44	- €	358,77
Voce 62	- €	169,45
Voce 68	+ €	227,30
Voce 74	+ €	1.192,32


**Totale Lavori € 607.913,32**

**differenza € 607.913,32 - € 608.918,81 = - € 1.005,49 ( a detrarre)**

**CERTIFICATO DI COLLAUDO**

Visti:

- il progetto dei lavori in oggetto redatto in data 14/10/2005 dagli ingg. Giovanni Lentini (Capogruppo) e Anna Chiofalo e dai geom. Filadelfio Magno e Mario Lucchese, tutti dipendenti della Provincia Regionale di Messina;
- il contratto di appalto stipulato in data 02/08/2007, n. 13391 di Rep. e registrato a Messina il 10/08/2007 al N. 2274 Serie I. Con detto contratto, i lavori sono stati affidati all'impresa "Scafidi Antonino" di Lipari (ME) per l'importo di




A handwritten signature in black ink, located below the official stamp.

€.553.041,16 pari al prezzo a base d'asta di €.596.714,71 decurtato del ribasso (7,319%) offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza pari a €.12.484,89;

- il verbale di consegna dei lavori in data 10/09/2007, ed il verbale concreto inizio lavori in data 14/09/2007;
- la perizia di variante redatta in data 01/09/2008;
- l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi stipulato in data 22/09/2008, repertoriato presso l'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina il 21/10/2008 al n. 217, senza incremento di spesa contrattuale, e in tale atto furono convenuti n. 11 nuovi prezzi non previsti dal contratto di appalto;
- il certificato di ultimazione dei lavori, redatto in data 24/07/2008;
- lo stato finale dei lavori in data 22/09/2008;
- i verbali delle visite di collaudo;

Considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni del progetto e della successiva perizia di variante, nel rispetto delle previsioni di capitolato e con buoni materiali;
- per quello che è stato ispezionato le annotazioni corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- per quanto non è stato ispezionato, di difficile ispezione o non è stato controllato, la direzione dei lavori e l'impresa hanno assicurato la perfetta rispondenza tra le previsioni e le opere eseguite e contabilizzate e l'impresa per gli effetti




dell'art. 1667 del C.C. ha in particolare dichiarato non esservi difformità o vizi;

- l'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro il limite della spesa autorizzata con un'economia pari a € 0,00;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta entro il termine utile contrattuale del 09/09/2008;
- l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti derivanti dall'appalto in argomento;
- dalla certificazione in data 14/10/2008 del Direttore dei Lavori sugli avvisi ad opponendum risulta che non sono pervenute opposizioni alla pubblicazione presso il Comune di Villafranca Tirrena (ME);
- l'impresa ha ottemperato agli obblighi derivanti dal contratto;
- dalla certificazione del Direttore dei Lavori risulta che l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Quanto sopra considerato, il sottoscritto collaudatore ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato n. 350 del 25/05/1895, dal Regolamento n.554/99 e successive modifiche ed integrazioni

### **CERTIFICA**

che i lavori POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell'argilla) e dei poli culturali sul circuito



turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)” eseguiti dall’impresa “Scafidi Antonino” di Lipari (ME), in base al contratto di appalto del 02/08/2007, n. 13391 di Rep. e registrato a Messina il 10/08/2007 al N. 2274 Serie I, ed Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi stipulato in data 22/09/2008, repertoriato presso l’Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina il 21/10/2008 al n.217, sono collaudabili, come in effetti col presente atto


### COLLAUDA

e liquida il credito residuo dell’impresa appresso riportata:  
dal confronto tra l’importo lordo contabilizzato, le somme erogate e la correzione, resta il credito dell’impresa di seguito calcolato:

1. importo lordo dei lavori	€ 608.918,81	
2. a detrarre correzione	-€ 1.005,49	
3. importo lordo corretto	€ 607.913,32	€ 607.913,32
4. oneri sicurezza	€ 12.479,15	
5. importo lavori sogg. a rib.	€ 595.434,17	
6. a detrarre rib. d’a. 7.319%	-€ 43.579,83	-€ 43.579,83
7. importo netto dei lavori		€ 564.333,49
8. A detrarre certificati emessi S.A.L.		-€ 562.439,06
<b>resta il credito dell’impresa</b>	<b>€ 1.894,43</b>	

(diconsi euro milleottocentonovantaquattro/43) che possono essere pagati dopo l’approvazione del presente atto.

Le risultante del presente certificato di collaudo sono subordinate alle eventuali rettifiche che l’ufficio tecnico di revisione può apportare ai sensi dell’art. 199, comma 2 lett.c), del Regolamento n.554/1999.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jus'.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a stylized 'C' or similar character.

Il presente certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 199, comma 3, del Regolamento n. 554/99, ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua data di emissione ovvero diversa indicazione stabilita nel capitolato speciale d'appalto per detta emissione.

Decorsi i due anni, il presente collaudo si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.


Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Messina li 23 LUG. 2009

**L'Impresa**  
Società a partecipazione paritetica  
Sede in: Messina - Scafo - ARAGONTE - LIPARI - ME  
Sig. **Antonino Scafidi**  
383033

**Il direttore dei Lavori**  
ing. **Giovanni Lentini**

**Il Collaudatore**  
ing. **Salvatore Celona**



Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

ing. **Giuseppe Celi**

**STUDIO DI INGEGNERIA** ---- Ing. Salvatore Celona  
Via Grioli n. 35 – 98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) tel. 329/8138102 e-mail: celonaing.cd@libero.it

## PROVINCIA DI MESSINA

### VERBALE DI VISITA DEL 15.07.2009

POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell’argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)”.


Il Collaudatore: ing. Salvatore Celona

PROVINCIA DI MESSINA

**OGGETTO:** POR SICILIA 2000 - 2006 Mis. 6.01 "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell'argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca - Calvaruso - Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)".

**IMPRESA:** "Scafidi Antonino" di Lipari (ME).

**CONTRATTO:** N° 13391 di rep. del 02/08/2007 registrato a Messina il 10/08/2007 al N. 2274 Serie I.



**VERBALE DI VISITA DEI LAVORI**

L'anno 2009 il giorno quindici del mese di luglio dinanzi il Palazzo Municipale del Comune di Villafranca Tirrena, a seguito di preavviso dato dal sottoscritto via fax con nota del 16/06/2009 si sono ritrovati i sigg.:

ing. Salvatore Celona, Collaudatore Tecnico Amministrativo, libero professionista;

ing. Giovanni Lentini, Direttore dei Lavori in oggetto, dipendente della Provincia Regionale di Messina;


geom. Mario Papa, Direttore Operativo dei Lavori in oggetto, dipendente della Provincia Regionale di Messina;

sig. Scafidi Antonino Titolare dell'impresa omonima;

**Esame dei documenti.**

Lo scrivente, riuniti gli intervenuti ed i loro collaboratori, ha proceduto in primo luogo all'esame dei documenti di appalto ricevuti e di quelli messi a disposizione al momento, rilevando gli elementi appresso descritti:

**Oggetto dell'appalto.** Trattasi di lavori necessari che prevedono la messa



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

in sicurezza delle Strade Provinciali quali arterie viarie che consentono il

collegamento all'interno del circuito Turistico Religioso Villafranca – Calvaruso – Serro. Ciò al fine di garantire e migliorare le condizioni di transitabilità delle strade, provvedendo contestualmente ad allargare la carreggiata ed a migliorare le condizioni di visibilità.


**Aggiudicazione dei lavori.** A seguito di gara d'appalto esperita il 17/05/2007 ed alla successiva riapertura in data 10/07/2007 in base ai risultati della stessa, l'appalto è stato aggiudicato all'impresa "Scafidi Antonino" di Lipari (ME) con il ribasso del 7,318%.

**Contratto di appalto.** E' stato stipulato il 02/08/2007, n. 13391 di Rep. e registrato a Messina il 10/08/2007 al N. 2274 Serie I. Con detto contratto, i lavori sono stati affidati all'impresa predetta per l'importo di €. 553.041,16 pari al prezzo a base d'asta di €. 596.714,71 decurtato del ribasso (7,318%) offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza pari a €.12.484,89.

**Progetto esecutivo.** Il progetto esecutivo è stato redatto in data 14/10/2005 dagli ingg. Giovanni Lentini (Capogruppo) e Anna Chiofalo e dai geom. Filadelfio Magno e Mario Lucchese, all'uopo incaricato con Ordine di Servizio del 10/06/2005 prot. n. 624/7°1°.

Con Determina del Presidente della Provincia di Messina n. 55 del 27/09/2005 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Giuseppe Celi.

Il progetto veniva validato dal R.U.P. in data 07/11/2005 e approvato in linea tecnica in data 15/11/2005 con parere n.05/7°/1°, ed approvato in linea amministrativa dalla G. P. con delibera n° 304 del 22/11/2005.



Con l'O. S. del R.U.P. del 21/02/2007 prot. n. 344/7°1° veniva incaricato

l'ing. Giovanni Lentini Direttore dei Lavori e il geom. Mario Lucchese

Direttore Operativo. Successivamente con O. S. del 13/07/2007 prot.

n.1326/7°/1° veniva sostituito il geom. Mario Lucchese con il geom. Mario

Papa come Direttore Operativo.


Il quadro di spesa dei lavori approvato risultava il seguente:

**a) Importo lavori**

Importo dei lavori a misura	€.	609.199,60
Importo oneri di sicurezza non soggetti a r.a.	€.	12.484,89
Importo complessivo lavori a base d'asta	€.	596.714,71
		<b>€. 609.199,60</b>

**b) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

per progettazione (art. 18 c.1 L109/94) 2%	€.	12.183,99
per collaudo amministrativo	€.	4.748,42
per assicurazione progett. 0,05%	€.	304,60
per accantonamento (art. 26 c.4 L.109/94) 3%	€.	18.275,99
per imprevisti <5%	€.	10.447,48
per pratiche eventuali esproprio	€.	5.000,00
per oneri conferimento in discarica	€.	5.000,00
per pubblicazione bando di gara	€.	11.000,00
per pubblicazione avvisi "Ad Opponendum"	€.	2.000,00
per IVA ed altre imposte 20%	€.	121.500,00
Sommano	€.	190.800,40
		<b>€. 190.800,40</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>	<b>€.</b>	<b>800.000,00</b>



Handwritten signature and scribbles over the stamp area.

**Finanziamento progetto. Contributo concesso dall'Assessorato Regionale**

ai Lavori Pubblici con D.D.G. n.1558/15bis del 20/11/2006, e cofinanziato per il 5% dalla Provincia Regionale di Messina con Delibera della Giunta Provinciale n. 305 del 22/11/2005.

**Visita dei lavori.** Lo scrivente, riuniti gli intervenuti ed i loro collaboratori, ha proceduto in primo luogo alla visita dei lavori con una ricognizione generale dei luoghi in cui sono stati eseguiti ed in fase di esecuzione i lavori in appalto.

Sono stati riscontrati e verificati alcuni lavori tra cui:

**6.1.4.1** Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), etc.:

Libr. misure n° 3 voce 63 pag. 38 – Tav. Cont. 3°SAL Plan.Pav. Stradale;

**Rilievo:** SP 52Bis km 0+300/0+500; spessore h=8cm

**6.1.5.1** Conglomerato bituminoso per strato di usura, etc.:

Libr. misure n° 3 voce 64 pag. 39 – Tav. Cont. 3°SAL Plan. Pav. Stradale;

**Rilievo:** SP 52Bis km 0+300/0+500; spessore h=4cm

**6.6.22** Esecuzione di strisce longitudinale della larghezza di 12 cm etc.:

Libr.misure n° 3 voce 73 pag. 41 – Tav. Cont. 3°SAL Plan. Segn. Stradale;

**Rilievo:** innesto SP 52Bis/52 km 7+720; strisce di margine dx ml.100, strisce di margine sx ml.100, mezzeria ml. 100;

**NP09 6.6.3.2** Fornitura e collocaz. Segnale rettangolare 90x120cm,etc.:


Libr.misure n° 3 voce 65 pag. 39 – Tav. Cont. 3°SAL Plan. Segn. Stradale;

**Rilievo:** innesto SP 52Bis/Via delle Rimembranze km 7+720; n.2;

**6.6.1** Fornitura e collocaz. Segnale triangolare con lato 90cm,etc.:

Libr.misure n° 3 voce 66 pag. 39 – Tav. Cont. 3°SAL Plan. Segn. Stradale;


**Rilievo:** innesto SP 52Bis/Via delle Rimembranze km 7+720 inters. T; n.2;



Dai rilievi è emerso la rispondenza e la conformità tra i lavori eseguiti e i

libri contabili.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare la direzione dei lavori e l'impresa hanno concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione. In ultimo l'Impresa per gli effetti dell'art. 1667 del c.c. ha dichiarato non esservi nei lavori eseguiti difformità o vizi.



**CONCLUSIONI DELLA VISITA – RISULTANZE DELL'ESAME  
DEI DOCUMENTI E DEI LAVORI**

Il sottoscritto al termine delle operazioni di cui al presente verbale, ritiene di potere trarre le seguenti conclusioni:

1) le opere verificate sono conformi al progetto ed agli atti contabili.

Vista l'estesa dislocazione degli interventi, si stabilisce inoltre il proseguimento della visita di collaudo in data 22 luglio 2009 alle ore 9,00 dinanzi il Palazzo Municipale del Comune di Villafranca Tirrena, senza ulteriore avviso ai presenti.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale, con allegato rilievo fotografico, che letto e confermato viene sottoscritto.

**L'Impresa**

**Il Direttore dei Lavori**


**Il Direttore Operativo**

IMPRESA EDILE  
(sig. Antonino Scafidi)  
Sede: Via Vittorio Veneto, 100 - 95021 MESSINA

(ing. Giovanni Lentini)

(geom. Mario Papa)

**Il Collaudatore**



(ing. Salvatore Celona)

**FOTO ALLEGATI**


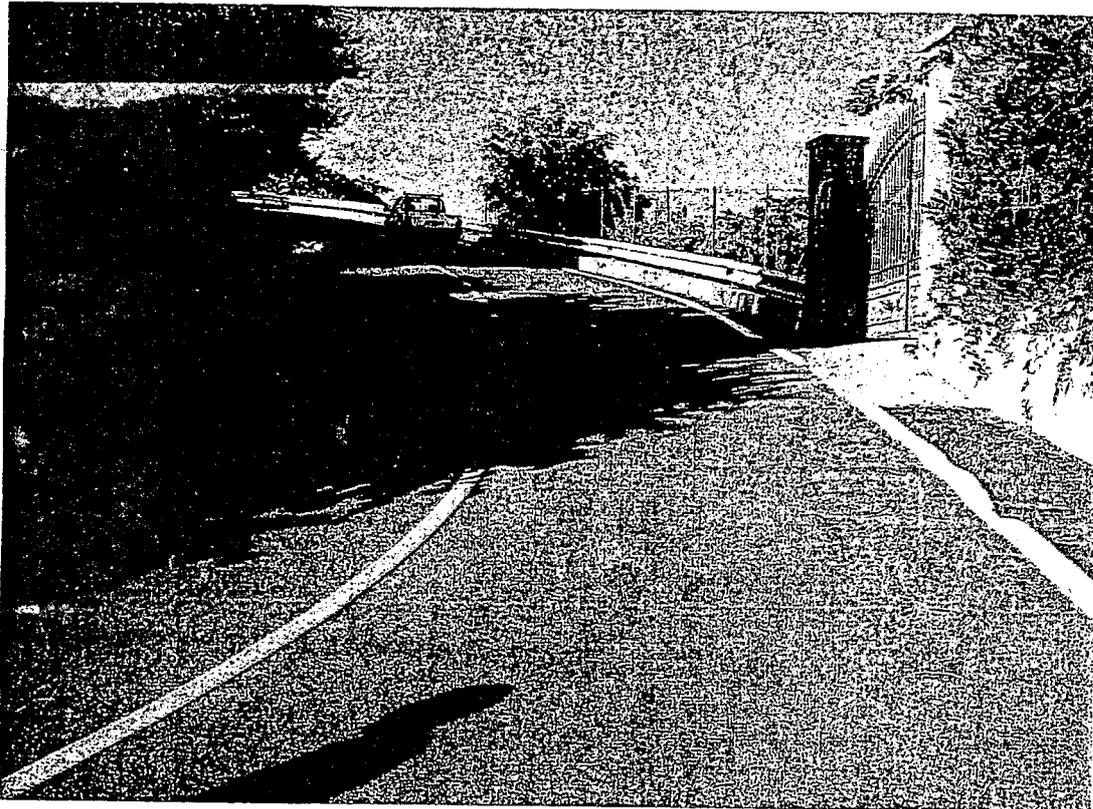


Foto n. 1 SP 52Bis km0+300 Conglomerato bituminoso.



Foto n. 2 Saggio per rilievo spessore conglomerato bituminoso SP 52Bis km0+300.



*Pa*  
*Pa*  
*Pa*



Foto n. 3 Saggio conglomerato bituminoso SP 52Bis km0+300.


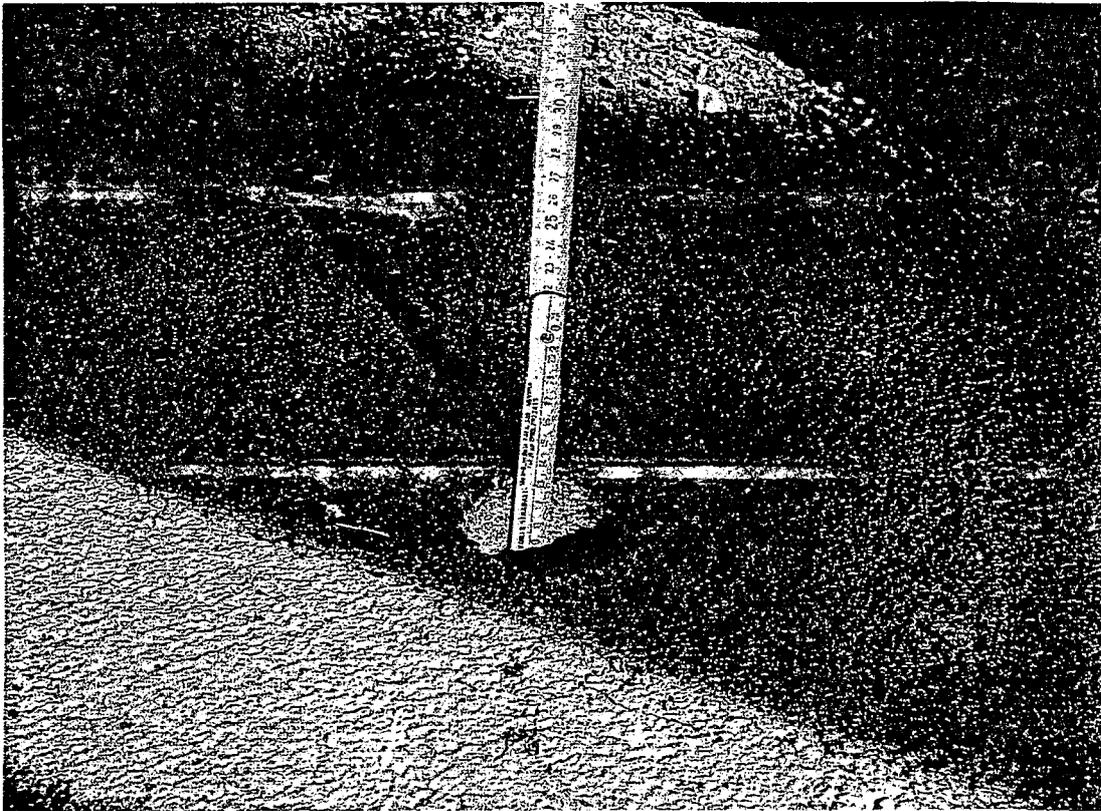


Foto n. 4 Rilievo spessore conglom. bituminoso (binder+usura) SP 52Biskm0+300.



*Salvatore Celona*


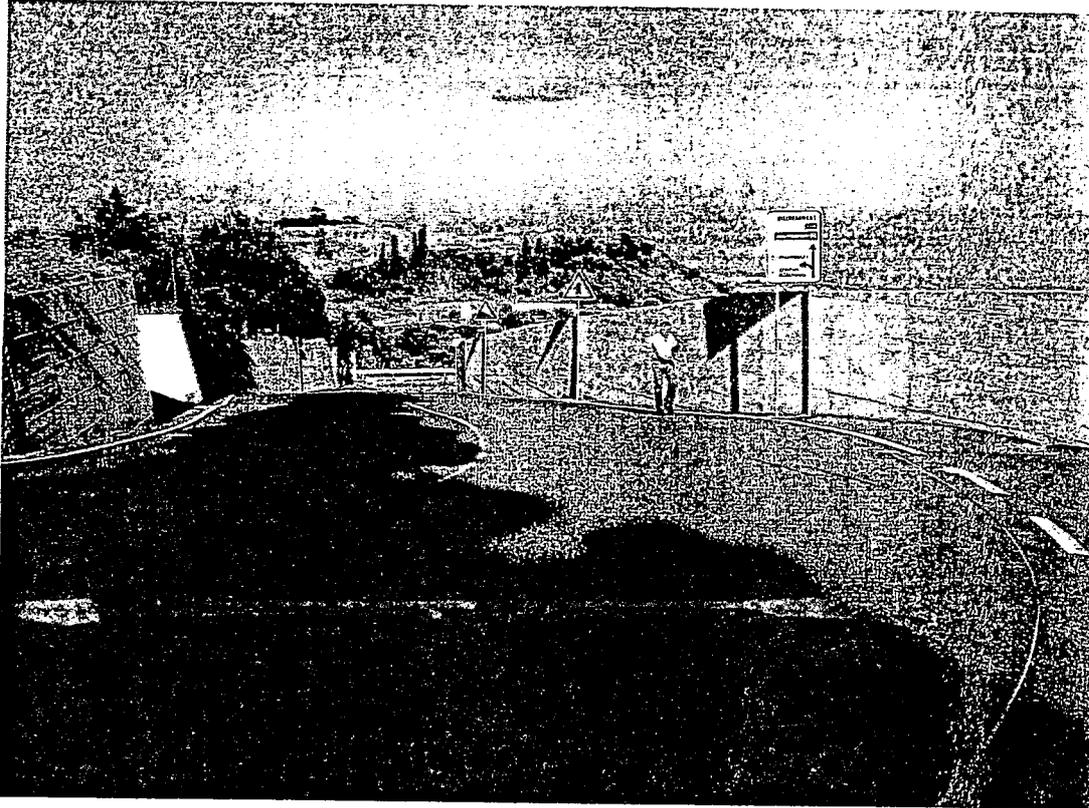


Foto n. 5 Segnaletica orizz. e verticale con innesto SP 52Bis con Via Rimembranze.



*Handwritten signature*

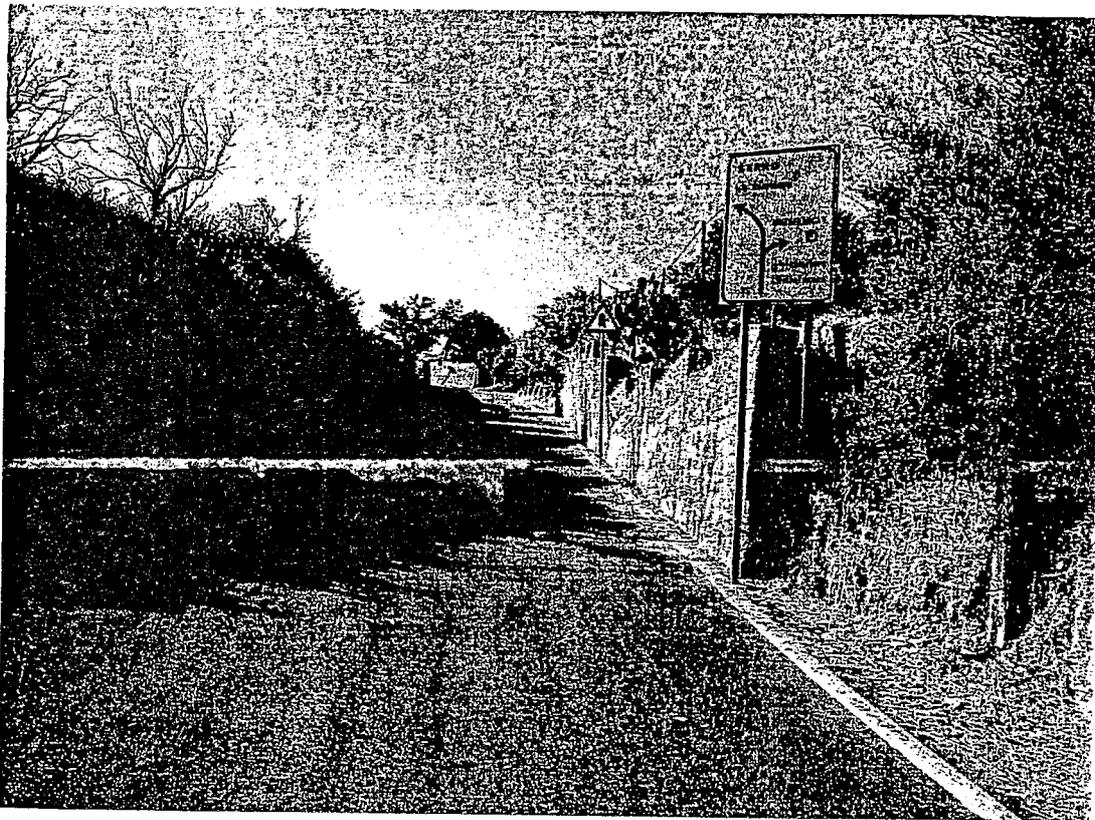


Foto n. 6 Segnaletica orizz. e verticale con innesto SP 52Bis con Via Rimembranze.

**STUDIO DI INGEGNERIA** ---- **Ing. Salvatore Celona**  
Via Grioli n. 35 – 98049 VILAFRANCA TIRRENA (ME) tel. 329/8138102 e-mail: celonaing.cd@libero.it

**PROVINCIA DI MESSINA**

**VERBALE DI VISITA  
DEL 22.07.2009**

POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell’argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)”.


**Il Collaudatore: ing. Salvatore Celona**

**PROVINCIA DI MESSINA**

**OGGETTO:** POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell’argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)”.

**IMPRESA:** “Scafidi Antonino” di Lipari (ME).

**CONTRATTO:** N° 13391 di rep. del 02/08/2007 registrato a Messina il 10/08/2007 al N. 2274 Serie I.



**VERBALE DI VISITA DEI LAVORI N° 2**


L’anno 2009 il giorno ventidue del mese di luglio dinanzi il Palazzo Municipale del Comune di Villafranca Tirrena, a seguito di preavviso dato dal sottoscritto nella visita del 15/07/2009 e via fax con nota del 15/07/2009 si sono ritrovati i sigg.:

ing. Salvatore Celona, Collaudatore Tecnico Amministrativo, libero professionista;

ing. Giovanni Lentini, Direttore dei Lavori in oggetto, dipendente della Provincia Regionale di Messina;

geom. Mario Papa, Direttore Operativo dei Lavori in oggetto, dipendente della Provincia Regionale di Messina;










sig. Scafidi Antonino Titolare dell’impresa omonima;



**Visita dei lavori.**

Lo scrivente, riuniti gli intervenuti ed i loro collaboratori, ha proceduto in primo luogo alla continuazione della visita dei lavori con una ricognizione generale dei luoghi in cui sono stati eseguiti i lavori in appalto.

Sono stati riscontrati e verificati alcuni lavori tra cui:

3.1.3.2 Conglomerato cementizio kg 250, in elevazione etc,:	
Libretto misure n° 1 voce 18 pag. 12 – Tavola Contabile 1°SAL;	
<b>Rilievo:</b> Zona 1 SP52 km 2+000;	
muro h=2,00m (4,60+7,00)x2,00x0,30; parapetto muro 11,60x0,80x0,30;	
3.2.4 Casseforme per getto di conglomerato, etc,:	  
Libretto misure n° 1 voce 16 pag. 10 – Tavola Contabile 1°SAL;	
<b>Rilievo:</b> Zona 1 SP52 km 2+000;	
muro h=2,00m (4,60+7,00)x2,00x2; parapetto muro 11,60x0,80x2;	
3.1.3.1 Conglomerato cementizio kg 250, in fondazione etc,:	  
Libretto misure n° 1 voce 17 pag. 11 – Tavola Contabile 1°SAL;	
<b>Rilievo:</b> Zona 5 Piazzale Santuario Calvaruso;	
31,60x5,60x0,15; 15,85x(2,70+2,10)/2x0,15; 15,75x2,10/2x0,15; 1,95x(3,15+3,60)/2x0,15; 2,95x(1,00+1,65)/2x0,15;	
6.1.5.1 Conglomerato bituminoso per strato di usura, etc,:	  
Libr. misure n° 3 voce 64 pag. 39 – Tav. Cont. 3°SAL Plan. Pav. Stradale;	
<b>Rilievo:</b> SP 52 Santuario Ecce Homo;	
14,50x(11,20+11,60)/2	
Dai rilievi è emerso la rispondenza e la conformità tra i lavori eseguiti e i libri contabili.	  
Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare la direzione dei lavori e l'impresa hanno concordemente	
assicurato, a seguito di esplicita richiesta, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione. In ultimo	
l'Impresa per gli effetti dell'art. 1667 del c.c. ha dichiarato non esservi nei	

lavori eseguiti difformità o vizi.

**CONCLUSIONI DELLA VISITA – RISULTANZE DELL'ESAME**

**DEI DOCUMENTI E DEI LAVORI**

Il sottoscritto al termine delle operazioni di cui al presente verbale, ritiene di potere trarre le seguenti conclusioni:

1) le opere verificate sono conformi al progetto ed agli atti contabili.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale, con allegato rilievo fotografico, che letto e confermato viene sottoscritto.

**L'Impresa**

**Il Direttore dei Lavori**

**Il Direttore Operativo**


(sig. Antonino Scafidi)

(ing. Giovanni Lentini)

(geom. Mario Papa)

*[Handwritten signatures of Antonino Scafidi, Giovanni Lentini, and Mario Papa]*

**Il Collaudatore**



(Dott. Ing. Salvatore Celona)

*[Handwritten signature of Salvatore Celona]*

**FOTO ALLEGATI**

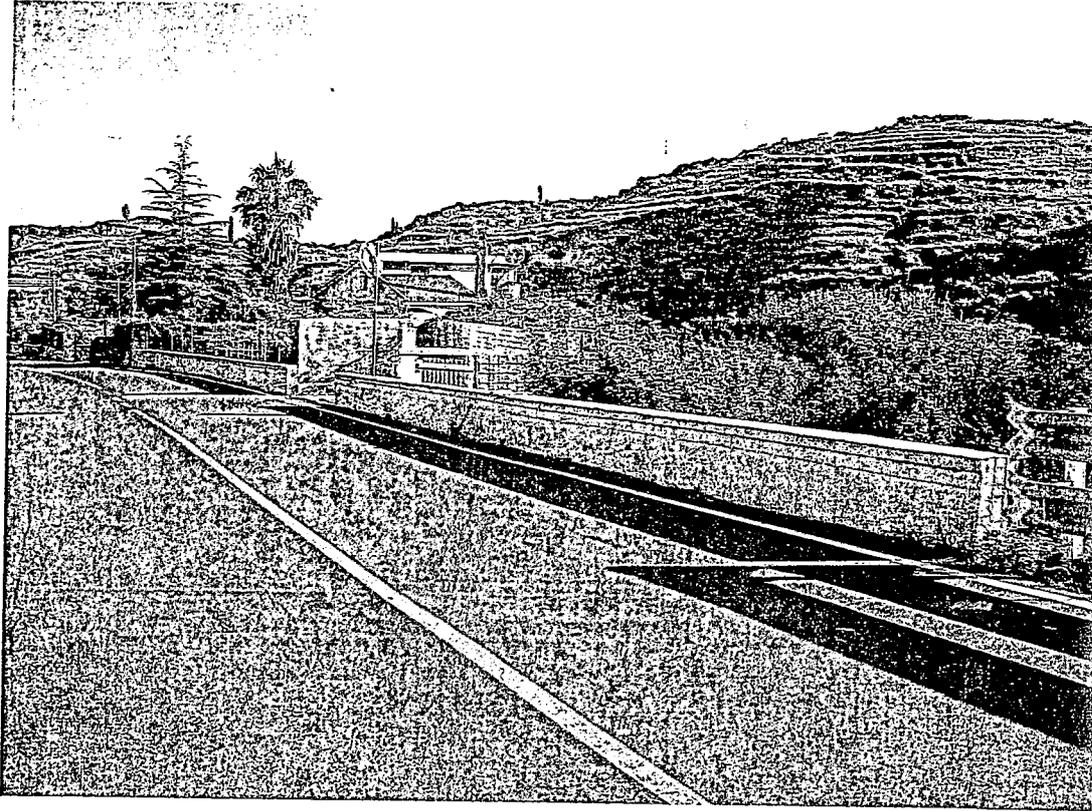


Foto n. 1 SP 52 km2+000 Muro in conglomerato cementizio.



Foto n. 2 SP 52 km2+000 Muro tip. h=2,00m, parapetto in conglomerato cementizio.



*Salvatore Celona*  
*Sh*  
*Las*  
*y*

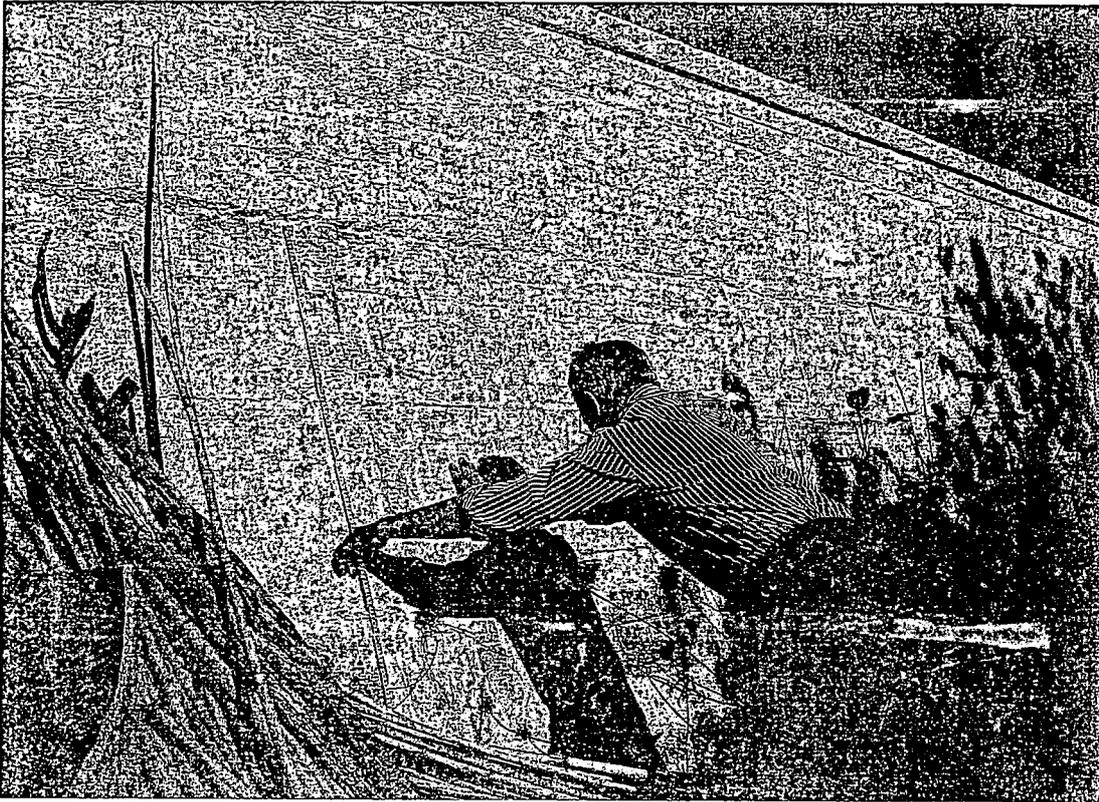



Foto n. 3 SP 52 km2+000 rilievo h=2,00 muro in conglomerato cementizio.



Foto n. 4 SP 52 km2+000 rilievo h=0,80 parapetto in conglomerato cementizio.



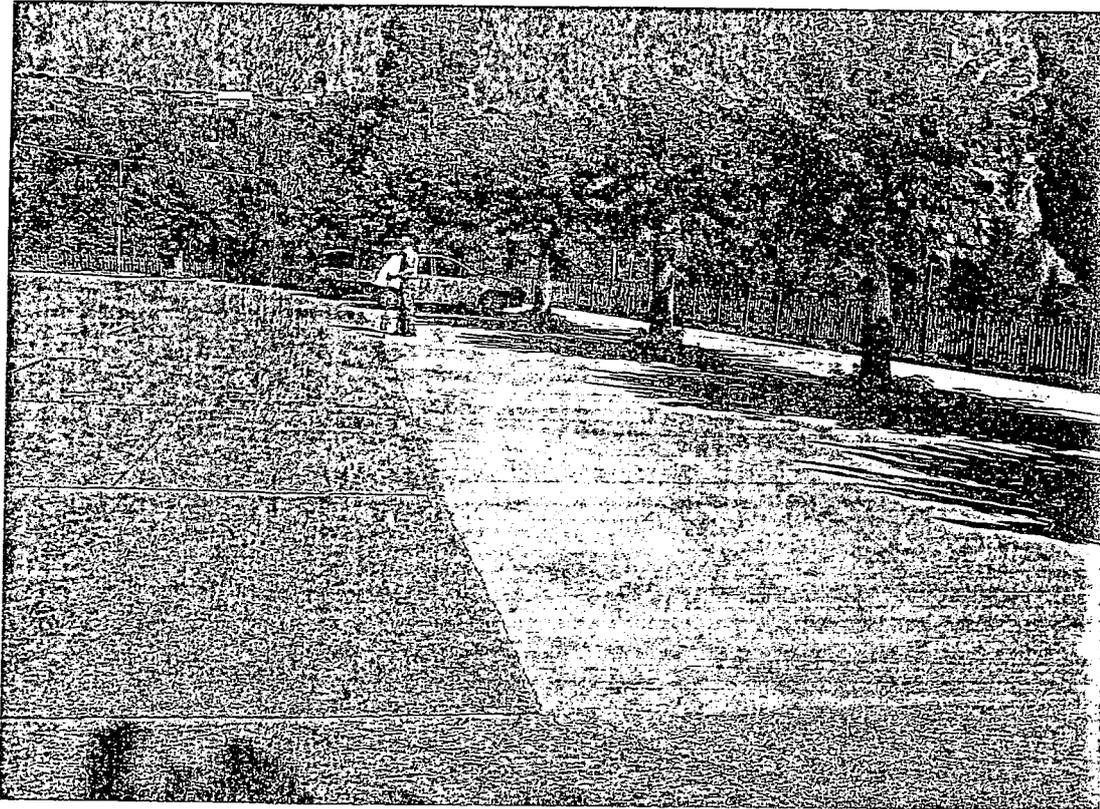


Foto n. 5 SP 52 Zona 5 Piazzale Santuario rilievo pavim. in conglom. cementizio.


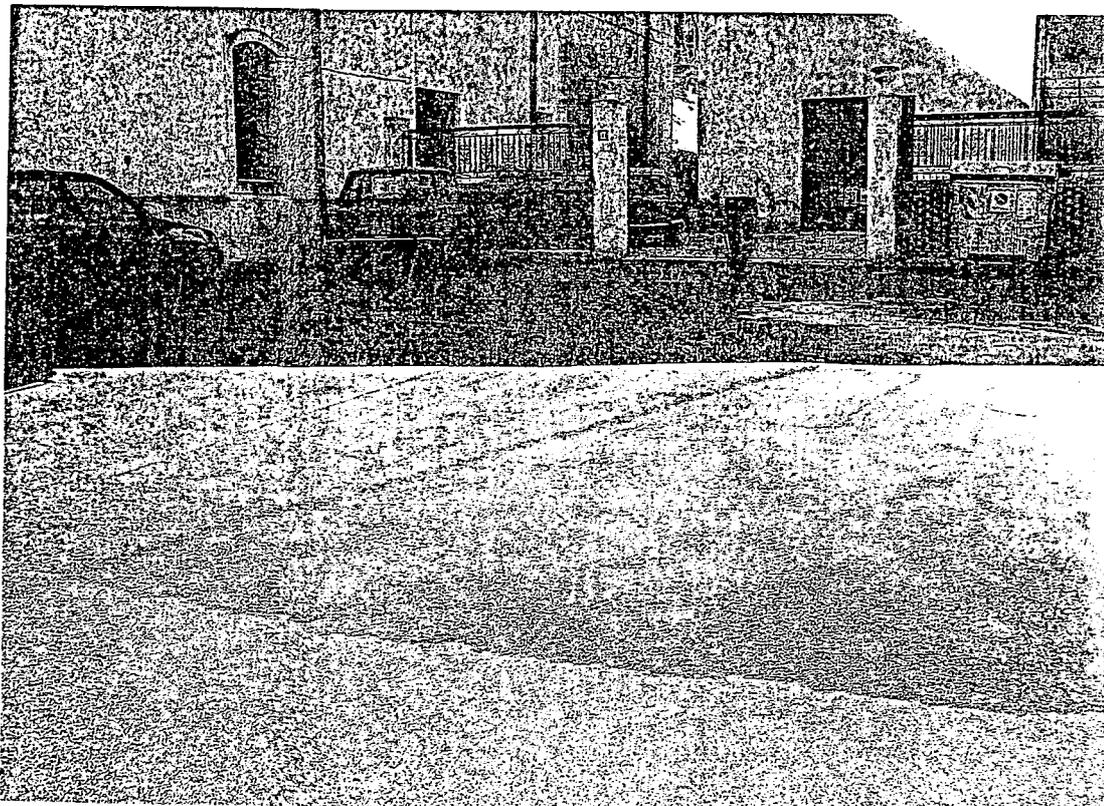


Foto n. 6 SP 52 Zona 5 Piazzale Santuario rilievo pavim. in conglom. bituminoso.

CELONA - MESSINA  
Ufficio di  
Messina  
Matric. 1965



# COMUNICAZIONI

## AVVISO VISITA DI COLLAUDO

ex art. 191 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554



All' **Assessorato Regionale LL.PP.**  
**Dipartimento Lavori Pubblici**  
**U.O.B. S6.02/Servizio 6°**  
**Infrastrutture Viarie e Trasporti**  
Via Leonardo Da Vinci, 161  
90145 PALERMO (PA)

All' **Assessorato Regionale LL.PP.**  
**Dipartimento Ispettorato Tecnico**  
Via Munter, 21  
90145 PALERMO (PA)

Alla **Provincia Regionale di Messina**  
ing. Giuseppe Celi (R.U.P.)  
Corso Cavour, 1  
98122 Messina (ME)

Alla **Provincia Regionale di Messina**  
ing. Giovanni Lentini (Direttore Lavori)  
Corso Cavour, 1  
98122 Messina (ME)

All'Impresa **Scafidi Antonino**  
Via Varisana Sopra, 34  
98050 Pianoconte Lipari (ME)


**Oggetto:** POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell’argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)”.

**Collaudo tecnico amministrativo.**

Il sottoscritto Collaudatore dei lavori in oggetto,  
Visto l'art. 191 comma 1° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n.554;  
comunica alle SS. LL. che il giorno **15** del mese di **luglio** c.a. alle **ore 9.00** si darà inizio, dinanzi il Palazzo Municipale di Villafranca Tirrena (ME), alle operazioni di collaudo con conseguente compilazione del processo verbale di visita. Pertanto, vorranno le SS.LL. convenire affinché intervengano alla visita di collaudo per riscontrare in contraddittorio gli atti amministrativo-contabili e la regolare esecuzione dei lavori appaltati.

Si avverte che qualora l'Appaltatore non si presenti si procederà con l'assistenza di due testimoni.

Villafranca Tirrena (ME) 16/06/2009



Il Collaudatore  
**Ing. Salvatore Celona**

Conferma Tx

Data : 17-GIU-2009 MER 13:54  
Nome :  
Tel. :

Telefono	:	0917072142
Pagine	:	1
Ora Inizio	:	06-17 13:53
Tempo Trascorso	:	00'26"
Modo	:	ECM
Risultati	:	Ok

## AVVISO VISITA DI COLLAUDO

ex art. 191 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

All' **Assessorato Regionale LL.PP.**  
**Dipartimento Lavori Pubblici**  
**U.O.B. S6.02/Servizio 6°**  
**Infrastrutture Viarie e Trasporti**  
Via Leonardo Da Vinci, 161  
90145 PALERMO (PA)

All' **Assessorato Regionale LL.PP.**  
**Dipartimento Ispettorato Tecnico**  
Via Munter, 21  
90145 PALERMO (PA)

Alla **Provincia Regionale di Messina**  
ing. Giuseppe Celi (R.U.P.)  
Corso Cavour, 1  
98122 Messina (ME)

Alla **Provincia Regionale di Messina**  
ing. Giovanni Lentini (Direttore Lavori)  
Corso Cavour, 1  
98122 Messina (ME)

All'Impresa **Scafidi Antonino**  
Via Varisana Sopra, 34  
98050 Pianoconte Lipari (ME)


**Oggetto:** POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell'argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)".

**Collaudo tecnico amministrativo.**

Il sottoscritto Collaudatore dei lavori in oggetto,  
Visto l'art. 191 comma 1° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n.554;  
comunica alle SS. LL. che il giorno **15** del mese di **luglio** c.a. alle **ore 9.00** si darà inizio, dinanzi il Palazzo Municipale di Villafranca Tirrena (ME), alle operazioni di collaudo con conseguente compilazione del processo verbale di visita. Pertanto, vorranno le SS.LL. convenire affinché intervengano alla visita di collaudo per riscontrare in contraddittorio gli atti amministrativo-contabili e la regolare esecuzione dei lavori appaltati.

Si avverte che qualora l'Appaltatore non si presenti si procederà con l'assistenza di due testimoni.

Villafranca Tirrena (ME) 16/06/2009



Il Collaudatore  
ing. Salvatore Celona

*[Handwritten signature]*

Conferma Tx

Data : 17-GIU-2009 MER 13:55  
Nome :  
Tel. :

Telefono : 0917072110  
Pagine : 1  
Ora Inizio : 06-17 13:55  
Tempo Trascorso : 00'26"  
Modo : ECM  
Risultati : Ok

Ing. Salvatore Celona  
Via Grioli n° 35  
98049 Villafranca Tirrena (ME)  
tel. 329/8138102  
C.F. CLN SVT 70S08 F158E

## AVVISO VISITA DI COLLAUDO

ex art. 191 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554



All' Assessorato Regionale LL.PP.  
Dipartimento Lavori Pubblici  
U.O.B. S6.02/Servizio 6°  
Infrastrutture Viarie e Trasporti  
Via Leonardo Da Vinci, 161  
90145 PALERMO (PA)

All' Assessorato Regionale LL.PP.  
Dipartimento Ispettorato Tecnico  
Via Munter, 21  
90145 PALERMO (PA)

Alla Provincia Regionale di Messina  
ing. Giuseppe Celi (R.U.P.)  
Corso Cavour, 1  
98122 Messina (ME)

Alla Provincia Regionale di Messina  
ing. Giovanni Lentini (Direttore Lavori)  
Corso Cavour, 1  
98122 Messina (ME)



All'Impresa Scafidi Antonino  
Via Varisana Sopra, 34  
98050 Pianoconte Lipari (ME)

**Oggetto:** POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell'argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)".  
**Collaudo tecnico amministrativo.**

Il sottoscritto Collaudatore dei lavori in oggetto,  
Visto l'art. 191 comma 1° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n.554;  
comunica alle SS. LL. che il giorno **15** del mese di **luglio** c.a. alle **ore 9.00** si darà inizio, dinanzi il Palazzo Municipale di Villafranca Tirrena (ME), alle operazioni di collaudo con conseguente compilazione del processo verbale di visita. Pertanto, vorranno le SS.LL. convenire affinché intervengano alla visita di collaudo per riscontrare in contraddittorio gli atti amministrativo-contabili e la regolare esecuzione dei lavori appaltati.

Si avverte che qualora l'Appaltatore non si presenti si procederà con l'assistenza di due testimoni.

Villafranca Tirrena (ME) 16/06/2009


Il Collaudatore  
Ing. Salvatore Celona  
  


Ing. Salvatore Celona  
Via Grioli n° 35  
98049 Villafranca Tirrena (ME)  
tel. 329/8138102  
C.F. CLN SVT 70S08 F158E

775-1000000000

## AVVISO VISITA DI COLLAUDO

ex art. 191 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554



All' Assessorato Regionale LL.PP.  
Dipartimento Lavori Pubblici  
U.O.B. S6.02/Servizio 6°  
Infrastrutture Viarie e Trasporti  
Via Leonardo Da Vinci, 161  
90145 PALERMO (PA)

All' Assessorato Regionale LL.PP.  
Dipartimento Ispettorato Tecnico  
Via Munter, 21  
90145 PALERMO (PA)

Alla Provincia Regionale di Messina  
ing. Giuseppe Celi (R.U.P.)  
Corso Cavour, 1  
98122 Messina (ME)

Alla Provincia Regionale di Messina  
ing. Giovanni Lentini (Direttore Lavori)  
Corso Cavour, 1  
98122 Messina (ME)

All'Impresa Scafidi Antonino  
Via Varisana Sopra, 34  
98050 Pianoconte Lipari (ME)

**Oggetto:** POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell’argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)”.

**Collaudo tecnico amministrativo.**

Il sottoscritto Collaudatore dei lavori in oggetto,  
Visto l'art. 191 comma 1° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n.554;  
comunica alle SS. LL. che il giorno 15 del mese di luglio c.a. alle ore 9.00 si darà inizio, dinanzi il Palazzo Municipale di Villafranca Tirrena (ME), alle operazioni di collaudo con conseguente compilazione del processo verbale di visita. Pertanto, vorranno le SS.LL. convenire affinché intervengano alla visita di collaudo per riscontrare in contraddittorio gli atti amministrativo-contabili e la regolare esecuzione dei lavori appaltati.

Si avverte che qualora l'Appaltatore non si presenti si procederà con l'assistenza di due testimoni.

Villafranca Tirrena (ME) 16/06/2009

Il Collaudatore  
*Ing. Salvatore Celona*

## AVVISO VISITA DI COLLAUDO

ex art. 191 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

All' **Assessorato Regionale LL.PP.**  
**Dipartimento Lavori Pubblici**  
**U.O.B. S6.02/Servizio 6°**  
**Infrastrutture Viarie e Trasporti**  
Via Leonardo Da Vinci, 161  
90145 PALERMO (PA)

All' **Assessorato Regionale LL.PP.**  
**Dipartimento Ispettorato Tecnico**  
Via Munter, 21  
90145 PALERMO (PA)

Alla **Provincia Regionale di Messina**  
ing. Giuseppe Celi (R.U.P.)  
Corso Cavour, 1  
98122 Messina (ME)

Alla **Provincia Regionale di Messina**  
ing. Giovanni Lentini (Direttore Lavori)  
Corso Cavour, 1  
98122 Messina (ME)

All'Impresa **Scafidi Antonino**  
Via Varisana Sopra, 34  
98050 Pianoconte Lipari (ME)


**Oggetto:** POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell’argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)”.

**Collaudo tecnico amministrativo.**

Il sottoscritto Collaudatore dei lavori in oggetto,  
Visto l'art. 191 comma 1° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n.554;  
comunica alle SS. LL. che il giorno 15 del mese di luglio c.a. alle ore 9.00 si darà inizio, dinanzi il Palazzo Municipale di Villafranca Tirrena (ME), alle operazioni di collaudo con conseguente compilazione del processo verbale di visita. Pertanto, vorranno le SS.LL. convenire affinché intervengano alla visita di collaudo per riscontrare in contraddittorio gli atti amministrativo-contabili e la regolare esecuzione dei lavori appaltati.

Si avverte che qualora l'Appaltatore non si presenti si procederà con l'assistenza di due testimoni.

Villafranca Tirrena (ME) 16/06/2009



Il Collaudatore  
ing. Salvatore Celona

Conferma Tx

Data : 17-GIU-2009 MER 13:57

Nome :

Tel. :

Telefono	:	0909813082
Pagine	:	1
Ora Inizio	:	06-17 13:57
Tempo Trascorso	:	00'35"
Modo	:	ECM
Risultati	:	Ok

Ing. Salvatore Celona  
Via Grioli n° 35  
98049 Villafranca Tirrena (ME)  
tel. 329/8138102  
C.F. CLN SVT 70S08 F158E

## AVVISO VISITA DI COLLAUDO

ex art. 191 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

- 
- All' **Assessorato Regionale LL.PP.**  
**Dipartimento Lavori Pubblici**  
**U.O.B. S6.02/Servizio 6°**  
**Infrastrutture Viarie e Trasporti**  
Via Leonardo Da Vinci, 161  
90145 PALERMO (PA)
- All' **Assessorato Regionale LL.PP.**  
**Dipartimento Ispettorato Tecnico**  
Via Munter, 21  
90145 PALERMO (PA)
- Alla **Provincia Regionale di Messina**  
ing. Giuseppe Celi (R.U.P.)  
Corso Cavour, 1  
98122 Messina (ME)


**Oggetto:** POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell’argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)”.

**Collaudo tecnico amministrativo.**

Il sottoscritto Collaudatore dei lavori in oggetto,  
Visto l’art. 191 comma 1° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n.554; a seguito visita di collaudo in data odierna,  
comunica alle SS. LL. che il giorno 22 del mese di luglio c.a. alle ore 9.00, dinanzi il Palazzo Municipale di Villafranca Tirrena (ME), si continueranno le operazioni di collaudo con conseguente compilazione del processo verbale di visita. Pertanto, vorranno le SS.LL. convenire affinché intervengano alla visita di collaudo per riscontrare in contraddittorio gli atti amministrativo-contabili e la regolare esecuzione dei lavori appaltati.

Si avverte che qualora l’Appaltatore non si presenti si procederà con l’assistenza di due testimoni.

Villafranca Tirrena (ME) 15/07/2009



Il Collaudatore  
ing. Salvatore Celona

Conferma Tx

Data : 16-LUG-2009 GIO 13:22

Nome :

Tel. :

Telefono	:	0917072142
Pagine	:	1
Ora Inizio	:	07-16 13:22
Tempo Trascorso	:	00'26"
Modo	:	ECM
Risultati	:	Ok

Ing. Salvatore Celona  
Via Grioli n° 35  
98049 Villafranca Tirrena (ME)  
tel. 329/8138102  
C.F. CLN SVT 70S08 F158E

## AVVISO VISITA DI COLLAUDO

ex art. 191 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

All' **Assessorato Regionale LL.PP.**  
**Dipartimento Lavori Pubblici**  
**U.O.B. S6.02/Servizio 6°**  
**Infrastrutture Viarie e Trasporti**  
Via Leonardo Da Vinci, 161  
90145 PALERMO (PA)

All' **Assessorato Regionale LL.PP.**  
**Dipartimento Ispettorato Tecnico**  
Via Munter, 21  
90145 PALERMO (PA)

Alla **Provincia Regionale di Messina**  
ing. Giuseppe Celi (R.U.P.)  
Corso Cavour, 1  
98122 Messina (ME)


**Oggetto:** POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell'argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)".

**Collaudo tecnico amministrativo.**

Il sottoscritto Collaudatore dei lavori in oggetto,  
Visto l'art. 191 comma 1° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n.554; a seguito visita di collaudo in data odierna,  
comunica alle SS. LL. che il giorno **22** del mese di **luglio** c.a. alle **ore 9.00**, dinanzi il Palazzo Municipale di Villafranca Tirrena (ME), si continueranno le operazioni di collaudo con conseguente compilazione del processo verbale di visita. Pertanto, vorranno le SS.LL. convenire affinché intervengano alla visita di collaudo per riscontrare in contraddittorio gli atti amministrativo-contabili e la regolare esecuzione dei lavori appaltati.

Si avverte che qualora l'Appaltatore non si presenti si procederà con l'assistenza di due testimoni.

Villafranca Tirrena (ME) 15/07/2009



Il Collaudatore  
ing. Salvatore Celona

Conferma Tx

Data : 15-LUG-2009 MER 14:40

Nome :


Tel. :

Telefono	:	0917072110
Pagine	:	1
Ora Inizio	:	07-15 14:39
Tempo Trascorso	:	00'27"
Modo	:	ECM
Risultati	:	Ok

Ing. Salvatore Celona  
Via Grioli n° 35  
98049 Villafranca Tirrena (ME)  
tel. 329/8138102  
C.F. CLN SVT 70S08 F158E

## AVVISO VISITA DI COLLAUDO

ex art. 191 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554



All' **Assessorato Regionale LL.PP.**  
**Dipartimento Lavori Pubblici**  
**U.O.B. S6.02/Servizio 6°**  
**Infrastrutture Viarie e Trasporti**  
Via Leonardo Da Vinci, 161  
90145 PALERMO (PA)

All' **Assessorato Regionale LL.PP.**  
**Dipartimento Ispettorato Tecnico**  
Via Munter, 21  
90145 PALERMO (PA)

→ Alla **Provincia Regionale di Messina**  
ing. Giuseppe Celi (R.U.P.)  
Corso Cavour, 1  
98122 Messina (ME)



**Oggetto:** POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell’argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)”.

**Collaudo tecnico amministrativo.**

Il sottoscritto Collaudatore dei lavori in oggetto,  
Visto l'art. 191 comma 1° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n.554; a seguito visita di collaudo in data odierna,  
comunica alle SS. LL. che il giorno **22** del mese di **luglio** c.a. alle **ore 9.00**, dinanzi il Palazzo Municipale di Villafranca Tirrena (ME), si continueranno le operazioni di collaudo con conseguente compilazione del processo verbale di visita. Pertanto, vorranno le SS.LL. convenire affinché intervengano alla visita di collaudo per riscontrare in contraddittorio gli atti amministrativo-contabili e la regolare esecuzione dei lavori appaltati.

Si avverte che qualora l'Appaltatore non si presenti si procederà con l'assistenza di due testimoni.

Villafranca Tirrena (ME) 15/07/2009

Il Collaudatore  
Ing. Salvatore Celona  
  


**STUDIO DI INGEGNERIA** ----

**Ing. Salvatore Celona**  
Via Grioli n. 35 - 98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) tel. 329/8138102 e-mail: celonaing.cd@libero.it

**PROVINCIA DI MESSINA**

**INTEGRAZIONE  
AL COLLAUDO TECNICO  
AMMINISTRATIVO**

POR SICILIA 2000 - 2006 Mis. 6.01 "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell'argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca - Calvaruso - Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)".

**Il Collaudatore: ing. Salvatore Celona**

## PROVINCIA DI MESSINA

**OGGETTO:** POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell’argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)”.

**IMPRESA:** “Scafidi Antonino” di Lipari (ME).

**CONTRATTO:** N° 13391 di rep. del 02/08/2007 registrato a Messina il 10/08/2007 al N. 2274 Serie I.


### INTEGRAZIONE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO

*Preso atto* della nota prot. n. 58883 del 18/06/2012 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 9° Infrastrutture Viarie e Sicurezza stradale, notificata il 22/06/2012, con la quale chiedeva un'integrazione al Certificato di Collaudo emesso in data 23/07/2009 da cui si evinca:

- il Certificato di Collaudo Statico delle opere in cemento armato previste e realizzate nei lavori di cui all'oggetto;
- la condivisione delle risultanze del Certificato di Collaudo Statico.

*Atteso* che, il sottoscritto collaudatore, con nota del 09/07/2012 chiedeva alla Provincia Regionale di Messina copia del Certificato di Collaudo Statico delle opere in cemento armato previste e realizzate nei lavori di sopramenzionati.

*Preso atto* della nota della Provincia Regionale di Messina prot.



n.0025552/12 del 17/07/2012 con la quale trasmetteva documentazione relativa al Certificato di Collaudo Statico delle opere in cemento armato;

**Viste** le risultanze del Certificato di Collaudo Statico, redatto dall'arch. Francesco Orsi in data Ottobre 2008 e depositato ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71 presso gli uffici della Provincia Regionale di Messina in data 21/11/2008, con la quale collauda, in merito alla stabilità e alla agibilità, tutte le opere realizzate in cemento armato;

Quanto sopra considerato, il sottoscritto collaudatore ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato n. 350 del 25/05/1895, dal Regolamento n.554/99 e successive modifiche ed integrazioni


### **CERTIFICA**

che i lavori POR SICILIA 2000 – 2006 Mis. 6.01 “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n.22 (la via dell’argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro su Calvaruso Divieto (da S.S. 113 a S.S.113)” eseguiti dall’impresa “Scafidi Antonino” di Lipari (ME), sono collaudabili, come in effetti ha collaudato in data 23/07/2009 e col presente atto

### **INTEGRA**

**il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo  
emesso in data 23/07/2009**


condividendo integralmente e totalmente le risultanze del Certificato di Collaudo Statico, redatto dall'arch. Francesco Orsi in data Ottobre



2008 e depositato ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71 presso gli uffici della Provincia Regionale di Messina in data 21/11/2008, delle opere in cemento armato previste ed eseguite nei lavori sopracitati (che si allega in copia).

Messina li 20/07/2012

**Il Collaudatore**



*Ing. Salvatore Celona*

**ALLEGATI**



REGIONE SICILIANA



COMUNITA' EUROPEA



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

VII DIPARTIMENTO - 1° UFFICIO DIRIGENZIALE  
2° UNITA' OPERATIVA - PROGETTAZIONE ZONA JONICA

**PROGETTO:** LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 22 (LA VIA DELL'ARGILLA ....) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO RELIGIOSO VILLAFRANCA - CALVARUSO - SERRO SU CALVARUSO DIVIETO (DA S.S. 113 A S.S. 113).

**Stralcio esecutivo per la messa in sicurezza**

**Codice Identificativo POR: 1999.IT.16.1PO.011/6.01/6.1.14/134**

## CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

(ART. 7 L. n° 1086/71)

**IMPRESA: SCAFIDI Antonino**

**CONTRATTO:** n. 13391 di Repertorio del 02/08/2007, registrato a Messina in data 10/08/2007 al n. 2274 Serie I.

**ULTIMAZIONE STRUTTURE:** Gennaio 2008


Il sottoscritto Arch. Francesco ORSI, nominato Collaudatore Statico dei lavori indicati in progetto, giusto O.D.S. n° 344/7°/1° del 21/02/2007, notificato dal Dirigente del VII Dipartimento e R.U.P. dei lavori in progetto, Ing. Giuseppe CELI, relaziona ai sensi dell'art. 7 della citata Legge n° 1086/71.

Si premette che:

- il progetto è stato redatto dall'Ing. Giovanni LENTINI (Progettista Capogruppo), dall'Ing. Anna CHIOFALO e dai Geom. Mario LUCCHESI e Filadelfio MAGNO, in data 04/11/2005, ed è stato validato con Verbale di Validazione n° 08 del 07/11/2005; lo stesso è stato approvato con Parere in linea tecnica n° 05 del 15/11/2005.

L'opera è stata cofinanziata dalla Comunità Europea tramite la Regione Siciliana con Decreto dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n° 1558/15° Bis del 20/11/2006 e dalla Provincia Regionale di Messina con stanziamento del 5% dell'importo complessivo di cui alla delibera della Giunta Provinciale n° 305 del 22/11/2005; il tutto per l'importo complessivo di € 800.000,00; a seguito di asta pubblica tenutasi in data 17 Maggio e 10 Luglio 2007, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa SCAFIDI ANTONINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Ing. Giovanni LENTINI



con sede in Lipari, Via Varisana Sopra, Pianoconte, n° 34, (Me) ed è stato stipulato il contratto in data 02/08/2007, avente Rep. n. 13391, registrato a Messina in data 10/08/2007 al n. 2274 Serie I; i lavori hanno avuto inizio il 10/09/2007;

- il progetto delle strutture ed i relativi calcoli sono stati redatti dal progettista capogruppo e sono stati presentati presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Messina, ai sensi dell'art. 17 della Legge n° 64/74 e depositati ai sensi dell'art. 4 della legge 1086/71 presso l'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Messina nel Maggio 2007 e restituiti muniti dell'autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 18 della Legge n° 64/74 dello stesso Genio Civile di Messina.

#### MATERIALI PREVISTI PER LE STRUTTURE

Il progetto delle strutture portanti in conglomerato cementizio armato prevedeva l'impiego dei seguenti materiali strutturali:

conglomerato cementizio per le diverse tipologie strutturali: classe di resistenza Rck 300 kg/cmq;

armature metalliche in barre tonde ad aderenza migliorata per le diverse strutture: FeB 38k.

#### RISULTATO DELLA VISITA DI COLLAUDO

Tenuto conto che:

- il Direttore dei Lavori ha attestato che i lavori hanno avuto inizio e si sono conclusi nel Gennaio 2008;

- il Direttore dei lavori ha redatto la relazione a strutture ultimate, così come disposto dall'art. 6 della Legge n° 1086/71, in data Giugno 2008 e depositata il 17 Luglio 2008 presso gli Uffici del VII Dipartimento 1° U/D, nella quale è indicato che le strutture ed i materiali impiegati sono sostanzialmente conformi a quelli previsti nel progetto;

- il Direttore dei Lavori ha indicato nella propria relazione a strutture ultimate che non si evidenziano variazioni se non quelle riscontrabili in funzione delle esigenze costruttive del sito ove sono state realizzate le opere;

- le variazioni indicate sono state oggetto di apposita esame ad opera del D.L. il quale ha attestato che le predette modifiche non comportano sostanziali variazioni alle condizioni di verifica già depositate con i calcoli originari.

Considerato quanto sopra esposto lo scrivente, il giorno 16 del mese di Settembre




nell'anno 2008, si è recato sui luoghi dove sono stati eseguiti i lavori ed alla presenza del L. Ing. Giovanni LENTINI, ha proceduto con un controllo delle opere realizzate.

Quindi sulla scorta degli elaborati progettuali, dei calcoli statici autorizzati e della relazione a strutture ultimate, ha eseguito un controllo a campione dei vari elementi geometrici ed un esame visivo delle strutture portanti, al fine di rilevare eventuali difetti o imperfezioni. I vari controlli eseguiti hanno dato esito positivo, in particolare le dimensioni delle sezioni resistenti degli elementi strutturali campionati, sono quelle di cui al progetto; nei vari elementi costituenti la struttura non si sono riscontrate lesioni o segni di sofferenza strutturale.

Sono state rilevate le variazioni intervenute in corso d'opera e già indicate nella relazione a strutture ultimate.

Per quanto sopra riscontrato, dall'esame dei calcoli statici e della relazione a strutture ultimate, dalla quale si evince la qualità dei materiali impiegati per la realizzazione delle strutture, risulta che:

- le strutture, per quanto rilevato, si presentano in normali condizioni di stabilità;
- i calcoli di stabilità delle strutture portanti sono stati redatti nel rispetto delle norme sismiche in vigore e dei relativi decreti di attuazione;
- le sezioni resistenti degli elementi strutturali campionati sono corrispondenti alle previsioni del progetto;
- le prove eseguite dal direttore dei lavori, sui materiali adottati, hanno fornito esito positivo e sono quindi confermate le caratteristiche di resistenza assunte a base dei calcoli statici;
- le opere strutturali relative ai LAVORI DI AMMODERNAMENTO, DEGUAAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 22 A VIA DELL'ARGILLA ...) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO RELIGIOSO VILAFRANCA - CALVARUSO - SERRO SU CALVARUSO DIVIETO (DA S.S. 113 A S.S. 113), sono state realizzate secondo il progetto autorizzato a meno delle variazioni di cui si è detto;
- nelle strutture portanti e nelle opere complementari non sono state rilevate lesioni tali da destare timori per la stabilità delle strutture stesse.



Per tutto quanto sopra riferito, il sottoscritto dichiara collaudabili le opere  
strutturali di cui in oggetto ed in effetti le

**COLLAUDA**

in il presente certificato con esito favorevole per tutto ciò che è relativo alla stabilità ed  
alla agibilità cui l'opera stessa è destinata.

Messina li Ottobre 2008



Il Collaudatore:

Arch. Francesco ORSI

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
VII DIPARTIMENTO 1 U/D  
2° U/O - PROGETTAZIONE ZONA JONICA  
Collaudo statico depositato ai sensi dell'art. 7  
della Legge 1086/71 presso gli uffici in data

**21 NOV. 2008**

Il Dirigente: Ing. Giuseppe CELI





REGIONE SICILIANA



COMUNITA' EUROPEA



POR SICILIA

37



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

VII DIPARTIMENTO - 1° UFFICIO DIRIGENZIALE

2° UNITA' OPERATIVA - PROGETTAZIONE ZONA JONICA

Determinazione N° 21/604/2009

del 21/12/09

**OGGETTO:** LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 22 (LA VIA DELL'ARGILLA ....) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO RELIGIOSO VILLAFRANCA - CALVARUSO - SERRO SU CALVARUSO DIVIETO (DA S.S. 113 A S.S. 113).

**STRALCIO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA**

**C. I. POR : 1999.IT.16.1PO.011/6.01/6.1.14/131**

## Approvazione certificato di Collaudo.

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

- che in data 4 novembre 2005, l'Ufficio Tecnico di questa PROVINCIA REGIONALE di MESSINA, ha predisposto il progetto dei 'LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 22 (LA VIA DELL'ARGILLA ....) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO RELIGIOSO VILLAFRANCA - CALVARUSO - SERRO SU CALVARUSO DIVIETO (DA S.S. 113 A S.S. 113)' - *Stralcio Esecutivo per la messa in sicurezza;*
- che il progetto è stato validato e successivamente, con parere n° 04/7° 1°, in data 15 novembre 2005, approvato dal Dirigente del 1° Ufficio Dirigenziale del 7° Dipartimento di questa Provincia Regionale di Messina, in qualità di RUP, per un importo complessivo di € 800.000,00;
- che con Delibera di Giunta n° 304 del 22.11.2005 è stata approvato lo stesso progetto in linea amministrativa, ai fini della partecipazione al bando per la selezione degli interventi di "Completamento, adeguamento ed ammodernamento della rete stradale" a valere sulla Misura 6.01 del POR Sicilia 2000/2006;
- che con ulteriore Delibera di Giunta n° 305 del 22.11.2005, è stata data la copertura finanziaria relativa alla quota parte del cofinanziamento (5%) di competenza della Provincia Regionale di Messina;
- che con Decreto n. 1558/15° bis del 20 novembre 2006, l'Assessorato LL. PP. Della Regione Siciliana ha impegnato la somma di € 800.000,00 per la realizzazione dell'opera in oggetto;

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

*[Handwritten signature]*

- che a seguito di asta pubblica, esperita in data 17 Maggio 2007 e 10 Luglio 2007, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa SCAFIDI ANTONINO con sede in Lipari, Via Varisana Sopra, n° 34, Pianoconte, (Me), per l'importo di € 565.526,05, al netto del ribasso d'asta del 7,319 %;
- che il relativo contratto è stato stipulato in data 02/08/2007, Rep. n. 13391, e registrato a Messina in data 10/08/2007 al n. 2274 Serie I;
- che in data 14 Luglio 2008, con Prot. n° 1332 7° /1° la D. L., in ottemperanza al disposto degli articoli 134 comma 10, e 136 del DPR 554/99, ha predisposto la relazione d'accompagnamento alla Perizia di Variante che è stata autorizzata dal RUP in pari data, con parere espresso in calce a detto elaborato;
- che in data 01 Settembre 2008 la D. L., nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni del 3° comma dell'art. 25 della L. 109/94 coordinata con la Normativa Regionale, ha perfezionato la P. V., prevedendo rispetto al progetto principale un discostamento di quantità relativo alle lavorazioni già presenti nel progetto originario e la realizzazione di lavorazioni ulteriori, senza la necessità di ulteriore finanziamento e senza intaccare le economie per ribasso d'asta contrattuale;
- che con il parere n° 08 del 01/09/2008 con il quale il Dirigente e R.U.P. del 7° Dip. 1° U/D ha approvato il linea tecnica la perizia di variante di assestamento somme finale;
- che in data 01/09/2008 con Determina Dirigenziale n° 31 il Dirigente e R.U.P. del 7° Dip. 1° U/D ha approvato la perizia di assestamento somme finale relativa ai lavori in oggetto;
- che in data 22/09/2008 è stato firmato l'atto di sottomissione comprensivo del concordamento nuovi prezzi;
- che in data 21/10/2008 lo stesso atto di sottomissione è stato repertoriato presso l'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina al n° 217;
- che in data 24/07/2008 si è redatto il certificato di ultimazione dei lavori, attestando l'avvenuta ultimazione in pari data;
- che in data 17/09/2008 è stata redatto lo stato finale dei lavori da parte della D. L.;

#### **RILEVATO:**

- che con comunicazione Prot. n° 36497 del 29/05/2009, l'Assessorato Regionale LL.PP. ha nominato l'Ing. Salvatore CELONA quale Collaudatore dei lavori di cui alla presente;

#### **VISTO**

- la nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 26783 del 27/07/2009, con la quale il collaudatore ha trasmesso all'Ente Appaltante il certificato di collaudo di cui alla presente;
- che dalle risultanze del Certificato di Collaudo è stato rilevato un credito residuo, a favore dell'impresa appaltatrice pari ad €. 1.894,43 (Euro Milleottocentonovantaquattro/43 centesimi) oltre I.V.A. del 20 %, quale importo ottenuto dalla deduzione degli importi già corrisposti a seguito dell'emissione degli Stati d'avanzamento dei lavori previsti dal capitolato Speciale d'Appalto.

**VISTE** le Leggi Regionali n° 7 del 2 agosto 2002 e n° 7 del 19 maggio 2003, recanti Norme per l'esecuzione dei LL. PP. in Sicilia, e che hanno recepito la Legge Quadro in materia di LL. PP. n° 109/94;

LETTO il 10° comma dell'art. 19 del testo della L. 109/94, coordinato con le LL. RR. 7/2002 e 7/2003;

VISTI:


- l'art. 51 della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
- l'art. 3 del D. Lg. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in merito agli adempimenti di competenza dei dirigenti;

## DETERMINA

**PRENDERE ATTO ED APPROVARE** lo stato finale ed il certificato di COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO relativo ai "LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 22 (LA VIA DELL'ARGILLA ....) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO RELIGIOSO VILAFRANCA - CALVARUSO - SERRO SU CALVARUSO DIVIETO (DA S.S. 113 A S.S. 113)";

**RENDERE ESECUTIVA** la presente determinazione, previa apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, a cura della Ragioneria Generale;

IL DIRIGENTE  
(Ingegnere Giuseppe CELI)





Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità  
e dei Trasporti  
Servizio 9° Infrastrutture Varie – Sicurezza stradale

26/13/268

400

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
30 OTT 2012
1° DIPARTIMENTO - U.D.

Palermo Prot. n. **42080** del **19 OTT. 2012**  
Allegati n.

**OGGETTO: Provincia Regionale di Messina** – POR Sicilia 2000/2006 – Misura 6.01 – Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione del PIT n. 22 (la via dell'argilla) e dei poli culturali sul circuito turistico religioso Villafranca – Calvaruso – Serro – su Calvaruso Divieto (da SS. 113 a SS. 113).  
**C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/131.**  
Trasmissione atti di contabilità finale e Certificato di collaudo.

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
30/10/2012  
Protocollo n°0035999/12

e p.c.

Alla Provincia Regionale di Messina  
7° DIPARTIMENTO – 1° U.D.  
R. U. P. Ing. Giuseppe Celi  
98100 MESSINA

All'Area 3  
Programmazione e Monitoraggio  
**SEDE**

Al Servizio 21  
**SEDE**

Con nota n. 82631 del 18/09/2012, il Servizio 21 di questo Dipartimento, previo l'esame nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, ha restituito gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Collaudo dei lavori in oggetto indicati senza nulla da rilevare in linea tecnica.

Quanto sopra, si restituiscono gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo affinché codesta Provincia, previo l'esame di propria competenza, ed ove in conseguenza null'altro abbia autonomamente da osservare e rilevare, provveda ai consequenziali adempimenti per la definizione della pratica, in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Si resta in attesa della trasmissione dei relativi atti, nonché del successivo inoltro della certificazione di cui all'art. 80, comma 2, della L.R. 26/03/2002 n. 2, in cui il funzionario delegato attesti l'entità dei pagamenti effettuati sugli ordini di accreditamento disposti a suo favore nel corso dell'anno e dichiarati, altresì, di essere in possesso della relativa documentazione.

Si ricorda che codesta Provincia dovrà trasmettere l'atto amministrativo con il quale vengono approvati gli atti di contabilità finale ed il quadro economico e tecnico definitivo.

**IL FUNZIONARIO DIRETTIVO**  
(Rag Annibale Pisciotta)

**IL CAPO SERVIZIO**  
(Rag. Vincenzo Falletta)



CONFERMA ALL'ORIGINALI  
GIUGIACANTINI

Servizio 9° – Dirigente: Vincenzo Falletta  
Via Leonardo Da Vinci, 161 – 90145 Palermo - Tel. 0917072142 - Fax 0917072142 - e-mail: vincenzofalletta@regione.sicilia.it

Orario e giorni ricevimento: lun, mer, e ven, 9.00 – 12.00, mer, 15.30 - 18.00  
Responsabile procedimento: Annibale Pisciotta  
Stanza 13 Piano 5 a v. - Tel. 0917072255 - Fax 0917072142 - e-mail: annibale.pisciotta@regione.sicilia.it

*1 busta  
e 1 foglio  
di protocollo*

*Falletta*

# POR SICILIA 2000 - 2006

## Rendiconto dettagliato delle spese sostenute con i fondi regionali

Allegato I

Misura 6.01/C.I.:1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/131

Ente: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA


Titolo del progetto: Lavori ammodernamento, adeguamento messa in sicurezza miglioramento percorribilità valorizzazione PIT 22 circuito Villafranca-Calvaruso-Serro

Macrovoce di spesa, come da quadro tecnico economico	Giustificativo di spesa					Pagamenti					
	Tipo Documento	Emesso da	N. Documento	Data Documento	Causale	Capitolo regionale	Decreto di impegno	Numero e anno OA	N. Ordinativo di pagamento	Data di pagamento	Importo Pagato
LAVORI	FATTURA	SCAFIDI Antonino	18/B 19/B 20/B	05/12/2007	1° certificato di acconto, oneri smaltimento e oneri frazionamento	673903	1374/15 bis/2007	18/2007	1	13/12/2007	210.522,53
LAVORI	FATTURA	SCAFIDI Antonino	2	07/03/2008	2° certificato di acconto (quota parte)	673903	1374/15 bis/2007	18/2007	1	19/03/2008	167.419,69
LAVORI	FATTURA	SCAFIDI Antonino	2	07/03/2008	2° certificato di acconto (saldo)	673903	1374/15 bis/2007	42/2008	1	06/06/2008	148.229,43
LAVORI	FATTURA	SCAFIDI Antonino	14	24/07/2008	3° certificato di acconto (quota parte)	673903	1374/15 bis/2007	42/2008	2	25/07/2008	121.770,57
LAVORI	FATTURA	SCAFIDI Antonino	14	24/07/2008	3° certificato di acconto (saldo)	673903	1374/15 bis/2007	99/2008	1	06/11/2008	36.884,60
LAVORI	FATTURA	SCAFIDI Antonino	15	10/09/2009	stato finale	673903	1374/15 bis/2007	43/2010	1	25/05/2010	2.273,32
LAVORI	FATTURA	SCAFIDI Antonino	6	28/07/2009	collaudo tecnico amm.vo	673903	1374/15 bis/2007	43/2010	2	25/05/2010	2.114,75
TOTALE											689.214,89

Il Funzionario delegato ai pagamenti, attesta ai sensi dell'art. 80, Comma 2, della L.R. n. 2 del 26.03.2002, che i pagamenti relativi all'intervento di cui al presente, rispetto agli Ordini di Accreditamento di € 707.591,74 ammontano ad € 689.214,89, per i quali l'Ufficio è in possesso della relativa documentazione. La differenza di € 18.376,85 O.A. 43/10 è stata ritirata al 31.12.2010 e costituisce economia di bilancio regionale. Allegato Mod. 50TES

Data

26 NOV. 2012



Il Presidente  
On.le Avv. Giovanni Cesare Ricevuto

COPIA CONFERME ALL'ORIGINALI  
 Ing. Giuglielmo LENTINI

CONTO ORDINARIO  
 ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 NOTA DESCRITTIVA DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO  
 EMESSI DAL SUDETTO ASSESSORATO E RIMASTI INESTINTI A CHIUSURA DEL 31 DICEMBRE 2010  
 PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE DI CASSA REGIONALE DI MESSINA

01 01015900 LEG. RASPER PROVINCIA REGIONALE-MESSINA									
02 060000001670745-									
03 NUM	DATI REGIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONI	VARIAZIONI	SOMMA PAGATA	RESTA	VISTO
04 ORDINE	ICAPIT.	NUMERO	IC ORDINE DI ACCREDITAMENTO	DELL'ORDINE DI ACCREDITAMENTO	DISPOSTE DALLA REGIONE	DISPOSTE DAL FUNZIONARIO DELEGATO			PER CONCORDANZA
05 1	672026	4/2010	C PROVINCIA REGIONALE DI MESSI	16.707,45	16.707,45-				
05 2	672117	34/2010	C PREMIALITA' ASSEGNATA ALLA PR	69.274,38	69.274,38-				
05 3	673903	43/2010	C PROVINCIA REGIONALE DI MESSI	22.764,92	18.376,85-		4.388,07		
05 4	673903	40/2010	C PROVINCIA REGIONALE DI MESSI	5.573,95	1.270,91-		4.303,94		
05 TOTALI				114.320,70			8.692,01		



IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*



E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 Ing. Giovanni LENTINI

*[Handwritten signature]*

# POR SICILIA 2000 - 2006

Rendiconto dettagliato delle spese sostenute con i fondi provinciali

Allegato 1

Misura 6.01/C.I.:1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/131

Ente: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Titolo del progetto: Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità sul circuito Villafranca - Calvaruso - Serro

Macrovoce di spesa, come da quadro tecnico economico	Giustificativo di spesa					Pagamenti					
	Tipo Documento	Emesso da	N. Documento	Data Documento	Causale	Capitolo prov.le	Delib. Impegno	Numero impegno	N. mandato di pagam.	Data di pagamento	Importo Pagato
SOMME A DISPOSIZIONE	Disposiz.	R.U.P.	12	21/02/2007	Contrib. Autorità Vigilanza	6471	305/G	2006/4645	2303	28/02/2007	480,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Disposiz.	R.U.P.	11	21/02/2007	Public. Avviso G.U.R.S.	6471	305/G	2008/4645	2314	28/02/2007	250,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Disposiz.	R.U.P.	51	06/08/2007	Publicaz. esito G.U.R.S.	6471	305/G	2006/4645	8452	22/08/2007	180,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Publirkompass	S02395	28/03/2007	Pubblicazione avviso	6471	305/G	2006/4645	9180	20/09/2007	2.496,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Publirkompass	S02425	28/03/2007	Pubblicazione avviso	6471	305/G	2008/4645	9181	20/09/2007	1.776,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Publirkompass	S02413	28/03/2007	Pubblicazione avviso	6471	305/G	2006/4645	9182	20/09/2007	3.024,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Cantonove	305	30/03/2007	Pubblicazione avviso	6471	305/G	2006/4645	9713	11/10/2007	935,82
SOMME A DISPOSIZIONE		AON Assicurazioni			Premi assicurativi	6471	305/G	2006/4645	9901	17/10/2007	1.826,40
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Publirkompass	S00321	23/08/2007	Pubblicazione esito	6471	305/G	2006/4645	10885	19/11/2007	2.352,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Publirkompass	S06023	29/08/2007	Pubblicazione esito	6471	305/G	2006/4645	10886	19/11/2007	1.332,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Publirkompass	S06310	23/08/2007	Publicaz. esito	6471	305/G	2006/4645	10887	19/11/2007	1.872,00

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 ING. GIUSEPPE LENTINI



SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Centonove	716	10/08/2007	Pubblicaz. esito	6471	305/G	2006/4645	12618	10/12/2007	935,82 <i>legato 1</i>
SOMME A DISPOSIZIONE		AON Assicurazioni			Premi assicurativi	6471	305/G	2008/4645	7707	04/08/2008	1.870,00
SOMME A DISPOSIZIONE		scheda			Compenso Incentivante	6471	305/G	2008/4645	8755	16/09/2008	6.620,79
SOMME A DISPOSIZIONE		scheda			Compenso Incentivante	6471	305/G	2006/4645	11588	27/11/2008	4.606,76
<b>Totale</b>											<b>30.657,59</b>

FA

Data 26 NOV. 2012



IL DIRIGENTE  
 Nome e Cognome dell'autorità competente  
 Dott. Antonio Calabro
