



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 958 del 28/07/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 827 del 01/08/2022

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: MASTERPLAN – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - Delibera CIPE 26/2016: "Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell'Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000" - CIG: 8736821CC2 – CUP: B17H17000710001 - APPROVAZIONE Q.T.E. RIMODULATO ED IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO IMPORTO COMPENSAZIONE AUMENTO COSTI MATERIALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Delegato Funzioni Dirigenziali

PREMESSO:

- **CHE** con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** con determina dirigenziale n° 908 del 19.09.2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Rosario BONANNO;
- **CHE** con determinazione n. 309 del 12.04.2021 è stata stabilita la statuizione della modalità di gara, approvato lo schema della lettera d'invito ed il disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determinazione dirigenziale n° 844 del 02.08.2021, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa LINERA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Traversa Finocchiaro, n° 7, 95010 – SANTA VENERINA (CT), che ha offerto un ribasso del 37,393% con un importo contrattuale di € 634.288,55 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

QTE GARA		
A) LAVORI		
1)	a base d'asta	972.672,56 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	25.327,44 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 37,393% sulla voce A1)	363.711,45 -
5)	Importo netto dei lavori	634.288,55
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 139.543,48
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 19.960,00
03)	Indagini geognostiche	€ 13.880,00
04)	Oneri di conferimento in discarica	€ 21.000,00
05)	Per espropriazioni e frazionamenti	€ 23.000,00
06)	Imprevisti e arrotondamento	€ 4.000,00
07)	Per contributo A.V.C.P.	€ 600,00
Sommano a disposizione		€ 221.983,48
Importo netto complessivo		€ 856.272,03
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
09)	detrazione del ribasso d'asta del 37,393 % sull'importo a base di gara	€ 363.711,45
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 80.016,52
		€ 443.727,97
Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 1.300.000,00

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 19.11.2021 al n° di repertorio 14585 per l'importo di € 634.288,55 di cui € 25.327,44 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 30.11.2021 al n° 19674 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 04.10.2021;

CONSIDERATO:

- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° semestre dell'anno 2021, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;
- **CHE** in data 29 Maggio 2022 con nota prot. 21700, l'impresa LINERA COSTRUZIONI S.r.l. ha inoltrato istanze per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi di alcuni materiali impiegati per l'appalto;
- **CHE** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;

RILEVATO che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. ultimo approvato, coincidente con quello post – gara;

VISTO il Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI;

VISTI:

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- la Legge 106/2021 art. 1 septies
- la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399
- il Decreto Legge 01/03/2022 n° 17, art. 25
- Il Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022, art. 26
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;


VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente

DETERMINA

PRENDERE ATTO, per le ragioni sopra indicate del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI, relativamente al primo S.A.L.;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, ex art. 1-septies L. 106/2021 per la compensazione dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, per un importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 634.288,55 per lavori al netto, comprensivi di € 25.327,44 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 254.487,76 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed € 411.223,69 per economie, secondo il seguente schema:

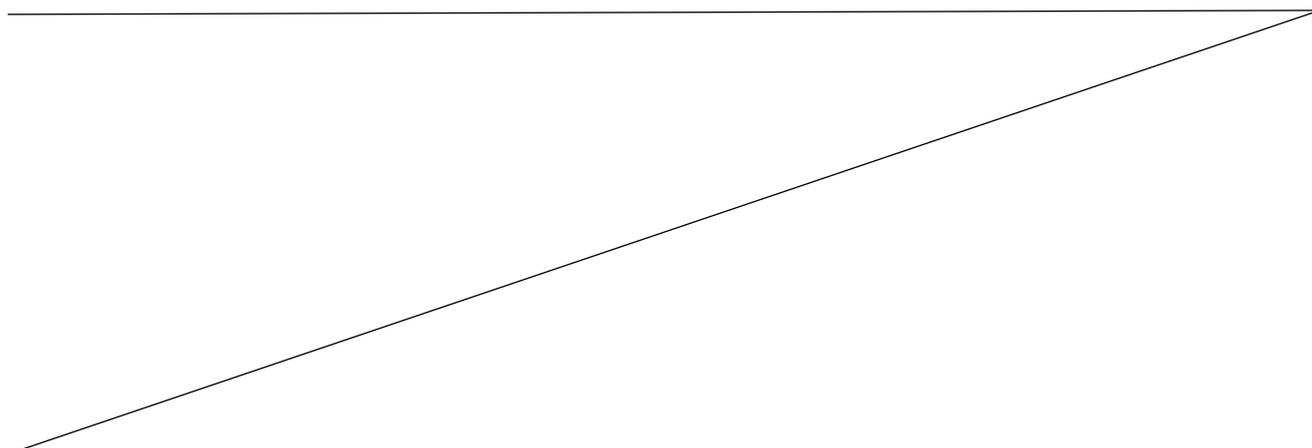

QTE RIMODULATO		
A) LAVORI		
1)	a base d'asta	972.672,56 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	25.327,44 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 37,393% sulla voce A1)	363.711,45 -
5)	Importo netto dei lavori	634.288,55
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 139.543,48
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 19.960,00
03)	Indagini geognostiche	€ 13.880,00
04)	Oneri di conferimento in discarica	€ 21.000,00
05)	Per espropriazioni e frazionamenti	€ 23.000,00
06)	Per riconoscimento caro materiali	€ 36.504,28
08)	Per contributo A.V.C.P.	€ 600,00
Sommano a disposizione		€ 254.487,76
Importo netto complessivo		€ 888.776,31
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
09)	detrazione del ribasso d'asta del 37,393 % sull'importo a base di gara	€ 331.207,17
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 80.016,52
		€ 411.223,69
Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 1.300.000,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8736821CC2	CUP	B17H17000710001		
Creditore	LINERA COSTRUZIONI S.R.L.						
Causale	Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell'Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 32.504,28				

IMPUTARE la spesa di € 32.504,28 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		€ 32.504,28

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 32.504,28

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

LIQUIDARE la complessiva somma di € 36.504,28 di cui € 4.000,00 da prelevare dall'impegno precedente di cui alla D.D. 844 del 02.08.2021, ed € 32.504,28 dall'impegno di cui alla presente, per compensazione aumento prezzi materiali all'Impresa "LINERA COPSTRUZIONI S.r.l." a compensazione dei maggiori prezzi di alcuni materiali di costruzione in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11/11/2021, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI, relativa al primo S.A.L.;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Il Responsabile del Servizio

Ing. Giovanni LENTINI

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo 165/2001

(D.D. n° 463 del 28.04.2022)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n° 26 CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Giovanni LENTINI

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo 165/2001

(D.D. n° 463 del 28.04.2022)
