



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 3545 del 25/08/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3284 del 28/08/2023

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA – VIABILITA' SECONDARIA
- “Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale Gaggi-Cretazzi-Serro Antillo-Candelora-Castelmola, nel comune di Gaggi” - CUP: B37H17000540001
CIG: 8440562C19 – COD. CARONTE: SI_1_21603 - APPROVAZIONE Q.T.E.
RIMODULATO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CARO MATERIALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con la Delibera, di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n° 334 del 31.03.2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI;
- **CHE** il progetto è stato redatto, verificato, validato ed approvato in linea tecnica dal RUP Ing. Giovanni Lentini, con parere n° 06 del 26/02/2019 e successivamente, per l'adeguamento alle disposizioni in materia di contrasto al rischio epidemiologico relativo al Covid-19, con parere n° 25 del 01/07/2020; approvato in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 116 del 27/02/2019 e successivamente, a seguito dell'introduzione dei costi di sicurezza per il controllo del rischio epidemiologico da Covid 19, con Determinazione Dirigenziale n° 757 del 11/09/2020;
- **CHE** il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente, ossia nel piano triennale delle opere pubbliche;
- **CHE** la Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, con D.D.G. n° 1576 del 27.06.2019, ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo

complessivo pari ad €. 839.820,05; la somma di €. 255.000,00 a valere sul capitolo di bilancio n° 672468, esercizio 2019 e la somma di €. 584.820,05 a valere sul capitolo di bilancio 672468, esercizio 2020;

- **CHE** con D.D. n° 1198 del 09/12/2020 è stato approvato il verbale delle operazioni di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma5 del D. Leg. vo n° 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato con l'art. 33 comma 1 del medesimo decreto, all'impresa P.I.C.A. S.r.l. con sede legale in Oliveri (ME), C.da Roccanave, S.S. 113 – P.I. 01623390836 con il ribasso del 31,145% per l'affidamento dei lavori in progetto, per un importo contrattuale di €. 469.221,28 (Euro Quattrocentosessantanovemiladuecentoventuno/28) di cui € 16.735,99 per oneri di sicurezza ed oneri Covid-19, secondo il seguente Q.T.E.:

QTE POST GARA			
A) LAVORI			
1)	a base d'asta	657.156,77	+
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	16.735,99	+
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00	+
4)	deduzione del ribasso d'asta del 31,145% sulla voce A1)	204.671,48	-
5)	Importo netto dei lavori	469.221,28	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 103.228,68	
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 10.782,28	
03)	Indagini geognostiche	€ 0,00	
04)	Oneri di conferimento in discarica	€ 6.500,00	
05)		€ 0,00	
06)		€ 0,00	
07)	Imprevisti e arrotondamento	€ 13,60	
08)	Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
09)	Per contributo C.P.T.	€ 0,00	
	Sommano a disposizione	€ 120.899,56	
	Importo netto complessivo	€ 590.120,84	
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
09)	detrazione del ribasso d'asta del 31,145 % sull'importo a base di gara	€ 204.671,48	
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 45.027,72	
		€ 249.699,20	
	Importo complessivo A) +B) +C) =	€ 839.820,05	

- **CHE** in data 10.03.2022, con D.D. n° 236, è stata approvata la perizia di variante ed assestamento somme finale, secondo il seguente Q.T.E.:

QTE VARIANTE (D.D. n° 236 del 10.03.2022)			
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		657.062,32 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		15.024,92 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 31,145% sulla voce A1)		204.642,06 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori	467.445,18
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 102.837,94
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 10.753,40
03)	Indagini geognostiche		€ 0,00
04)	Oneri di conferimento in discarica		€ 6.500,00
05)	Imprevisti e arrotondamento		€ 0,00
07)	Per contributo A.V.C.P.		€ 375,00
	Sommano a disposizione		€ 120.466,34
	Importo netto complessivo		€ 587.911,52
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
01)	Ribasso d'asta residuo del 31,145 % sull'importo a base di gara		€ 204.642,06
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 45.021,25
03)	Per ulteriori economie		€ 2.245,22
			€ 251.908,53
	Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 839.820,05

CONSIDERATO:

- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° semestre dell'anno 2021, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;
- **CHE** in data 25.05.2022 con nota prot. 16995, l'impresa P.I.C.A. S.r.l. ha inoltrato istanza per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi di alcuni materiali impiegati per l'appalto;
- **CHE** il R.U.P. sulla scorta del conteggio del D.L. ha convalidato il suddetto calcolo, inviando la relativa documentazione alla Regione Siciliana con nota n° 23517 del 13.07.2022 per la richiesta di inoltro delle somme suddette;
- **CHE** la Regione Siciliana con nota n° 36786 del 21.08.2023, introitata al protocollo della Città Metropolitana di Messina al n° 28943 del 22.08.2023, ha comunicato che le risorse relative alle economie derivanti dal ribasso d'asta dei lavori di cui alla presente, per un importo complessivo di €. 172.482,39 (importo da considerare I.V.A. compresa) sono disponibili, restando pertanto in attesa della determinazione di approvazione del Q.T.E. rimodulato a seguito dell'utilizzo del ribasso d'asta;

VISTO il Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni PINTO del luglio 2022;

VISTI:

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- la Legge 106/2021 art. 1 septies
- la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399
- il Decreto Legge 01/03/2022 n° 17, art. 25
- Il Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022, art. 26
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo al sottoscritto, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;


DATO ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente

PROPONE

PRENDERE ATTO, per le ragioni sopra indicate del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni PINTO e convalidato dal R.U.P. in data 12.07.2022;

PRENDERE ATTO, che la somma residua da riconoscere all'impresa, sino alla concorrenza di €. 172.482,39 oltre I.V.A. al 22%, verrà liquidata dalla Città Metropolitana con successivo provvedimento, la cui copertura è stata già accertata con D.D. n° 2948 del 31.07.2023, al capitolo 7807 del bilancio 2023, acc. n° 537 del 01.08.2023;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, ex art. 1-septies L. 106/2021 per la compensazione dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, per un importo complessivo netto di €. 760.393,31 di cui €. 467.445,18 per lavori al netto, comprensivi di €. 15.024,92 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, €. 292.948,73 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed €. 79.426,14 per economie residue, secondo il seguente schema:

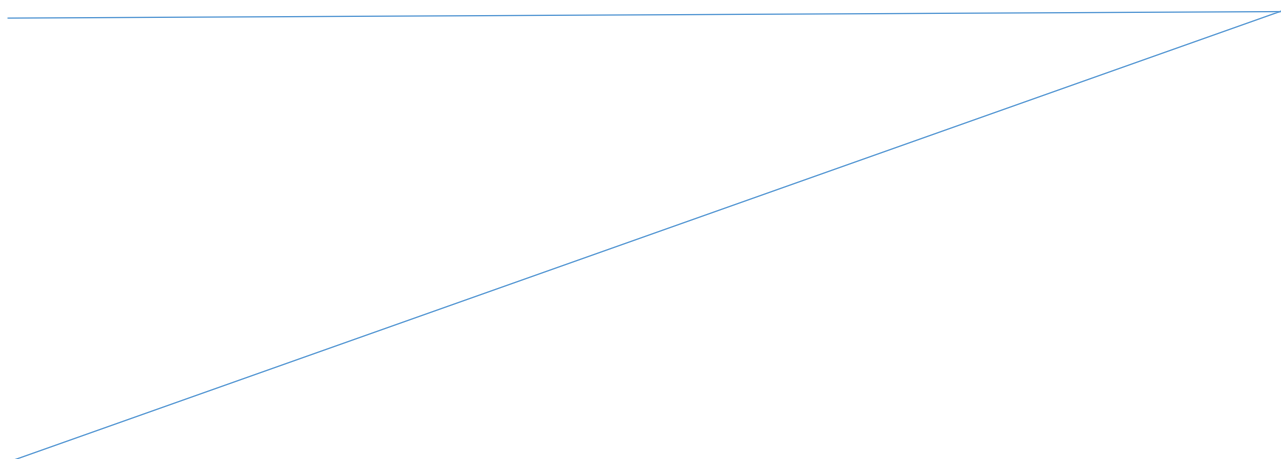

QTE FINALE RIMODULATO PER RICONOSCIMENTO CARO MATERIALI				
A) LAVORI				
1)	a base d'asta			657.062,32 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza			15.024,92 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta			0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 31,914% sulla voce A1)			204.642,06 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori		467.445,18
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
01)	I. V. A. (22% di A5)			€ 102.837,94
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)			€ 10.753,40
03)	Indagini geognostiche			€ 0,00
04)	Oneri di conferimento in discarica			€ 6.500,00
05)	Per riconoscimento caro materiali			€ 172.482,39
06)	Imprevisti e arrotondamento			€ 0,00
07)	Per contributo A.V.C.P.			€ 375,00
		Sommano a disposizione		€ 292.948,73
		Importo netto complessivo		€ 760.393,91
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto				
01)	Ribasso d'asta residuo del 31,145 % sull'importo a base di gara			€ 65.103,40
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta residuo al 22%			€ 14.322,75
03)	Per ulteriori economie			€ 0,00
				€ 79.426,14
		Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 839.820,05

LIQUIDARE per le motivazioni sopra esposte, la complessiva somma di €. 172.482,39 (I.V.A. compresa) intesa come anticipo sul complessivo, per il riconoscimento della compensazione relativa all'aumento prezzi materiali all'Impresa "PICA S.r.l." a compensazione dei maggiori prezzi di alcuni materiali di costruzione in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11/11/2021, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni PINTO;

DARE MANDATO E NOTIFICARE alla Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, la presente determinazione, per la tempestiva emissione del relativo mandato di pagamento ed il trasferimento alla Tesoreria provinciale della Città Metropolitana di Messina;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI
firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO chela stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

PRENDERE ATTO, per le ragioni sopra indicate del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni PINTO e convalidato dal R.U.P. in data 12.07.2022;

PRENDERE ATTO, che la somma residua da riconoscere all'impresa, sino alla concorrenza di €. 172.482,39 oltre I.V.A. al 22%, verrà liquidata dalla Città Metropolitana con successivo provvedimento, la cui copertura è stata già accertata con D.D. n° 2948 del 31.07.2023, al capitolo 7807 del bilancio 2023, acc. n° 537 del 01.08.2023;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, ex art. 1-septies L. 106/2021 per la compensazione dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, per un importo complessivo netto di €. 760.393,31 di cui €. 467.445,18 per lavori al netto, comprensivi di €. 15.024,92 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, €. 292.948,73 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed €. 79.426,14 per economie residue, secondo il seguente schema:

QTE FINALE RIMODULATO PER RICONOSCIMENTO CARO MATERIALI				
A) LAVORI				
1)	a base d'asta			657.062,32 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza			15.024,92 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta			0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 31,914% sulla voce A1)			204.642,06 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori		467.445,18
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
01)	I. V. A. (22% di A5)			€ 102.837,94
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)			€ 10.753,40
03)	Indagini geognostiche			€ 0,00
04)	Oneri di conferimento in discarica			€ 6.500,00
05)	Per riconoscimento caro materiali			€ 172.482,39
06)	Imprevisti e arrotondamento			€ 0,00
07)	Per contributo A.V.C.P.			€ 375,00
		Sommano a disposizione		€ 292.948,73
		Importo netto complessivo		€ 760.393,91
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto				
01)	Ribasso d'asta residuo del 31,145 % sull'importo a base di gara			€ 65.103,40
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta residuo al 22%			€ 14.322,75
03)	Per ulteriori economie			€ 0,00
				€ 79.426,14
		Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 839.820,05

LIQUIDARE per le motivazioni sopra esposte, la complessiva somma di €. 172.482,39 (I.V.A. compresa) intesa come anticipo sul complessivo, per il riconoscimento della compensazione relativa all'aumento prezzi materiali all'Impresa "PICA S.r.l." a compensazione dei maggiori prezzi di alcuni materiali di costruzione in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11/11/2021, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni PINTO;

DARE MANDATO E NOTIFICARE alla Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, la presente determinazione, per la tempestiva emissione del relativo mandato di pagamento ed il trasferimento alla Tesoreria provinciale della Città Metropolitana di Messina;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DARE ATTO CHE:

- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art.5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Jonica Alcantara, Ing. Giovanni LENTINI Recapiti 090/7761350 e-mail: g.lentini@cittametropolitana.me.it, -PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. -a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio –presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

La Dirigente reggente della III Direzione
Ing. Anna CHIOFALO
firmato digitalmente
