



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

n. 156 del 7 LUG. 2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI DELLA III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA.

IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemilaventi il giorno SETTE del mese di LUGLIO,
alle ore 12:30, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario
Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018, che all'art. 2 recita: "*le funzioni del Sindaco Metropolitan e della Conferenza Metropolitan sono esercitate dal Sindaco pro-tempore del Comune di Messina On.le Cateno De Luca*";

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PRESA D'ATTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI DELLA III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

PROPOSTA

PREMESSO:

- CHE con Atto di indirizzo del Sindaco Metropolitano, prot. n. 1044/20/GAB. del 30/04/2020, è stata disposta l'adozione di misure per l'accelerazione delle procedure di attuazione degli interventi programmati della III Direzione – Viabilità Metropolitana;
- CHE con nota prot. n. 1267/20/GAB. del 27/05/2020, su disposizione del Sindaco Metropolitano, è stata convocata una riunione per il giorno 16/06/2020 alle ore 10.00, relativamente allo stato di attuazione programmi degli interventi sulla viabilità metropolitana, riferiti ai programmi di finanziamento regionali e nazionali (Patto del Sud, A.P.Q., Patto per Messina e programma straordinario manutenzione rete viaria MIT);
- CHE in data 16/06/2020 alle ore 10.00, presso la sede istituzionale della Città Metropolitana di Messina, Palazzo dei Leoni, si è tenuta la riunione operativa con i R.U.P. della III Direzione – Viabilità Metropolitana, alla presenza del Sindaco Metropolitano, dott. Cateno De Luca, del Segretario Generale D.ssa Maria Angela Caponetti, del Capo di Gabinetto Dott. Francesco Roccaforte, del Dirigente della III Direzione Ing. Armando Cappadonia e del Dott. Geol. Salvo Puccio, esperto del Sindaco Metropolitano;
- CHE in qualità di R.U.P. l'Ing. Anna CHIOFALO, l'Arch. Francesco ORSI, il Geol. Biagio PRIVITERA, l'Ing. Antonino SCIUTTERI, l'Ing. Rosario BONANNO e l'Ing. Giovanni LENTINI, nel corso della riunione operativa, hanno presentato il quadro dettagliato, redatto su schemi sintetici degli interventi di propria competenza, contrattualizzati, da contrattualizzare, sulle procedure di appalto attivate e sulle procedure di progettazione in corso

Si propone che il Sindaco Metropolitano

DECRETI

PRENDERE ATTO dello stato di attuazione dei programmi inerenti la viabilità metropolitana, così come descritto nell'allegato resoconto della riunione operativa del 16/06/2020;

PRENDERE ATTO dei quadri dettagliati, redatti su schemi sintetici che si allegano, presentati dai R.U.P. della III Direzione – Viabilità Metropolitana;


DISPORRE che una prima riunione di verifica, per accertare criticità e scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati con l'Atto di Indirizzo prot. n. 1044/20/GAB. del 30/04/2020, venga convocata a cura del Dirigente della III Direzione entro il mese di settembre 2020;

DARE MANDATO al Dirigente della III Direzione – Viabilità Metropolitana di provvedere agli adempimenti necessari e consequenziali per la più celere attuazione degli interventi inseriti nei programmi di finanziamento regionali e nazionali, oggetto della riunione operativa del 16/06/2020.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

I.A. Loredana ROMEO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 del D.LGS. n. 39/1993


Il Dirigente
Ing. Armando CAPPADONIA

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Resoconto riunione operativa
2. Schemi sintetici degli interventi redatti dai RUP

Oggetto: PRESA D'ATTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI DELLA III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLI -

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 30/6/2020

Il Dirigente
Ing. Armando CAPPADONIA

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi 30 GIU 2020

Il Dirigente
Ing. Armando CAPPADONIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi _____

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
(Nome e COGNOME)

(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
(Nome e COGNOME)


(firma)

Decreto Sindacale n. 156 del 7 LUG. 2020

Oggetto: PRESA D'ATTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI DELLA III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano


.....
(Dott. Cateno DE LUCA)

Il Segretario Generale


.....
Avv. M. A. CAPONETTI

Il Certificato di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questa Città Metropolitana di Messina è reso in forma elettronica dal Servizio preposto.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

RESOCONTO RIUNIONE OPERATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL 16 GIUGNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di giugno, presso la sede istituzionale della Città Metropolitana di Messina, Palazzo dei Leoni, alle ore 10.00, su disposizione del Sindaco, giusto invito a firma del Capo di Gabinetto, dott. Francesco Roccaforte si è tenuta una riunione operativa con i RUP della III Direzione "Viabilità Metropolitana" finalizzata a fornire al Sindaco il quadro dettagliato sullo stato di attuazione degli interventi programmati del settore della viabilità.

Sono presenti all'incontro:

- Il Sindaco Metropolitano, dott. Cateno DE LUCA,
- Il Segretario Generale, D.ssa Maria Angela CAPONETTI,
- Il Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Messina, Dott. Francesco ROCCAFORTE;
- Il Dirigente Ing. Armando CAPPADONIA;
- Il Dott. Geol. Salvo PUCCIO, esperto del Sindaco metropolitano

Partecipano alla riunione i dipendenti Ufficio Viabilità Metropolitana:

- Geom. Gaetano MAGGIOLOTI;
- Istr. Amm. Sig.ra Loredana ROMEO.

I RUP vengono ricevuti, singolarmente, dal Sindaco secondo un ordine predisposto dal Dirigente, ing. Cappadonia.

Il Dott. Roccaforte, richiamando l'Atto di indirizzo del Sindaco prot. n.1044/20/Gab del 30.04.2020, con il quale è stata disposta l'adozione di misure per l'accelerazione delle procedure di attuazione degli interventi programmati nel settore viabilità, sottolinea che lo scopo della riunione odierna è quello di acquisire informazioni dettagliate sugli interventi contrattualizzati e da contrattualizzare, sulle procedure di appalto attivate e/o sulle procedure di progettazione in corso.

Ing. Anna Chiofalo – ore 10.10

L'ing Chiofalo, per i lavori di propria competenza, informa che 13 degli interventi con finanziamenti APQ, Patto per il Sud e Patto per Messina, sono stati già approvati in linea tecnica, per 6 di questi è già pronta la determinazione a contrarre ma, poiché l'accertamento è stato effettuato nel 2019, si attende l'approvazione della deliberazione di variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 e la riprogrammazione del fondo pluriennale vincolato.

Riferisce inoltre, che in data odierna, è stata inoltrata alla Ragioneria la Determinazione di approvazione amministrativa ed a contrarre con riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria con finanziamento MIT annualità 2020.

Il Dott. Roccaforte, rispetto alla organizzazione interna, richiama l'attenzione dei tecnici sulla necessità di rispettare le disposizioni regolamentari relative alla vigente ristrutturazione, anche in relazione alla degli uffici di direzione dei lavori onde evitare possibili situazioni di conflitto di interessi.

Arch. Francesco ORSI – ore 10.40

Dei lavori assegnati all'Arch. Orsi in qualità di RUP , sono già contrattualizzati:

- gli interventi sulla S.P. 15 Passo Aranciara – Antillo per i quali si è in attesa della consegna dei lavori;
- gli interventi sulla S.P. Itala - Guidomandri – Scaletta, aggiudicati alla A.T.I. “Intercontinentale”;
- gli interventi con finanziamento MIT sulla S.P. 92,93,96 e 96/bis sono stati consegnati a gennaio ed è già stato emesso il primo mandato.

Per quanto riguarda le opere di contenimento versanti s.p. 54/b Filari-Rometta il progetto è stato trasmesso alla Regione Siciliana e si è in attesa della emanazione del relativo Decreto di finanziamento.

Per quanto riguarda, invece i lavori sulla strada di scorrimento veloce San Piero Patti -Patti, considerato l'importo elevato, bisognerebbe ricorrere a gara europea; l'alternativa, ritiene, sarebbe di ricorrere ad un progetto misto, ovvero, effettuare la manutenzione della strada esistente con figure interne e poi procedere ad appalto esterno per il secondo tratto riducendo il costo della progettazione. Per questi lavori, riferisce, bisogna inoltre effettuare la verifica di impatto ambientale poiché è prevista la costruzione di un viadotto.

Ritiene comunque che la tempistica indicata nell'atto indirizzo (agosto 2020) difficilmente potrà essere rispettata perché gli adempimenti a porre in essere sono numerosi.

Il Dott. Roccaforte lo invita a stilare un preciso cronoprogramma degli interventi.

Il Sindaco ritiene opportuno che i RUP emanino delle direttive per informare i Sindaci dei Comuni interessati e i direttori dei lavori di tutti gli interventi avviati.

Geol. Biagio PRIVITERA – ore 11.00

Il Geol. Privitera riferisce che sei progetti rientranti nel Masterplan sono pronti e saranno appaltati nel momento in cui arriveranno i fondi, altri sono in fase di aggiornamento al protocollo anti Covid. In particolare per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei comuni di Brolo, Ficarra e Sinagra, ritiene si dovrebbe rimodulare il progetto perché supera l'importo di un milione di euro e bisognerebbe rivedere la base dei lavori.

Per i lavori sulla panoramica Castoreale-Monte Peloritani , l'importo è sotto soglia e si può procedere alla gara con procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa.

Il progetto SiRiMe è stato inviato a Palermo e si è in attesa dell'esito dell'istruttoria per l'acquisizione del finanziamento con i fondi delle Autonomie Locali.

Per quanto riguarda il progetto di verifica e monitoraggio dei ponti il sindaco ritiene che occorra effettuare una schedatura dei Ponti e procedere alla verifica sismica ed eventualmente attingere al Fondo dell'Ente per la loro eventuale sistemazione.

Ing. SCIUTTERI – Ore 11.20

Riferisce che n. 13 lavori rientranti nel Masterplan, sono esecutivi in fase di aggiornamento al protocollo anti Covid. Entro agosto, con l'arrivo dei finanziamenti, si completerà l'iter con la predisposizione delle Determinazione a contrarre.

Anche in questo caso il Dott. Roccaforte raccomanda di tenere conto nella organizzazione dei lavori della nuova ristrutturazione.

Per i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza sulla S.P. 110 Montalbanese tra la S.S. 113 e fino alla S.P. 122 Pattese, trattandosi di importo superiore ai due milioni di euro, la procedura di gara viene avviata dall'UREGA.

Per i lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento della S.S. 185 Mazzarà Sant'Andrea – Novara di Sicilia, la competenza è stata trasferita all'Anas.

Per i lavori di consolidamento, raccolta acque e ricostruzione piano viabile S.P. 58 di Valdina, occorre effettuare delle indagini geotecniche e si richiede la nomina di un geologo.

Ing. Rosario BONANNO – ore 11.40

Informa che 7 progetti sono pronti per essere appaltati, si attende solo l'arrivo dei fondi previsti. Altri 11 interventi risultano validati, sono già state predisposte le determinazioni a contrarre in attesa della Deliberazione di riprogrammazione del fondo pluriennale vincolato. N 5 interventi richiedono, invece, delle consulenze geologiche e questo determinerà un prolungamento dei tempi.

In particolare, per quanto riguarda il progetto di consolidamento della S.A. Tortorici-S.Costantino -Marù, riferisce che è stato ripreso e rimodulato un vecchio progetto per realizzare il quale sarebbe ora necessaria la ricostruzione di un ponte di collegamento con previsione di tempi piuttosto lunghi.

Il Sindaco De Luca suggerisce di mettere in sicurezza il ponte con interventi di manutenzione straordinaria con i fondi dell'Ente e recuperare il progetto a stralci per accelerare il più possibile i tempi. Ritiene inoltre che bisogna anticipare le somme per l'acquisizione delle consulenze e delle verifiche, ove necessarie, dando comunicazione all'Assessorato alle Infrastrutture per ottenerne il rimborso trattandosi di spese contemplate nel piano economico e ascrivibili in Bilancio come partite giro rimborso conto terzi. Tutto ciò per evitare che i lavori programmati possano subire ulteriori ritardi.

Per quanto riguarda la costituzione dei nuclei tecnici dei progetti relativi agli interventi dell'Area Interna Nebrodi, come riportato dal Dott. Roccaforte, il RUP si dovrà organizzare con il servizio territorialmente competente, tenendo conto della nuova ristrutturazione ed evitando in qualunque caso l'insorgere di potenziali conflitti di interesse all'interno dello stesso servizio tra RUP, nucleo di progettazione, Direttore dei Lavori e altre competenze professionali, dalla attività di supporto al collaudatore. In merito alla possibilità di utilizzare in anticipazione le somme del bilancio metropolitano per completare la progettazione del programma aree interne si conviene di inviare una nota alle aree interne e al referente regionale evidenziando che l'attivazione di questa procedura presuppone il rimborso delle somme impegnate a carico del finanziamento.

Ing Giovanni LENTINI – ore 12.10

In merito ai lavori del RUP Ing Lentini, sono pronti per essere appaltati tutti gli interventi di messa in sicurezza dei Villaggi di Messina sud e della fascia ionica fino a Giardini Naxos.

Per i lavori di ammodernamento sulla S.P. Castelluzzese, è già stato predisposto l'adeguamento al protocollo anti Covid ed affidato l'incarico per le necessarie indagini geologiche e di consulenza specialistica geotecnica.

Il Dott. Roccaforte raccomanda, ancora una volta, di tener conto della nuova ristrutturazione nella organizzazione dei lavori.

L'incontro si conclude alle ore 12.30

Redatto dalla D.ssa Rosaria CERTO
Responsabile Segreteria Amministrativa
Gabinetto Istituzionale

Messina, 16.06.2020



PROGRAMMAZIONE VIABILITA' ANNO 2020/2022 - (stralcio ELENCO ANNUALE 2020 approvato con Decreto Sindacale n.31 del 18/02/2020)


	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO TOTALE INTERVENTO	procedura di gara	FONTE DI FINANZIAMENTO	STATO AVANZAMENTO
		cognome	nome				
737	PROGETTO DEI Lavori di MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' delle STRADE PROVINCIALI ricadenti nel VILLAGGI NORD del COMUNE DI MESSINA NELLE CONTRADE "tono", "FARO SUPERIORE", "CURCURACI", "CASAZZA", "SALICE" E "CAMPO ITALIA"	CHIOFALO	ANNA	690.000,00 €		ART.5 L.R. N13 19/07/2019	PROGETTO DEFINITIVO CON SCHEDA COMPILATA INOLTRATO ALLA REGIONE SICILIANA PER IL FINANZIAMENTO
738	PROGETTO DEI Lavori di MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' delle STRADE PROVINCIALI della "RIVIERA DI PONENTE" ricadenti nei COMUNI DI MILAZZO – BARCELLONA – TERME VIGLIATORE E DELLE SS.PP. 110 e 101 NEL COMUNE DI FURNARI	CHIOFALO	ANNA	690.000,00 €		ART.5 L.R. N13 19/07/2019	PROGETTO DEFINITIVO CON SCHEDA COMPILATA INOLTRATO ALLA REGIONE SICILIANA PER IL FINANZIAMENTO
	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza sulle SS.PP. 52-53-54-54 bis-56-58 e 59 ricadenti nei Comuni interessati dall'attraversamento dell'Elettrodotto Sorgente-Rizziconi.	CHIOFALO	ANNA	800.000,00 €		FONDI CONVENZIONE CON TERNA ELETTRRODOTTO RIZZICONI	DETERMINA A CONTRARRE 365 DEL 17/4/2020
573	Ripristino sede stradale S.P.A. Francavilla-Cozzo Schisina-Contura	CHIOFALO	ANNA	250.000,00 €		fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017	Da predisporre determina a contrarre per il piano di indagini di progetto prioritarie alla redazione dei calcoli statici
582	Opere di difesa del ponte sul T. Vallebona S.P. 96 di S. Basilio	CHIOFALO	ANNA	1.500.000,00 €		fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017	Da predisporre determina a contrarre per il piano di indagini di progetto e per i servizi di ingegneria necessari (Relazione Paesaggistica - Verifica Idraulica)
576	Ripristino sede stradale- consolidamento corticale S.P.A. Falcone- S.Barbara	CHIOFALO	ANNA	1.488.296,50 €		fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 (APQ) D.D.G. 606 del 8/04/2019 ACC. 2019	PREDISPOSTA DETERMINA A CONTRARRE
586	Muro pericolante e consolidamento corticale S.P. 140 di S. Angelo di Brolo Km 12+500	CHIOFALO	ANNA	989.513,20 €		fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 (APQ) - D.D. 481 del 16/04/2018 - ACC. 2019	PREDISPOSTA DETERMINA A CONTRARRE
571	Opere contenimento versanti, ricostruzione p. v. S.P. 44 Campo Italia - Messina	CHIOFALO	ANNA	750.000,00 €		fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 Contributo straordinario Euro 2.698.907,94 LR 9/2015 art. 10 comma 1(Euro 552.907,94)	Determina approvazione risultanze conferenza servizi n. 1329 del /11/2018 - Parere in linea tecnica N° 58 del 10/12/2018 - Progetto aggiornato COVID 8/06/2020
849	Lavori di sistemazione del piano viabile per la mitigazione del rischio alla circolazione stradale lungo le SS.PP. Ricadenti nei comuni della valle del Mela.	CHIOFALO	ANNA	500.000,00 €		Legge Regionale n.9 del 7/5/2015	PROGETTO FATTO PREZZI 2018 IMPORTO LAVORI € 388.752 - ED AGGIORNARE COVID 19

	Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n.1 Di Mojo Alcantara della S.P. n° 2 di Roccella Valdemone e della S.P. n° 6 di Motta Camastra” progetto inserito nel Masterplan “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina”	CHIOFALO	ANNA	700.000,00 €		MASTERPLAN	Contratto stipulato
	Lavori di manutenzione straordinaria messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 17 San Francesco di Paola n. 18 Scorsonello e n 18/bis di Botte	CHIOFALO	ANNA	800.000,00 €		MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	gara espletata il 10/10/2019 NON AGGIUDICATA per mancanza di copertura finanziaria
640	Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale Fantina - Guggitto - innesto S.P. 95 di S. Marco	CHIOFALO	ANNA	600.000,00 €		MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	Parere in linea tecnica n. 50/2018 Approv. Amministrativa D.D. 431/19 progetto da aggiornare al protocollo anti COVID
626	Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS. PP. ricadenti nei Comuni di Terme Vigliatore e Furnari per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la I	CHIOFALO	ANNA	1.500.000,00 €		MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	Parere in linea tecnica n.17/2019 Approv. Amministrativa D.D. 435/19 Si sta procedendo ad aggiornare il progetto al protocollo anti COVID
639	Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali tra i comuni di Rodì Milici e Fondachelli Fantina	CHIOFALO	ANNA	600.000,00 €		MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	Parere in linea tecnica n.78/2018 Approv. Amministrativa D.D. 443/19 Si sta procedendo ad aggiornare il progetto al protocollo anti COVID
641	Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n. 95 di S. Marco e n. 96 di S. Basilio	CHIOFALO	ANNA	500.000,00 €		MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	Parere in linea tecnica n. 19/2018 Approv. Amministrativa D.D. 695/18 Agg. Prezzi D.D. 1566/18 Si sta procedendo ad aggiornare il progetto al protocollo anti COVID
642	Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n. 110 Montalbanese e n. 122 Pattese, nel tratto compreso tra l'innesto con la S. P. n. 115 e la S. S. n.116 in località Favoscuaro e sulla diramazione P	CHIOFALO	ANNA	900.000,00 €		MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	Parere in linea tecnica n.20/2018 Approv. Amministrativa D.D. 795/18 Si sta procedendo ad aggiornare il progetto al protocollo anti COVID
643	Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n. 115 Tripiciana	CHIOFALO	ANNA	1.300.000,00 €		MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	Parere in linea tecnica n.77/2018 Approv. Amministrativa D.D. 432/19 Si sta procedendo ad aggiornare il progetto al protocollo anti COVID
644	Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali ricadenti nei comuni di Oliveri e Falcone	CHIOFALO	ANNA	1.000.000,00 €		MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	Parere in linea tecnica n.48/2018 Approv. Amministrativa D.D. 795/18 Si sta procedendo ad aggiornare il progetto al protocollo anti COVID
	Riprogrammazione interventi – con oggetto: “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della SP 43 bis Nuova Panoramica di Messina”	CHIOFALO	ANNA	2.500.000,00 €		MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	Progetto già ultimato da convocare conferenza dei servizi per acquisizione pareri e predisposizione manifestazione di interesse (a firma congiunta dei RUP interessati) per verifica progetto
616	Strada di collegamento "Valle Alcantara - Taormina"	CHIOFALO	ANNA	4.000.000,00 €		MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	Eliminato con rimodulazione Masterplan

617	Riqualificazione ambientale e realizzazione dell'asse viario di collegamento tra "Terme Vigliatore-Fondachelli Fantina-Francavilla di Sicilia-Taormina-Giardini Naxos"	CHIOFALO	ANNA	13.000.000,00 €		MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	Eliminato con rimodulazione Masterplan
768	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 117 - 119 - 122d - 127 - 128 - 129 - 133C - 140bis - 146 - 136 . (Annualità 2019). Importo complessivo € 937.600,00	CHIOFALO	ANNA	937.600,00 €		MIT - DEC. MIN 49 DEL 16/02/2019	Contratto stipulato
	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 108dir - 109 - 122bis - 122a - 122b - 123 - 135 - 141 - 145 - 146bis. (Annualità 2020)	CHIOFALO	ANNA	937.600,00 €		MIT - DM 49 del 16/02/2019 ANNUALITA' 2020	PREDISPOSTA DETERMINA A CONTRARRE
594	Lavori di manutenzione straordinaria sulle pertinenze stradali dei villaggi Nord	CHIOFALO	ANNA	91.000,00 €		PATTO PER IL SUD D.D. 378 DEL 28/03/2018 ACC. 2019	PROPOSTA DI DETERMINA A CONTRARRE N° 563 DEL 5/6/2020 RESTITUITA DALLA RAGIONERIA PER RIPROPORLA DOPO L'APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO
596	Lavori di manutenzione straordinaria lungo la SP Sinagra-Limari	CHIOFALO	ANNA	129.600,00 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia - Viabilità secondaria PATTO PER IL SUD - D.D.G. 1408 del 13/6/19 - ACCERTAM. SOMME D.D. 993/2019	PREDISPOSTA DETERMINA A CONTRARRE
606	Completamento ed ammodernamento tratti vari della S.P. 161 tra i km. 12+500 e 14+400. -Alcara Li Fusi	CHIOFALO	ANNA	1.094.900,00 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia - Viabilità secondaria PATTO PER IL SUD - D.D.G. 3676 del 5/12/18 - ACCERTAM. SOMME D.D. 993/2019	PREDISPOSTA DETERMINA A CONTRARRE
609	Lavori di consolidamento della sede stradale della S.A. dalla fraz. Cardà- S.Vto-Sottocatena, con Roccavaldina.			1.745.624,32 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia - Viabilità secondaria	Progetto eliminato con decreto Sindacale e proposto altro per rimodulazione PIANO
854	Lavori di sistemazione del piano viabile lungo la S.P. 44 di Campo Italia dal Km 4+500 al Km 8+000 nel comune di Messina.	CHIOFALO	ANNA	200.000,00 €		Riprogammazione APQ Delib.Reg. 310 del 28/8/2018	PROGETTO FATTO con PREZZI 2018 DA AGGIORNARE COVID 19 e approvazioni tecnica e amministrativa
				Importo complessivo	40.194.134,02 €		

N° interventi	RIEPILOGO		
2	Interventi contrattualizzati o da contrattualizzare entro Giugno 2020	importo complessivo	1.637.600,00
10	Interventi validati già decretati con determina a contrarre in itinere o in attesa di decreto di finanziamento	importo complessivo	7.660.909,70
9	Interventi la cui progettazione è da validare entro Agosto 2020	importo complessivo	7.100.000,00
5	Interventi eliminati e da rimodulare	importo complessivo	20.495.624,32
1	Progetti già ultimati da convocare conferenza dei servizi per acquisizione pareri	importo complessivo	2.500.000,00
1	gara espletata il 10/10/2019 NON AGGIUDICATA per mancanza di copertura finanziaria	importo complessivo	800.000,00
		Totale	40.194.134,02

28

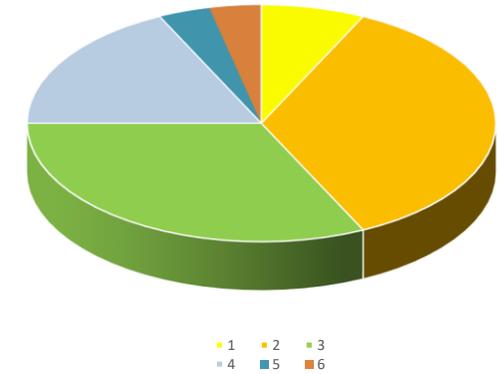

il RUP

Ing. Anna CHIOFALO




PROGRAMMAZIONE VIABILITA' ANNO 2020/2022 - (stralcio ELENCO ANNUALE 2020 approvato con Decreto Sindacale n.31 del 18/02/2020)							
	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO TOTALE INTERVENTO	procedura di gara	FONTE DI FINANZIAMENTO	STATO AVANZAMENTO
		cognome	nome				
1	Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 15 di Passo Aranciara e del tratto della S.P. 19 Antillo – Bivio S.P. 15.	ORSI	FRANCESCO	1.200.000,00 €		MASTERPLAN	autorizzato il D.L. alla consegna dei lavori
2	Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 28-29-31-32 di Alì Itala, Guidomandri e Scaletta.	ORSI	FRANCESCO	800.000,00 €		MASTERPLAN	autorizzato il D.L. alla consegna dei lavori
3	Realizzazione della strada a scorrimento veloce "Patti (A20) - San Piero Patti " 3° lotto - stralcio	ORSI	FRANCESCO	13.734.850,00 €		MASTERPLAN	Predisposto Schema per Servizi di Architettura e Ingegneria per progettazione Definitiva / Esecutiva
4	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 2 - 93 - 96 - 96bis - 97 - 102 - 114 e 116 (Annualità 2019).	ORSI	FRANCESCO	837.820,84 €		MIT - DM 49 del 16/02/2019	Lavori consegnati ed in esecuzione
5	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 1 - 7 - 95 - 96dir - 97a - 97b - 97c - 100 - 100bis - 110a - 111 - 112dir - 112bis. (Annualità 2020).	ORSI	FRANCESCO	837.820,84 €		MIT - DM 49 del 16/02/2019	Progetto in fase di elaborazione
6	Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino del piano viabile sulla S.P. 178 di Vulcano – Comune di Lipari	ORSI	FRANCESCO	60.000,00 €		Fondi dell'Ente	da espletare la procedura di affidamento
7	Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della S.P. 54 in loc. Sottocastello ricadente nel territorio di Rometta (ME) Cod. ME 124."	ORSI	FRANCESCO	700.000,00 €		Protezione Civile Regionale	procedura di gara fissata per il giorno 24/06/2020
8	Opere di contenimento versanti s.p. 54/b Filari - Rometta	ORSI	FRANCESCO	600.000,00 €		Fondi ex ANAS (A.P.Q.)	PROGETTO TRASMESSO ALLA REGIONE SICILIA, IN ATTESA EMANAZIONE DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO
9	Consolidamento dei versanti a monte della carreggiata ed interventi strutturali di difesa costiera a protezione della strada S.P. 180 Canneto	ORSI	FRANCESCO	500.000,00 €		Fondi ex ANAS (A.P.Q.)	In affidamento incarico esterno per collaborazione specialistica geotecnica e per strutture di difesa costiera
10	Eliminazione frana, consolidamento pendii, opere di contenimento, raccolta e convogliamento acque, risagomatura piano viabile S.P.A. Filicudi Porto-Pecorini a mare (isola di Filicudi) - Comune di Lipari	ORSI	FRANCESCO	649.180,00 €		Fondi ex ANAS (A.P.Q.)	In affidamento incarico per indagini geognostiche in parete
11	Opere contenimento versante completamento interventi S.P. 56 di Rometta	ORSI	FRANCESCO	300.000,00 €		Fondi ex ANAS (A.P.Q.)	Progetto in fase di elaborazione ed aggiornamento costi sicurezza COVID 19

Importo complessivo	20.219.671,68 €
---------------------	------------------------

N° interventi	RIEPILOGO		
5	Interventi contrattualizzati o da contrattualizzare entro Agosto 2020	importo complessivo	3.597.820,84
1	Interventi validati già decretati con determina a contrarre in itinere o in attesa di decreto di finanziamento	importo complessivo	600.000,00
2	Interventi la cui progettazione è da validare entro Agosto 2020	importo complessivo	1.137.820,84
3	Interventi la cui progettazione comporta consulenze o indagini specialistiche con copertura finanziaria da reperire per i quali si prevedono tempi più lunghi	importo complessivo	14.884.030,00
		Totale	20.219.671,68

11

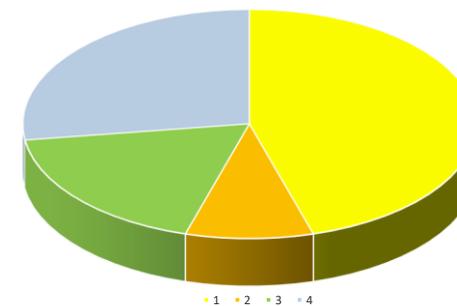


il RUP
Arch. Francesco ORSI



PROGRAMMAZIONE VIABILITA' ANNO 2020/2022 - (stralcio ELENCO ANNUALE 2020 approvato con Decreto Sindacale n.31 del 18/02/2020)							
Riferimento scheda 2 Piano Triennale	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO TOTALE INTERVENTO	procedura di gara	FONTE DI FINANZIAMENTO	STATO AVANZAMENTO
		cognome	nome				
1	Panoramica "Castroreale-Montepeloritani" collegamento e messa in sicurezza	PRIVITERA	BIAGIO	10.000.000,00 €	Procedura aperta offerta Economicamente più vantaggiosa da indire	Masterplan	Predisposto Schema per Servizi di Architettura e Ingegneria per progettazione Definitiva / Esecutiva
2	Progetto dei lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 109, 118/a, 119, 120, 122 e 136 ricadenti nel territorio dei comuni di Patti e S. Piero Patti	PRIVITERA	BIAGIO	1.200.000,00 €	procedura negoziata	Masterplan	IN FASE DI AGGIORNAMENTO PROGETTO SICUREZZA COVID - 19 Determina a Contrarre in predisposizione
3	Progetto dei lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 126 e 132 ricadenti nel territorio dei comuni di Montagnareale e Librizzi	PRIVITERA	BIAGIO	900.000,00 €	procedura negoziata	Masterplan	IN FASE DI AGGIORNAMENTO PROGETTO SICUREZZA COVID - 19 Determina a Contrarre in predisposizione
4	Progetto dei lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 133, 133/c, 134, 135, 135b e 135c ricadenti nel territorio del comune di Gioiosa Marea	PRIVITERA	BIAGIO	1.000.000,00 €	procedura negoziata	Masterplan	IN FASE DI AGGIORNAMENTO PROGETTO SICUREZZA COVID - 19 Determina a Contrarre in predisposizione
5	Progetto dei lavori per il consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 138, 140 e 140bis nel territorio dei comuni di Piraino e S. Angelo di Brolo	PRIVITERA	BIAGIO	1.100.000,00 €	procedura negoziata	Masterplan	IN FASE DI AGGIORNAMENTO PROGETTO SICUREZZA COVID - 19 Determina a Contrarre in predisposizione
6	Progetto dei lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 143, 144, 145, 145dir, 146, 146a e 146 bis ricadenti nel territorio dei comuni di Brolo, Ficarra e Sinagra	PRIVITERA	BIAGIO	1.300.000,00 €	procedura aperta	Masterplan	IN FASE DI AGGIORNAMENTO PROGETTO SICUREZZA COVID - 19 Determina a Contrarre in predisposizione
7	Progetto dei lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 136, 137, 138, 139 e 139a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja - Ucria e Floresta	PRIVITERA	BIAGIO	700.000,00 €	procedura negoziata	Masterplan	IN FASE DI AGGIORNAMENTO PROGETTO SICUREZZA COVID - 19 Determina a Contrarre in predisposizione
8	Barriera Paramassi Fiumedinisi	PRIVITERA	BIAGIO	105.000,00 €	già espletata	Bilancio 2019	Riaggiudicazione in corso determina di affidamento
9	Verifica sismica e monitoraggio ponti viabilità Metropolitana	PRIVITERA	BIAGIO	750.466,00 €	da definire	Masterplan	PREDISPOSTO REPORT COMPLESSIVO PREVISIONE CODISTI SUI PONTI CENSITI

10	Piano di Rafforzamento Amministrativo	PRIVITERA	BIAGIO	2.480.640,00 €	da definire	Masterplan	IN FASE DI DEFINIZIONE ACCORDO CON INVITALIA
11	Progetto SiRiMe	PRIVITERA	BIAGIO	310.000,00 €	MEPA e CONSIP	D.D. 423	TRASMESSE PROGETTO ESECUTIVO DRPC 01/06/2020 IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
12	Piano di investigazione analitica aree limitrofe sponda sinistra del Torrente Fiumedinidi (Nisi) in una porzione a monte ed a valle del viadotto autostradale finalizzato all'applicazione del D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017.	PRIVITERA	BIAGIO	125.000,00 €	da definire	DRPC	PROGETTO ESECUTIVO TRASMESSE A DRPC 16/06/2020 IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
				Importo complessivo			19.971.106,00 €

N° interventi	RIEPILOGO		
1	Interventi contrattualizzati o da contrattualizzare entro Giugno 2020	importo complessivo	105.000,00
8	Interventi validati già decretati con determina a contrarre in itinere o in attesa di decreto di finanziamento	importo complessivo	6.635.000,00
1	Interventi la cui progettazione è da validare entro Agosto 2020	importo complessivo	10.000.000,00
2	Interventi la cui progettazione comporta consulenze o indagini specialistiche con copertura finanziaria da reperire per i quali si prevedono tempi più lunghi	importo complessivo	3.231.106,00
12		Totale	19.971.106,00

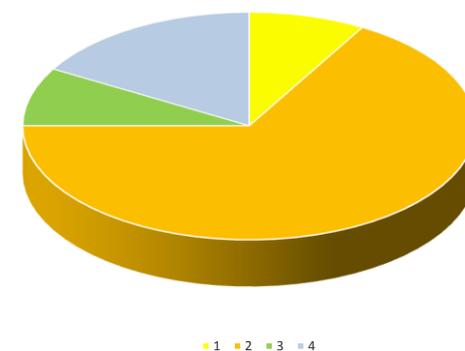

il RUP
Dott. Biagio PRIVITERA




PROGRAMMAZIONE VIABILITA' ANNO 2020/2022 - (stralcio ELENCO ANNUALE 2020 approvato con Decreto Sindacale n.31 del 18/02/2020)							
	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO TOTALE INTERVENTO	procedura di gara	FONTE DI FINANZIAMENTO	STATO AVANZAMENTO
		cognome	nome				
570	Opere consolidamento galleria e difesa costiera (richiesto finanziamento anche al Dip. Reg. Prot. Civile) S.P. 181 di Pignataro - Lipari Messina	SCIUTTERI	ANTONINO	400.000,00 €		fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 Contributo straordinario Euro 2.698.907,94 LR 9/2015 art. 10 comma 1 (Euro 2.416.000,00)	Esec. da Agg. Covid
575	Opere consolidamentoto versanti a monte ricostruzione rete S.P. 53 di Saponara	SCIUTTERI	ANTONINO	600.000,00 €		fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017	Esec. da Agg. Covid
577	Consolidamento perndii, rraccolta acque, ricostruzione piano viabile S.P. 58 di Valdina	SCIUTTERI	ANTONINO	1.350.000,00 €		fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017	Esec. da Agg. Covid
587	Ricostruzione corpo stradale S.P. 57 Barrera	SCIUTTERI	ANTONINO	800.000,00 €		fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017	Esec. da Agg. Covid
591	Consolidamento versanti a monte e rifacimento parapetti S.P. 72 bis - della marina Garibaldi - Punta Cirucco	SCIUTTERI	ANTONINO	900.000,00 €		fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017	Esec. da Agg. Covid
600	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della SP 72/bis Milazzo-Capo Milazzo (punta Cirucco)	SCIUTTERI	ANTONINO	390.000,00 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia - Viabilità secondaria	Esec. da Agg. Covid
604	Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi del PIT n° 22 (La via dell'argilla...) e dei poli culturali, sul circuito S.P. 62-S.S.113 S. Pier Marina - S.Pierniceto -	SCIUTTERI	ANTONINO	596.325,60 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia - Viabilità secondaria	Esec. da Agg. Covid
613	Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i PIT e poli turistici, lungo la S.P. 110 "Montalbanese", dalla S.S. 113 in prossimità Portorosa, sino alla S. P. 122 "Pattese"	SCIUTTERI	ANTONINO	4.512.994,02 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia - Viabilità secondaria	Avv. Proc. UREGA
621	Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze della S. P. 85 nei comuni di Castoreale e Barcellona P.G. per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litorane	SCIUTTERI	ANTONINO	1.000.000,00 €		Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	Esec. da Agg. Covid
622	Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze della S. P. 82 nei comuni di Castoreale e Barcellona P.G. per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litorane	SCIUTTERI	ANTONINO	1.000.000,00 €		Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	Esec. da Agg. Covid
623	Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS. PP. 73, 72d e 75 bis nei comuni di Meri e Barcellona P.G. e Milazzo per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Lo	SCIUTTERI	ANTONINO	1.000.000,00 €		Patto per lo sviluppo della Città Matropolitana di Messina	Esec. da Agg. Covid

624	Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze della SS. PP. 62 e 63 nei comuni di S. Pier Niceto, Condò, per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea	SCIUTTERI	ANTONINO	500.000,00 €		Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	Esec. da Agg. Covid
625	Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze della S. P. 64 e 65 nei comuni di pace del Mela e Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela per il collegamento dell	SCIUTTERI	ANTONINO	1.000.000,00 €		Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	Esec. da Agg. Covid
627	Progetto di sistemazione, consolidamento e protezione del piano viabile e delle relative pertinenze delle SS. PP. ricadenti nelle Isole Eolie	SCIUTTERI	ANTONINO	500.000,00 €		Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	Esec. da Agg. Covid
628	Progetto di sistemazione, consolidamento e protezione del piano viabile e delle relative pertinenze delle SS. PP. ricadenti nei comuni di Meri, Barcellona P.G. e Castroreale	SCIUTTERI	ANTONINO	1.300.000,00 €		Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	Esec. da Agg. Covid
629	Progetto dei lavori di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza del piano viabile delle SS. PP. ricadenti nel territorio del comune di Messina - Villaggi Nord	SCIUTTERI	ANTONINO	800.000,00 €		Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	Esec. da Agg. Covid
630	Progetto dei lavori di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza del piano viabile delle SS. PP. ricadenti nel territorio dei comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Roccavaldina, Monforte S. Giorgio, Torregrotto	SCIUTTERI	ANTONINO	800.000,00 €		Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	Esec. da Agg. Covid
739	Lavori di M.S. lungo la S.P. 119 di Moreri in località S.Maria del Comune di Montalbano Elicona per il consolidamento del piano viabile	SCIUTTERI	ANTONINO	100.000,00 €		ART.5 L.R. N13 19/07/2019	Esec. da Agg. Covid
740	Lavori sulle "S.P. 6 e S.P.A. - allacciamento al cimitero territorio comunale di Motta Camastra - realizzazione di opere di contenimento, rifunzionalizzazione sistemi di raccolta acque meteoriche, rifacimento tratti di piano viabile per il cedimento di muri a secco, occlusione tombini di scarico acque, sgretolamento manto stradale, smottamenti".	SCIUTTERI	ANTONINO	110.000,00 €		ART.5 L.R. N13 19/07/2019	Esec. da Agg. Covid
741	Lavori di M.S. per opere di protezione laterali lungo la S.P. Rodi Milici - Fantina nei Comuni di Rodi Milici e Fondachelli Fantina.	SCIUTTERI	ANTONINO	160.000,00 €		ART.5 L.R. N13 19/07/2019	Esec. da Agg. Covid
742	Lavori urgenti per il consolidamento del tombino e del piano viabile collassato alla progressiva km. 16+150 della S.P. 110 Montalbanese nel Comune di Basicò.	SCIUTTERI	ANTONINO	58.700,00 €		ART.5 L.R. N13 19/07/2019	Esec. da Agg. Covid
743	Lavori di M.S. lungo la SS.PP. dei Comuni di Falcone ed Oliveri per sistemazione e consolidamento del piano viabile.	SCIUTTERI	ANTONINO	170.000,00 €		ART.5 L.R. N13 19/07/2019	Esec. da Agg. Covid
744	Lavori di M.S. per il consolidamento e sistemazione del piano viabile della S.P. 119 alkm. 9+000 circa ricadente nel Comune di Patti.	SCIUTTERI	ANTONINO	210.000,00 €		ART.5 L.R. N13 19/07/2019	Esec. da Agg. Covid
745	Lavori di M.S. per il consolidamento e sistemazione del piano viabile della S.P. 122 "Pattese" dal km. 7+500 (Colla Maffone) al km. 9+500 (Ponte Murmari) nel territorio del Comune di Librizzi.	SCIUTTERI	ANTONINO	225.000,00 €		ART.5 L.R. N13 19/07/2019	Esec. da Agg. Covid
746	Lavori per il consolidamento del piano viabile e la regimentazione delle acque superficiali lungo le SS.PP. Ricadenti nei Comuni di Patti e Librizzi.	SCIUTTERI	ANTONINO	436.153,00 €		ART.5 L.R. N13 19/07/2019	Esec. da Agg. Covid
769	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 42 ,44, 46, 47, 49, 50bis dir, 80bis, 82a, 84d, 86, 72h, 73d, 75/a, 77/a, 77/b. (Annualità 2019) Importo complessivo € 937.600,00	SCIUTTERI	ANTONINO	937.600,00 €		MIT - DM 49 del 16/02/2019 ANNUALITA' 2019	Da consegnare

	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/a, 181/b, 181/c, 181/d, 181/e, 182, 183, 184 ricadenti nelle isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina. (Annualità 2020)	SCIUTTERI	ANTONINO	937.600,00 €		MIT - DM 49 del 16/02/2019 ANNUALITA' 2020	Esec. Da Agg. Covid
850	Lavori di sistemazione del piano viabile lungo le SS.PP. Agricole principali ricadenti nel territorio compreso tra Patti e Ucria.	SCIUTTERI	ANTONINO	500.000,00 €		Legge Regionale n.9 del 7/5/2015	Esec. da Agg. Covid
851	Lavori di sistemazione del piano viabile lungo la S.P. 119 di Moreri - tra il Km 12+000 e il Km 19+022 - nel comune di Montalbano Elicona	SCIUTTERI	ANTONINO	300.000,00 €		Riprogrammazione APQ Delib.Reg. 310 del 28/8/2018	Esec. da Agg. Covid
855	Lavori di sistemazione del piano viabile lungo la S.P. 122, tra il Km 15+400 e il Km 28+000 nel comune di S. Piero Patti e lungo la SPA "Santa Venera - Piano Ravò" nei comuni di Librizzi e Sant'Angelo di Brolo.	SCIUTTERI	ANTONINO	500.000,00 €		Riprogrammazione APQ Delib.Reg. 310 del 28/8/2018	Esec. da Agg. Covid
				Importo complessivo	22.094.372,62 €		

N° interventi	RIEPILOGO		
1	Interventi contrattualizzati o da contrattualizzare entro Giugno 2020	importo complessivo	937.600,00
13	Interventi validati già decretati con determina a contrarre in itinere o in attesa di decreto di finanziamento	importo complessivo	8.220.447,02
16	Interventi la cui progettazione è da validare entro Agosto 2020	importo complessivo	12.936.325,60
30		Totale	22.094.372,62

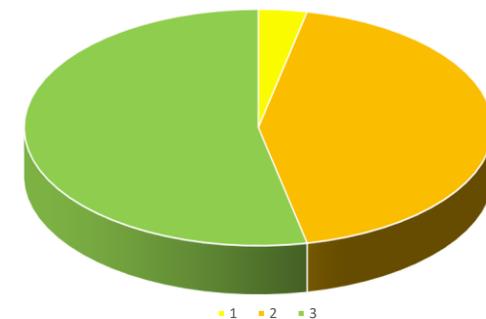

il RUP
Ing. Antonino SCIUTTERI



PROGRAMMAZIONE VIABILITA' ANNO 2020/2022 - (stralcio ELENCO ANNUALE 2020 approvato con Decreto Sindacale n.31 del 18/02/2020)

	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO TOTALE INTERVENTO	procedura di gara	FONTE DI FINANZIAMENTO	STATO AVANZAMENTO	
		cognome	nome					
1	847	Lavori per il rifacimento di due tratti del muro di sostegno al km 6+200 ed al km 6+400 della S.P. 12 nel comune di Limina.	BONANNO	ROSARIO	191.000,00 €	affidamento diretto con tre operatori	Art. 10 Legge Regionale n.9 del 7/5/2015	IN CORSO DI PROGETTAZIONE - CHIESTA NOMINA GEOLOGO
2	848	Lavori per il rifacimento del muro crollato in prossimità del km 4+000 della S.P. 16 di Forza D'Agrò.	BONANNO	ROSARIO	300.000,00 €	procedura negoziata semplificata 10 operatori	Art. 10 Legge Regionale n.9 del 7/5/2015	IN CORSO DI PROGETTAZIONE - CHIESTA NOMINA GEOLOGO
3	853	Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità sulle SS.PP. Ricadenti nei comuni di Capo d'Orlando e Naso.	BONANNO	ROSARIO	600.000,00 €	procedura negoziata 15 operatori	Riprogrammazione APQ - FSC Delib.Reg. 310 del 28/8/2018	PROGETTAZIONE VALIDATA – IN ATTESA DECRETO DI FINANZIAMENTO
4	593	Ripristino sede stradale S.P. 166 di Portella Bufali (Km.0+800 e 0+900)	BONANNO	ROSARIO	1.050.000,00 €	procedura negoziata 15 operatori	fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 (APQ)	PREDISPOSTA DETERMINA A CONTRARRE - AGGIORNAMENTO COVID FATTO – ATTI TRASMESSI ALLA SEGRERTERIA
5	590	Ripristino sede stradale S.P. 167 di Ancipa (Km 8+000 e 20+000)	BONANNO	ROSARIO	2.277.425,00 €	procedura aperta	fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 (APQ)	PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO DI REDAZIONE. INDAGINI ESEGUITE E RELAZIONE EFFETTUATA DA ROCCAFORTE – conclusione entro agosto 2020
6	607	Lavori di sistemazione del piano viabile messa in sicurezza della S.P. 177 di Tusa. II° lotto	BONANNO	ROSARIO	1.124.500,00 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia - Viabilità secondaria	INTERVENTO DECRETATO E CEDUTO ALLA REGIONE
7	610	Lavori per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 173 II lotto -Motta D'Affermo	BONANNO	ROSARIO	1.930.500,00 €	procedura aperta	Patto per lo sviluppo della Sicilia - Viabilità secondaria	PREDISPOSTA DETERMINA A CONTRARRE - AGGIORNAMENTO COVID FATTO – ATTI TRASMESSI ALLA SEGRERTERIA
8	611	Ammodernamento della S.P. 152 Bivio Gentile - piano Campi, 3° lotto.-Tortorici	BONANNO	ROSARIO	3.900.000,00 €	procedura aperta	Patto per lo sviluppo della Sicilia - Viabilità secondaria	PREDISPOSTA DETERMINA A CONTRARRE - AGGIORNAMENTO COVID FATTO – ATTI TRASMESSI ALLA SEGRERTERIA
9	612	Progetto di consolidamento sulla S.A. Tortorici-S.Costantino-Marù', interessata da fenomeni di dissesto verificatosi a causa dell'alluvione dell'ottobre del 1996	BONANNO	ROSARIO	4.498.339,00 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia - Viabilità secondaria	IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ATTIVARE CONSULENZA GEOTECNICA ESTERNA
10	645	Lavori urgenti di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal km 3+000 al km 12+000 nel comune di Militello Rosmarino	BONANNO	ROSARIO	1.000.000,00 €	procedura negoziata 15 operatori	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	FARE DETERMINA A CONTRARRE - AGGIORNAMENTO COVID FATTO
11	646	Lavori di ricostruzione del piano viabile e rifacimento della segnaletica sulla S. P. 168 di Caronia - Capizzi	BONANNO	ROSARIO	1.000.000,00 €	procedura negoziata 15 operatori	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	FARE DETERMINA A CONTRARRE - AGGIORNAMENTO COVID FATTO


12	652	Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S. P. 167 dell'Ancipa nel tratto compreso tra i km 2+000 e il km 14+000	BONANNO	ROSARIO	1.300.000,00 €	procedura negoziata 15 operatori	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO DI REDAZIONE. INDAGINI ESEGUITE E RELAZIONE EFFETTUATA DA ROCCAFORTE – conclusione entro agosto 2020
13	733	Lavori di sistemazione del P.V. e relative pertinenze danneggiate dall'alluvione del 25-25 agosto 2018 sulla SP 168 dei monti nebroidi nel Comune di Caronia	BONANNO	ROSARIO	1.000.000,00 €	procedura negoziata 15 operatori	Art. 10 Legge Regionale n.9 del 7/5/2015	PROGETTAZIONE VALIDATA – IN ATTESA DECRETO DI FINANZIAMENTO
14	736	Progetto dei Lavori per migliorare la percorribilità e i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nei gruppi n° 30, 31, 32, 33, 34 e 35.	BONANNO	ROSARIO	576.000,00 €	procedura negoziata 15 operatori	ART.5 L.R. N13 19/07/2019	PROGETTAZIONE VALIDATA – IN ATTESA DECRETO DI FINANZIAMENTO
15	770	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n. 146/b, 147, 148, 149, 151, 154, 155ter 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174,176, 177. (Annualità 2019) € 1.037.600,00 (Naso /Tusa)	BONANNO	ROSARIO	1.037.600,00 €	procedura aperta	MIT - DM 49 del 16/02/2019 ANNUALITA' 2019	LAVORI DA CONSEGNARE CONTRATTO FATTO IN DATA ____ (CONSORZIO VITRUVIO)
16	DA INSERIRE ANNUALE	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n. 146/a, 148/d, 169SPA, 150, 155, 157, 159, SPA Badetta Acquodolci, 169/b, 169, 172, 174, 177. (Annualità 2020)	BONANNO	ROSARIO	1.037.600,00 €	procedura negoziata 15 operatori	MIT - DM 49 del 16/02/2019 ANNUALITA' 2020	IN CORSO DI PROGETTAZIONE – INCARICATO SERVIZIO MANUTENZIONE ZONA NEBRODI (GEOM. SAVIO)
17	581	Opere di sostegno, contenimento piano viabile Km. 8 + 500 e 11+500 (tratto di collegamento tra Casalvecchio e Antillo) S.P. 19 Savonese	BONANNO	ROSARIO	800.000,00 €	procedura negoziata 15 operatori	fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 (APQ)	IN ATTESA DECRETO DI FINANZIAMENTO
18	585	Opere di sostegno e rifacimento p. v. Km. 3+550 e 5+700 S.P. 23 Misserio	BONANNO	ROSARIO	600.000,00 €	procedura negoziata 15 operatori	fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 (APQ)	FARE DETERMINA A CONTRARRE DOPO AGGIORNAMENTO COVID
19	631	Progetto dei lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del primo ufficio viabilità del distretto costa ionica, dai Villaggi Sud Messina e sino al comune di Mandanici	BONANNO	ROSARIO	500.000,00 €	procedura negoziata 15 operatori	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	FARE DETERMINA A CONTRARRE - AGGIORNAMENTO COVID FATTO
20	632	Progetto dei lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del secondo ufficio viabilità del distretto costa ionica, dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi	BONANNO	ROSARIO	500.000,00 €	procedura negoziata 15 operatori	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	FARE DETERMINA A CONTRARRE - AGGIORNAMENTO COVID FATTO – CARENZA CAPIENZA NEL QTE – COMPUTO RIDETERMINATO
21	726	Ammodernamento della S.P. 176 Castelluzese - tratto Castel di Lucio - Mistretta.	BONANNO	ROSARIO	3.100.000,00 €		APQ – AREA INTERNA NEBRODI	necessario provvedere al finanziamento delle indagini geologiche e consulenza specialistiche geotecniche
22	727	Manutenzione e messa in sicurezza della strada scorrimento veloce ss.113-"Mirto-Valla Zappulla".	BONANNO	ROSARIO	2.600.000,00 €	procedura aperta	APQ – AREA INTERNA NEBRODI	PROGETTO ESECUTIVO REDATTO – CONFRONTO DEI SERVIZI INDETTA PER 02/07/2020 – NOMINARE NUCLEO DI VERIFICA PROGETTO (ESTERNO) – conclusione entro agosto 2020
23	728	Progetto di ammodernamento della S.P. 146 bis e S.P. 139 di Ponte Naso Sinagra - Limari	BONANNO	ROSARIO	2.500.000,00 €	procedura aperta	APQ – AREA INTERNA NEBRODI	PROGETTO ESECUTIVO REDATTO – CONFRONTO DEI SERVIZI INDETTA (manca parere Forestale) – NOMINARE NUCLEO DI VERIFICA PROGETTO (ESTERNO) – conclusione entro agosto 2020
24	729	Manutenzione della strada S.p. 160 per il completamento della messa in sicurezza	BONANNO	ROSARIO	800.000,00 €	procedura negoziata 15 operatori	APQ – AREA INTERNA NEBRODI	PROGETTO ESECUTIVO REDATTO – CONFRONTO DEI SERVIZI INDETTA il 20/05/2020 manca parere sovrintendenza e forestale – conclusione entro agosto 2020
25	730	ammodernamento della strada Alcara Lì Fusi - S.S. 113.	BONANNO	ROSARIO	3.000.000,00 €		APQ – AREA INTERNA NEBRODI	necessario provvedere al finanziamento delle indagini geologiche e consulenza specialistiche geotecniche

26	731	lavori di miglioramento della percorribilità della Via dei Normanni nel Comune di S.Fratello	BONANNO	ROSARIO	500.000,00 €		APQ – AREA INTERNA NEBRODI	predisposto accordo di programma con Comune di San Fratello per redazione progetto esecutivo
27	732	lavori di consolidamento strutturale del ponte sul fiume Tusa.	BONANNO	ROSARIO	1.173.724,00 €		APQ – AREA INTERNA NEBRODI	necessario provvedere al finanziamento delle indagini geologiche e consulenza specialistiche strutturista
28		lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. 12 di Roccafiorta dal km 0+000 al km 15,650	BONANNO	ROSARIO	1.200.000,00 €	procedura aperta	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	LAVORI DA CONSEGNARE CONTRATTO FATTO IN DATA 09/06/2020 (A.T.I. Eurovega – EUROBUILDING)
29		lavori di manutenzione 21 di Romissa S.P. 22 di Mancusa e di tratti vari della S.P. n° 19 Savocheese	BONANNO	ROSARIO	1.200.000,00 €	procedura aperta	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE (AT.I. - NUOVAEDIL - CHILLE)
30		lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.a n° 42 tratto compreso dal km 0+000 alla Contrada Mastrissa	BONANNO	ROSARIO	300.000,00 €	procedura aperta	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina	lavori ultimati – contabilità finale in corso – IMPRESA ASERO COSTRUZIONI

importo complessivo	41.596.688,00 €
---------------------	------------------------

N° interventi	RIEPILOGO	importo complessivo	
4	interventi contrattualizzati o da contrattualizzare entro Giugno 2020	importo complessivo	€ 3.737.600,00
11	interventi validati già decretati con determina a contrarre in itinere o in attesa di decreto di finanziamento	importo complessivo	€ 12.656.500,00
9	interventi la cui progettazione è da validare entro Agosto 2020	importo complessivo	€ 11.806.025,00
5	interventi la cui progettazione comporta consulenze o indagini specialistiche con copertura finanziaria da reperire per i quali si prevedono tempi più lunghi	importo complessivo	€ 12.272.063,00
1	interventi validati e decretati ceduti ad altri ENTI (REGIONE) per l'esecuzione lavori	importo complessivo	€ 1.124.500,00
			€ 41.596.688,00

30

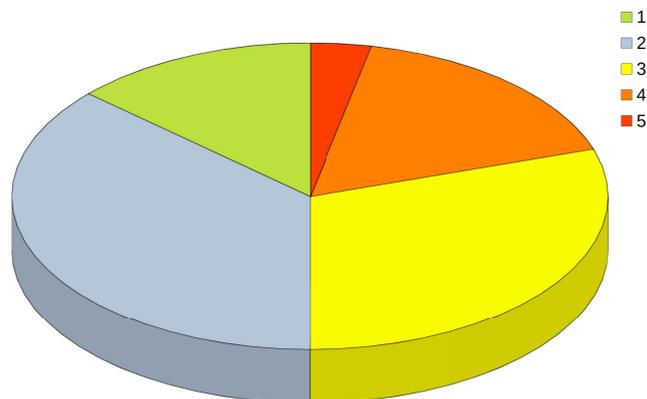

il RUP
ing. Rosario Bonanno




PROGRAMMAZIONE VIABILITA' ANNO 2020/2022 - (stralcio ELENCO ANNUALE 2020 approvato con Decreto Sindacale n.31 del 18/02/2020)							
	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO TOTALE INTERVENTO	procedura di gara	FONTE DI FINANZIAMENTO	STATO AVANZAMENTO
		cognome	nome				
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DEI VILLAGGI SUD RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA	LENTINI	GIOVANNI	690.000,00 €		ART.5 L.R. N13 19/07/2019	PROGETTAZIONE ESECUTIVA REDATTA
2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL SECONDO UFFICIO VIABILITA' (SS.PP. 8-10-11-13-14-16)	LENTINI	GIOVANNI	462.000,00 €		ART.5 L.R. N13 19/07/2019	PROGETTAZIONE ESECUTIVA REDATTA
3	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità - (dai villaggi sud del comune di Messina al comune di Mandanici). (Annualità 2019) Importo complessivo € 937.600,00	LENTINI	GIOVANNI	937.600,00 €		Decreto 16/02/2018 - M.I.T.	CONTRATTO STIPULATO
4	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità - (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi). (Annualità 2020)	LENTINI	GIOVANNI	937.600,00 €		Decreto 16/02/2018 - M.I.T.	PROGETTAZIONE ESECUTIVA REDATTA
5	Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 19/a "Casalvecchio - Fautari - S. Carlo" nei comuni di Casalvecchio S. e S. Teresa di Riva.	LENTINI	GIOVANNI	235.000,00 €		Delibera di Giunta regionale n° 310 del 28/08/2018	PROGETTAZIONE ESECUTIVA REDATTA
6	Lavori per la realizzazione di opere per la sistemazione del vallone Abramo e per la regimazione delle acque a protezione della S.P. n. 23 di Misserio nei comuni di Santa Teresa di Riva e Savoca.	LENTINI	GIOVANNI	165.000,00 €		Delibera di Giunta regionale n° 310 del 28/08/2018	PROGETTAZIONE ESECUTIVA REDATTA
7	Intervento strutturale piano viabile e consolidamento scarpate Km. 2 +000 progetto stralcio S.P. 16 Forza d'Agrò	LENTINI	GIOVANNI	2.416.000,00 €		Fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
8	Opere contenimento versante a protezione della strada S.P. 35 Pezzolo	LENTINI	GIOVANNI	199.383,28 €		Fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 (APQ)	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
9	Opere contenimento versante nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli	LENTINI	GIOVANNI	498.423,33 €		Fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 (APQ)	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
10	Contenimento del versante; la zona interessata dall'intervento risulta essere diversa da quella dell'intervento finanziato dalla Protezione Civile Regionale S.P. 13 Gallodoro	LENTINI	GIOVANNI	199.356,91 €		Fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 (APQ)	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
11	Opere di sostegno, contenimento versante Km. 2+ 400 a 2+800 e Km. 5 S.P. 25 Mandanici	LENTINI	GIOVANNI	398.727,59 €		Fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 (APQ)	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
12	Ricostruzione piano viabile franato S.P. 176 Castelluzzese	LENTINI	GIOVANNI	300.000,00 €		Fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 (APQ)	NOMINA GEOLOGO ESEGUITA; PROGRAMMA INDAGINI DA ESEGUIRE
13	Ripristino sede stradale S.P. 168 dei Monti Nebrodi (Km 24+000 -27+000 e 32+200)	LENTINI	GIOVANNI	800.000,00 €		Fondi ex ANAS - Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 (APQ)	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
14	Lavori per la realizzazione di opere ,ripristino e messa in sicurezza della sede viaria della SP 19/a - Casalvecchio-Fautari - S.Carlo	LENTINI	GIOVANNI	177.000,00 €		Legge Regionale n.9 del 7/5/2015	PROGETTAZIONE ESECUTIVA REDATTA

15	Lavori per il rifacimento del muro crollato in prossimità del km 4+000 della S.P. 16 di Forza D'Agrò.	LENTINI	GIOVANNI	300.000,00 €		Legge Regionale n.9 del 7/5/2015	NOMINA GEOLOGO ESEGUITA; PROGRAMMA INDAGINI DA ESEGUIRE
16	Lavori per il rifacimento di due tratti del muro di sostegno al km 6+200 ed al km 6+400 della S.P. 12 nel comune di Limina.	LENTINI	GIOVANNI	191.000,00 €		Legge Regionale n.9 del 7/5/2015	NOMINA GEOLOGO ESEGUITA; PROGRAMMA INDAGINI DA ESEGUIRE
17	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza lungo il circuito Ali – Itala – Strada Provinciale Agricola	LENTINI	GIOVANNI	300.000,00 €		Legge Regionale n.9 del 7/5/2015	PROGETTAZIONE IN CORSO
18	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del P.V. della SP 9 di Chianchitta nel comune di Taormina e Giardini	LENTINI	GIOVANNI	103.666,02 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
19	Lavori urgenti per la messa in sicurezza della S.P.19, nei comuni di Savoca, Casalvecchio e Antillo.	LENTINI	GIOVANNI	129.586,68 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
20	Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari tratti della S.P.41 ne Vill.di S.Filippo Inf. nel Comune di Messina	LENTINI	GIOVANNI	259.212,69 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
21	Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari tratti della S.P.38 nei Vill.Mili S.Pietro e Mili S.Marco nel Comune di Messina	LENTINI	GIOVANNI	388.745,58 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
22	Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari tratti della S.P.39 nel Vill.Larderìa-Tipoldo nel Comune di Messina	LENTINI	GIOVANNI	388.759,88 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
23	Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari tratti della S.P.35 nel Vill.Pezzolo comune di Messina	LENTINI	GIOVANNI	518.365,71 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
24	Lavori per la sistemazione adeguamento e messa in sicurezza della strada Provinciale Gaggi-Cretazzi-Serro Antillo-Candelora-Castelmola nel Comune di Gaggi	LENTINI	GIOVANNI	839.820,05 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
25	Lavori di manutenzione straordinaria del p.v. della strada di collegamento Fiumedinisi - Pedaria	LENTINI	GIOVANNI	1.235.000,00 €		Patto per lo sviluppo della Sicilia	NOMINA GEOLOGO ESEGUITA; PROGRAMMA INDAGINI DA ESEGUIRE
26	Lavori di ricostruzione del piano viabile e consolidamento strutturale della scarpata di valle al km 4+500 sulla S. P. 160 di S.Marco d'Alunzio	LENTINI	GIOVANNI	500.000,00 €		Patto per Messina	NOMINA GEOLOGO ESEGUITA; PROGRAMMA INDAGINI DA ESEGUIRE
27	Completamento strada di collegamento "Gallodoro-Letojanni"	LENTINI	GIOVANNI	5.000.000,00 €		Patto per Messina	CEDUTO AL COMUNE DI GALLODORO
28	Lavori urgenti per la salvaguardia dall'erosione fluviale delle pile del ponte sulla S.P. 176 Castelluzzese al km 10+000	LENTINI	GIOVANNI	300.000,00 €		Patto per Messina	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
29	Lavori urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di mitigazione rischio caduta massi con costruzione di barriere paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana	LENTINI	GIOVANNI	1.300.000,00 €		Patto per Messina	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
30	Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S.Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando."manutenzione straordinaria strade provinciali centri collinari e Montani"	LENTINI	GIOVANNI	800.000,00 €		Patto per Messina	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
31	Lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile e relative pertinenze sulla S. P. 169bis di Letto Santo (S.Stefano Camastra)	LENTINI	GIOVANNI	300.000,00 €		Patto per Messina	DETERMINA A CONTRARRE IN CORSO DOPO AGGIORNAMENTO COVID
				Importo complessivo	21.270.247,72 €		

N° interventi	RIEPILOGO		
1	Interventi contrattualizzati o da contrattualizzare entro Giugno 2020	importo complessivo	937.600,00
17	Interventi validati già decretati con determina a contrarre in itinere	importo complessivo	9.840.047,72
1	interventi validati e decretati ceduti ad altri ENTI (REGIONE) per l'esecuzione lavori	importo complessivo	5.000.000,00
7	Progettazione esecutiva redatta o in corso	importo complessivo	2.966.600,00
5	Interventi la cui progettazione comporta consulenze o indagini specialistiche con copertura finanziaria da reperire per i quali si prevedono tempi più lunghi	importo complessivo	2.526.000,00
		Totale	21.270.247,72

31

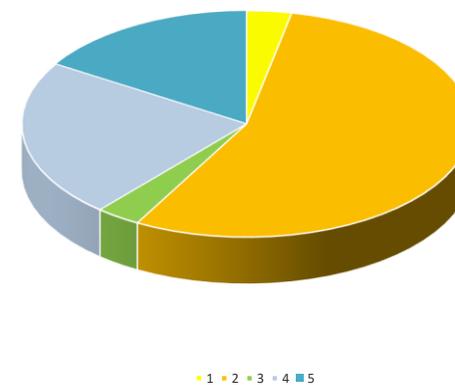

il RUP
Ing. Giovanni LENTINI
