

Rep. Gen.le N. 936 del 2/8/11



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° U.D. - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 79 del 02.08.2012

Oggetto: *LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA S.P. 6 E DELL'INNESTO ALLA S.S. 185 NEL COMUNE DI MOTTA CAMASTRA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE. Perizia di variante tecnica n° 2 e suppletiva APPROVAZIONE*

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 25/05/2009 dall'arch. Francesco Orsi e dal geom. Michele Quarto, dipendenti di questa Provincia, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 21 del 08/06/2009, per l'importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 353.080,00
per oneri per la sicurezza:	€ 10.920,00
Importo totale lavori:	€ 364.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) I.V.A. 20%	€ 72.800,00
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 7.280,00
3) Assicurazione obbligatoria	€ 3.640,00
4) Pubblicità gara	€ 24.000,00
5) Imprevisti	€ 15.280,00
6) Collaudo amm.vo	€ 2.000,00
7) Oneri discarica	€ 11.000,00
sommano	€ 136.000,00
Importo complessivo	€ 500.000,00

che con pubblico incanto, svolto in data 05.04/03.05.2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa "ROMEO COSTRUZIONI s.r.l." con il ribasso del 22,2345%; il relativo contratto è stato stipulato in data 01/07/2011 al n° 13907 di rep;

che i lavori sono stati consegnati il 12/07/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 17/02/2012;

che in data 28.11.2011 il direttore di lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 405.793,32, così ripartito:

A) Importo lavori:

a base d'asta	€ 353.080,00
a detrarre il ribasso del 22,0986% 22,2345 %	€ 78.505,57
importo netto ribassato	€ 274.574,43
oneri sicurezza	€ 10.920,00
importo netto contrattuale	€ 285.494,43

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. 21%	€ 59.953,83	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 7.280,00	
3) Assicurazione obbligatoria	€ 3.640,00	
4) Imprevisti	€ 4.425,06	
4) Pubblicità gara	€ 15.000,00	
5) Collaudo statico	€ 5.000,00	
6) prove di laboratorio	€ 5.000,00	
7) Oneri scarica	€ 20.000,00	
sommano a disposizione	€ 120.298,89	€ 120.298,89
Importo complessivo		€ 405.793,32

C) Economie di ribasso

Ribasso del 22,2345%	€ 78.505,57	
I.V.A. sul ribasso	€ 15.701,11	
sommano	€ 94.206,68	€ 94.206,68
tornano		€ 500.000,00

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento con parere n° 64 del 23.12.2011;

che in data 09.07.2012 il direttore di lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante tecnica n° 2 e suppletiva, dell'importo complessivo di € 402.153,32;

VISTA

la succitata perizia di variante, dell'importo complessivo di € 402.153,32, così ripartito:

A) Importo lavori:

a base d'asta	€ 356.737,07
a detrarre il ribasso del 22,0986% 22,2345 %	€ 79.318,70
importo netto ribassato	€ 277.418,37
oneri sicurezza	€ 10.920,00
importo netto contrattuale	€ 288.338,37

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. 21%	€ 60.551,06
2) Spese tecniche 2%	€ 7.353,14
3) Pubblicità gara	€ 15.000,00

4) prove di laboratorio	€ 1.500,00	
5) Oneri scarica	€ 29.410,75	
sommano a disposizione	€ 113.814,95	€ 113.814,95
Importo complessivo		€ 402.153,32
C) Economie		
Ribasso del 22,2345%	€ 78.505,57	
I.V.A. sul ribasso	€ 15.701,11	
Assicurazione obbligatoria	€ 3.640,00	
sommano	€ 97.846,68	€ 97.846,68
tornano		€ 500.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia utilizza le somme a disposizione accantonate per imprevisti per la collocazione di segnaletica verticale, al fine di aumentare la sicurezza stradale;

che i nuovi prezzi introdotti derivano dal prozzario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e considerato nella redazione del progetto originario, da analisi, da noli e da mercedi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "ROMEO COSTRUZIONI s.r.l.", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 288.338,37, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 10.920,00;

che l'importo contrattuale subisce un aumento di € 2.843,94;

che non è necessario un ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 40 del 31.07.2012

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante tecnica N° 2 e suppletiva dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA S.P. 6 E DELL'INNESTO ALLA S.S. 185 NEL COMUNE DI MOTTA CAMASTRA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE", redatta in data


09.07.2012 dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, per l'importo complessivo di € 402.153,32, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;


DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui al programma operativo FESR Sicilia 2007/2013;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.


Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto



Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

20.8.11 


Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

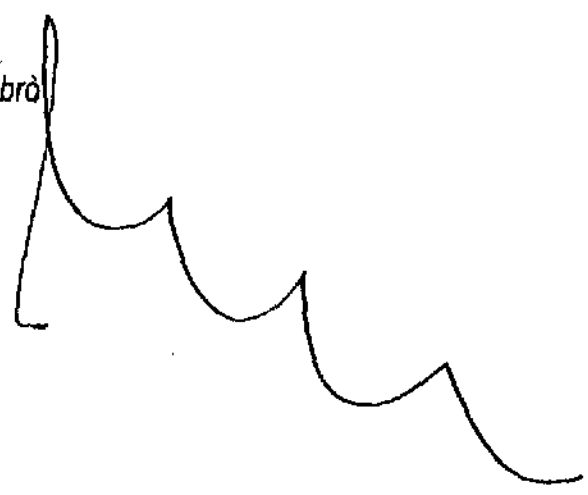



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° U.D. - VIABILITÀ 2° DISTRETTO



N. 40

Messina, 31.07.2012

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA S.P. 6 E DELL'INNESTO ALLA S.S. 185 NEL COMUNE DI MOTTA CAMASTRA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE. Perizia di variante tecnica n° 2 e suppletiva.**
Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 134, c. 9, del D.P.R. 554/1999

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 25/05/2009 dall'arch. Francesco Orsi e dal geom. Michele Quarto, dipendenti di questa Provincia, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 21 del 08/06/2009, per l'importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 353.080,00
per oneri per la sicurezza:	€ 10.920,00
Importo totale lavori:	€ 364.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) I.V.A. 20%	€ 72.800,00
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 7.280,00
3) Assicurazione obbligatoria	€ 3.640,00
4) Pubblicità gara	€ 24.000,00
5) Imprevisti	€ 15.280,00
6) Collaudo amm.vo	€ 2.000,00
7) Oneri discarica	€ 11.000,00
sommano	€ 136.000,00
Importo complessivo	€ 500.000,00

che con pubblico incanto, svolto in data 05.04/03.05.2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa "ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.", con il ribasso del 22,2345%; il relativo contratto è stato stipulato in data 01/07/2011 al n° 13907 di rep;

che i lavori sono stati consegnati il 12/07/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 17/02/2012;

che in data 28.11.2011 il direttore di lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 405.793,32, così ripartito:

A) Importo lavori:	
a base d'asta	€ 353.080,00

a detrarre il ribasso del 22,0986% 22,2345 %	€ 78.505,57
importo netto ribassato	€ 274.574,43
oneri sicurezza	€ 10.920,00
importo netto contrattuale	€ 285.494,43

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. 21%	€ 59.953,83	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 7.280,00	
3) Assicurazione obbligatoria	€ 3.640,00	
4) Imprevisti	€ 4.425,06	
4) Pubblicità gara	€ 15.000,00	
5) Collaudo statico	€ 5.000,00	
6) prove di laboratorio	€ 5.000,00	
7) Oneri discarica	€ 20.000,00	
sommano a disposizione	€ 120.298,89	€ 120.298,89
Importo complessivo		€ 405.793,32

C) Economic di ribasso

Ribasso del 22,2345%	€ 78.505,57	
I.V.A. sul ribasso	€ 15.701,11	
sommano	€ 94.206,68	€ 94.206,68
tornano		€ 500.000,00

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento con parere n° 64 del 23.12.2011;

che in data 09.07.2012 il direttore di lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante tecnica n° 2 e suppletiva, dell'importo complessivo di € 402.153,32;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999, è del responsabile del procedimento.

VISTA

la succitata perizia di variante, dell'importo complessivo di € 402.153,32, così ripartito:

A) Importo lavori:

a base d'asta	€ 356.737,07
a detrarre il ribasso del 22,0986% 22,2345 %	€ 79.318,70
importo netto ribassato	€ 277.418,37
oneri sicurezza	€ 10.920,00
importo netto contrattuale	€ 288.338,37

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. 21%	€ 60.551,06	
2) Spese tecniche 2%	€ 7.353,14	
3) Pubblicità gara	€ 15.000,00	
4) prove di laboratorio	€ 1.500,00	
5) Oneri discarica	€ 29.410,75	
sommano a disposizione	€ 113.814,95	€ 113.814,95

Importo complessivo		€ 402.153,32
C) Economie		
Ribasso del 22,2345%	€ 78.505,57	
I.V.A. sul ribasso	€ 15.701,11	
Assicurazione obbligatoria	€ 3.640,00	
sommano	€ 97.846,68	€ 97.846,68
tornano		€ 500.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia utilizza le somme a disposizione accantonate per imprevisti per la collocazione di segnaletica verticale, al fine di aumentare la sicurezza stradale;

che i nuovi prezzi introdotti derivano dal prezziario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e considerato nella redazione del progetto originario, da analisi, da noli e da mercedi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "ROMEO COSTRUZIONI s.r.l.", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 288.338,37, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 10.920,00;

che l'importo contrattuale subisce un aumento di € 2.843,94;

che non è necessario un ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

ACCERTATO ED ATTESTATO

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento

E' DEL PARERE

che la perizia di variante tecnica N° 2 e suppletiva dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA S.P. 6 E DELL'INNESTO ALLA S.S. 185 NEL COMUNE DI MOTTA CAMASTRA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE", redatta in data 09.07.2012 dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 402.153,32 secondo il quadro economico di cui sopra.

SI PRESCRIVE

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Benedetto Sidoti Pinto
